

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1019	Chief of Operations Validation Date	04/05/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/13/17
Last Update	03/24/17	Country Representative Validation Date	05/02/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	National Rural Roads Program Second Stage Phase II	Loan Number	1297/OP-PR, 2163/OC-PR, 2164/BL-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Sector/Subsector	TR-VRU - TRANSPORT-RURAL ROADS
Team Leader	PEREYRA DA LUZ,ANDRES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Proyecto técnicamente simple, en zona geográfica plana, sin desastres naturales, capacidad técnica apropiada y cumplimiento apropiado del PGAS. No existen riesgos ni impactos significativos.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1019	65,600,000	65,600,000	104,400,000	79,000,000	249,000,000	65,600,000	50,388,266.81	76.81%	15,211,733.19
Aggregated	65,600,000	65,600,000	104,400,000	79,000,000	249,000,000	65,600,000	50,388,266.81	76.81%	15,211,733.19

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

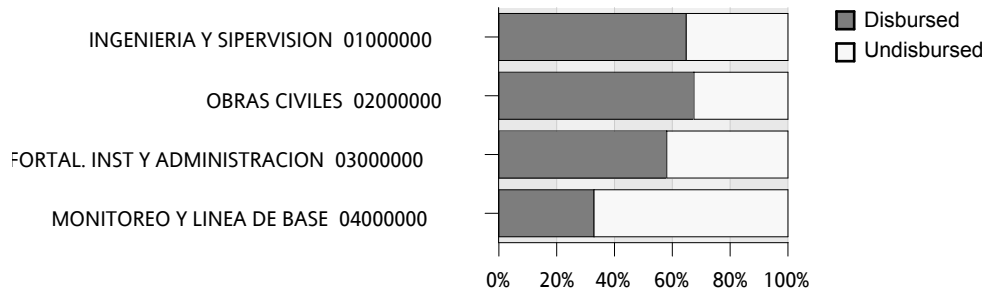

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir al aumento de la competitividad de la producción nacional.

Observation:

Impact Nbr. 2: Contribuir a elevar el nivel de vida de la población rural.

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Nivel de servicio de la red prioritaria de caminos vecinales (6.000 km) de la Región Oriental mejorado y mantenido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.1	Caminos de la red prioritaria de caminos vecinales (6.000 km) de la Región Oriental en estado bueno/regular	% de la Red en estado bueno	40.0	2009	P	80.00
					P(a)	80.00
					A	

Details

Means of verification: Informes semestrales de fiscalizadoras basado en el informe de nivel de servicio

Observations: Línea de base considerada la de preparación del proyecto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.2	Tiempo de viaje promedio en los caminos rehabilitados (1.150 kms) por el Programa	(*) Reduccion tiempo de viaje	0.0	2011	P	10.00
					P(a)	10.00
					A	

Details

Means of verification: Informes de HDM4 al inicio y final del proyecto

Observations: El informe inicial se realizará a partir de los resultados de la línea de base a ser contratada en el 2do semestre del 2011, que comprende 183 km de camino. La línea de base de 967 km a ser relevados a través de los estudios de factibilidad, a ser contrat

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.3	Opinión favorable de los usuarios respecto a los tramos de la red vial intervenidos por el Programa	(*) de opiniones favorables en encuestas a usuarios	0.0	2011	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	

Details

Means of verification: Encuesta de Opinión a ser reportada en el Informe Anual.

Observations: En la medida que se concluya el mantenimiento y rehabilitación de los tramos intervenidos, se evaluará la opinión de los usuarios. La evaluación se realizará por muestreo del 30%. La meta de 20% será medida sobre el monto acumulado intervenido anual.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Gerencias Viales (GV) de las Asociaciones de Municipios responsables de la gestión descentralizada de la red vial vecinal.	Gerencias Viales	0.0	2011	P	2.00
					P(a)	2.00
					A	

Details

Means of verification: Informe semestral de monitoreo del programa.

Observations: Se estima que las GV serán creadas en el año 2013

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.5	Costo promedio de operación vehicular en los caminos rehabilitados por el Programa	0.0	2011	P	10.00
				P(a)	10.00
				A	

Details

Means of verification: Informes de HDM4 al inicio y final del proyecto

Observations: El informe inicial se realizará a partir de los resultados de la línea de base a ser contratada en el 2do semestre del 2011, que comprende 183 km de camino. La línea de base de 967 km a ser relevados a través de los estudios de factibilidad, a ser contrat

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras Civiles

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Caminos Vecinales de la Red Prioritaria rehabilitados con un nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad permanente, seguridad vial adecuada y medidas de mitigación ambiental	Roads (km)	P	300	1,149.8	21,000,000	72,089,000
			P(a)	361.81	1,005.42	25,472,684.97	121,927,335.31
			A	298.41	537.07	80,920,904.21	89,460,316.56
1.2	Pequeños puentes de madera rehabilitados y/o reemplazados por puentes de (Hormigón Armado) en tramos no mejorados	m	P	500	2,300	7,555,516	33,136,672.86
			P(a)	429.31	3,127.21	5,108,238.57	33,859,635.31
			A	255.5	2,667.4	2,411,487.42	28,348,697.92
1.3	Caminos vecinales de la red prioritaria mantenidos	Kilómetros	P	704.58	4,800	12,857,487.49	36,132,017.81
			P(a)	120	4,800	5,374,717.35	33,847,843.93
			A	120	4,694.31	4,811,190	26,376,977.8
1.4	Calles principales de centros urbanos pavimentadas con empedrado	centros urbanos	P	0	30	0	2,000,000
			P(a)		0	1,000,000	1,000,000
			A	0	30	0	3,735.41

Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	Plan Fortalecimiento Institucional ejecutado	plan	P	0	1	1,656,120.2	10,070,216.1
			P(a)		1	2,249,938.77	8,509,425.98
			A	0	0	886,591.32	4,632,926.51

Other Cost

	Auditoria Financiera y Operativa	P			142,995	600,000
		P(a)			49,314.55	284,465.2
		A				194,852.49
	Fiscalizacion	P			2,159,805	10,094,322.94
		P(a)			3,284,340.88	9,259,722.18
		A			2,301,248.48	6,217,864.12
	Imprevisto	P			935,935.5	3,743,742
		P(a)				2,659,293
		A			50	50
	Ingenieria	P			0	4,427,945.53
		P(a)			2,183,639.62	4,700,426.51
		A			945,749	4,263,643.33
	Monitoreo y Linea Base	P			750,000	1,000,000
		P(a)			38,280.99	552,991.41
		A			34,642.56	250,272.41

Total Cost

	Total Cost	P			47,057,859.19	173,293,917.24
		P(a)			44,761,155.7	216,601,138.83
		A			92,311,862.99	159,749,336.55

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Calles principales de centros urbanos pavimentadas con empedrado	Modify Output	Se ha realizado la replanificación financiera conforme a la información remitida por la UEP en el Informe Semestral de Monitoreo	03/10/2017	03/10/2017
Output	Caminos vecinales de la red prioritaria mantenidos	Modify Output	Se ha realizado la replanificación financiera conforme a la información remitida por la UEP en el Informe Semestral de Monitoreo	03/10/2017	03/10/2017
Output	Pequeños puentes de madera rehabilitados y/o reemplazados por puentes de (Hormigón Armado) en tramos no mejorados	Modify Output	Se ha realizado la replanificación financiera conforme a la información remitida por la UEP en el Informe Semestral de Monitoreo	03/10/2017	03/10/2017
Output	Plan Fortalecimiento Institucional ejecutado	Modify Output	Se ha realizado la replanificación financiera conforme a la información remitida por la UEP en el Informe Semestral de Monitoreo	03/10/2017	03/10/2017
Output	Caminos Vecinales de la Red Prioritaria rehabilitados con un nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad permanente, seguridad vial adecuada y medidas de mitigación ambiental	Modify Output	Se ha realizado la replanificación financiera conforme a la información remitida por la UEP en el Informe Semestral de Monitoreo	03/10/2017	03/10/2017
