

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1080	Chief of Operations Validation Date	11/05/16
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/11/17
Last Update	04/06/17	Country Representative Validation Date	05/05/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Multipurpose Water Supply and Irrigation Program For the Municipios of Batallas	Loan Number	3599/BL-BO
Executing Agency	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Sector/Subsector	AS-AGR - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
Team Leader	GARZONIO,OMAR DARIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	BO-G1004, BO-X1012
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Project is significantly delayed; however without E&S repercussions. The Project has hired the required management team including project manager, environmental specialist and social specialist. This team is advancing the MIC and DESCOM and conducting the community engagement platform.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-G1004	42,500,000	42,500,000	0	0	42,500,000	42,500,000	0	0.00%	42,500,000
BO-L1080	62,000,000	62,000,000	24,145,136	0	86,145,136	62,000,000	1,048,904.07	1.69%	60,951,095.93
BO-X1012	4,370,000	4,370,000	0	0	4,370,000	4,370,000	218,500	5.00%	4,151,500
Aggregated	108,870,000	108,870,000	24,145,136	0	133,015,136	108,870,000	1,267,404.07	1.16%	107,602,595.93

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

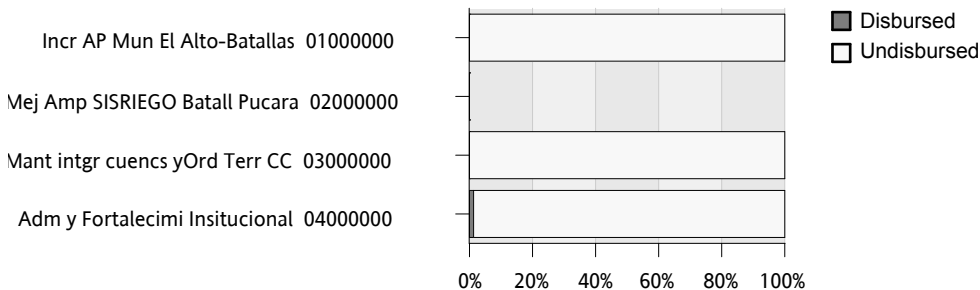

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: N/A

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Servicio de agua potable para la ciudad de El Alto mejorado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Hogares con acceso mejorado a agua potable en El Alto. Definición de mejorado: horas de continuidad del servicio de 24 horas por día	Households (#)	128400.0	2015	P					183,437.00	183,437.00
					P(a)					183,437.00	183,437.00
					A						

Details

Means of verification: Informe Anual del operador (EPSAS) reportado a la AAPS. (Contribuye con el indicador básico de resultado 5 del PPCR)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Indigenous				P						
					P(a)						
					A						

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Cantidad de agua almacenada en las presas construidas por el proyecto	Volumen de agua (Hm3)	20.5	2015	P					50.60	50.60
					P(a)					50.60	50.60
					A						

Details

Means of verification: Planilla de Cierre de Obra emitido por el contratista y/o Informe Final del Supervisor y/o Acta de Recepción Definitiva de Proyecto y/o informe de Cierre Técnico del Proyecto emitido por la Gerencia Técnica de EMAGUA.

Observations: El llenado de las presas requiere en el mejor de los casos de al menos dos ciclos hidrológicos posteriores a su conclusión, por lo que el indicador reportado está referido al potencial de almacenamiento de las Presas.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Sistemas de riego para la producción agropecuaria en las cuencas de los ríos Jacha Jahuira y Khullu Cachi mejorados

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Eficiencia en el uso del agua en sistemas de riego tecnificado	Volumen de agua utilizado en	25.0	2015	P					75.00	75.00
					P(a)					75.00	75.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.1	Eficiencia en el uso del agua en sistemas de riego tecnificado	finca/volumen total de agua captado por sistema	25.0	2015	A							
-----	--	---	------	------	---	--	--	--	--	--	--	--

Details

Means of verification: Informe de Asistencia Técnica Integral emitido por la empresa consultora y/o Informe de Evaluación Final del Programa emitido por la empresa consultora.

Observations: contribuye con el indicador básico de resultado 3 del PPCR

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Ingreso Neto Familiar de la producción agrícola de los hogares beneficiarios	U\$/hectarea	673.0	2015	P					1,158.00	1,158.00
					P(a)					1,158.00	1,158.00
					A						

Details

Means of verification: Informe de Asistencia Técnica Integral emitido por la empresa consultora y/o Informe de Evaluación Final del Programa emitido por la empresa consultora.

Observations: contribuye con el indicador básico de resultado 3 del PPCR

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.3	Ingreso Neto Familiar de la producción ganadera y lechera de los hogares beneficiarios	U\$/beneficiario	2071.0	2015	P					2,491.00	2,491.00
					P(a)					2,491.00	2,491.00
					A						

Details

Means of verification: Informe de Asistencia Técnica Integral emitido por la empresa consultora y/o Informe de Evaluación Final del Programa emitido por la empresa consultora.

Observations: contribuye con el indicador básico de resultado 3 del PPCR

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Modelo de gestión de la EPSAS aprobado por las autoridades del sector

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Modelo de gestión de la EPSAS aprobado por la AAPS y el MMAyA	Modelo	0.0	2015	P					1.00	1.00
					P(a)					1.00	1.00
					A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Informe del MMAyA y de la AAPS aprobando el modelo de gestión											
Observations: El modelo de gestión fue diseñado en base a la normativa vigente.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 3: Servicio de agua potable en trece comunidades rurales provisto (contribuye con el indicador básico de resultado 5 del PPCR)

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Hogares indígenas con acceso nuevo a agua potable en 13 comunidades del municipios de Batallas	Households (#)	0.0	2015	P					1,772.00	1,772.00
					P(a)					1,772.00	1,772.00
					A						

Details											
Means of verification: Informes semestrales e informe de evaluación final											
Observations: Planilla de Cierre de Obra emitido por el contratista y/o Informe Final del Supervisor y/o Acta de Recepción Definitiva de Proyecto y/o informe de Cierre Técnico del Proyecto emitido por la Gerencia Técnica de EMAGUA.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Indigenous				P						
					P(a)						
					A						

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.1	Hogares beneficiarios de acceso a agua potable, nuevos o mejorados	Households (#)	0.0	2015	P					185,209.00	185,209.00
					P(a)					185,209.00	185,209.00
					A						

Details											
Means of verification: Planilla de Cierre de Obra emitido por el contratista y/o Informe Final del Supervisor y/o Acta de Recepción Definitiva de Proyecto y/o informe de Cierre Técnico del Proyecto emitido por la Gerencia Técnica de EMAGUA.											
Observations: Corresponde al indicadore sectorial que refleja la cantidades de hogares cuyo acceso a agua potable fue mejorado como resultado del Progrma Contribuye el indicador básico del PPCR											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							
	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							

Outcome Nbr. 4: Sistema de agua en 13 comunidades del municipio de Batallas operando de manera sostenible

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.0	Sistema de agua de las 13 comunidades operando y mantenido según especificaciones técnicas de diseño	Sistema	0.0	2015	P						1.00	1.00
					P(a)						1.00	1.00
					A							

Details

Means of verification: Informe de evaluación final (contribuye con el indicador básico del resultado 3 del PPCR)

Observations: Informe técnico del operador del sistema de agua potable de las 13 comunidades.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 5: Ingreso de los regantes beneficiarios del programa aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
5.0	Número de agricultores con acceso a servicios mejorados de riego en la zona de intervención del programa	Beneficiaries (#)	5.0	2015	P					2,200.00	4,400.00	6,600.00
					P(a)					2,200.00	4,400.00	6,600.00
					A							

Details

Means of verification: Informe de Asistencia Técnica Integral emitido por la empresa consultora y/o Informe de Evaluación Final del Programa emitido por la empresa consultora.

Observations: contribuye con el indicador básico de resultado 4 del PPCR

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
5.1	Ingreso neto familiar en actividades agropecuarias de los beneficiarios del programa, medido por el ingreso neto familiar promedio por hectárea	U\$/Hectarea	1513.0	2015	P						2,500.00	2,500.00
					P(a)						2,500.00	2,500.00
					A							
Details												
Means of verification: Informe de Asistencia Técnica Integral emitido por la empresa consultora y/o Informe de Evaluación Final del Programa emitido por la empresa consultora.												
Observations: contribuye con el indicador básico de resultado 5 del PPCR												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 6: Capacidad de respuesta a los impactos de cambio climáticos de las comunidades en las cuencas Jacha Jahuira y Khullu Cachi fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
6.0	Personas capacitadas en el área de intervención del proyecto que han implementado acciones que contribuyan a mejorar su capacidad de respuesta al cc tales como: (i) manejo sostenible del suelo, (ii) manejo de áreas degradadas, (iii) manejo y recuperación de praderas nativas, (iv) conservación de fuentes y uso de adecuado de agua	Beneficiaries (#)	0.0	2015	P						200.00	200.00
					P(a)						200.00	200.00
					A							
Details												
Means of verification: Informe de Asistencia Técnica Integral de las cuencas Jacha Jahuira y Khullu Cachi y/o Informe de Evaluación Final del Programa emitido por la empresa consultora.												
Observations: contribuye con el indicador básico de resultado 4 del PPCR												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Provisión de agua para los municipios de El Alto y Batallas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2021	2016	EOP 2021
1.1	Represas en las lagunas de Khotia-Khota y Taypichaca construidas	Represas	P		2		3,951,639.8
			P(a)		2		3,951,639.8
			A		0		0
1.2	Línea de Aducción construida	Km	P		56.2		43,256,457.31
			P(a)		56.2		43,256,457.31
			A		0		0
1.3	Planta Potabilizadora de Agua construida	Planta	P		1		9,643,752.15
			P(a)		1		9,643,752.15
			A		0		0
1.4	Tubería de interconexión de agua potable construida	Km	P		12.6		11,544,530.96
			P(a)		12.6		11,544,530.96
			A		0		0
1.5	Sistema rural de agua potable construido para 13 comunidades del municipio de Batallas	Sistema	P		1		2,317,519.11
			P(a)		1		2,317,519.11
			A		0		0
1.6	Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS) para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable para 13 comunidades capacitado	Comité	P		1		20,000
			P(a)		1		20,000
			A		0		0
1.7	Programa de atención y manejo de conflictos implementado	Programa	P		1		80,678
			P(a)		1		80,678
			A		0		0
1.8	Personal operativo y de planificación del operador capacitado en el uso de sistemas de apoyo a la toma de decisiones para el manejo sostenible y resiliente del sistema de abastecimiento de agua	Personas	P		50		80,000
			P(a)		50		80,000
			A		0		0
1.9	Eventos de capacitación en uso del agua y salud con enfoque de género y jóvenes en 13 comunidades del municipio de Batallas realizados	Evento	P		78		245,000
			P(a)		78		245,000
			A		0		0
1.10	Campañas de comunicación participativas en manejo sustentable del agua y salud para la población rural en el área del proyecto realizadas	Campaña	P		9		200,000
			P(a)		9		200,000
			A		0		0
1.11	Plan de reasentamientos implementado	Plan	P		1		164,000
			P(a)		1		164,000
			A		0		0
1.12	Programa de iniciativas productivas para mujeres implementado	Programa	P		1		569,570
			P(a)		1		569,570
			A		0		0
1.13	Modelo de gestión de la EPSA diseñado	Modelo	P		1		200,000
			P(a)		1		200,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de riego

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2021	2016	EOP 2021
2.1	Tubería de conducción para riego en la Cuenca Jacha Jahuira construida	Km	P		112.8		21,685,627.79
			P(a)		112.8		21,685,627.79
			A		0		0
2.2	Tubería de conducción para riego en la Cuenca Kullu Kachi construida	Km	P		108.7		23,642,584.63
			P(a)		108.7		23,642,584.63
			A		0		0
2.3	Canales P1 y P2 rehabilitados	Km	P		47.8		2,467,497.09
			P(a)		47.8		2,467,497.09
			A		0		0
2.4	Proyecto piloto con riego tecnificado en Alto Peñas realizado	Km	P		23		552,374
			P(a)		23		552,374
			A		0		0
2.5	Dirigentes comunitarios en las cuencas de Jacha Jahuira y Kullu Cachi capacitados en resolución de conflictos	Personas	P		56		50,000
			P(a)		56		50,000
			A		0		0
2.6	Comisión Técnica de Operación del Programa Multipropósito (COTEMU) de las cuencas Jacha Jahuira y Kullu Cachi creado	Comisión	P		1		50,000
			P(a)		1		50,000
			A		0		0
2.7	Plan de asistencia técnica integral (ATI) referentes a riego y/o producción agrícola en la cuenca Jacha Jahuira implementado	Plan	P		1		250,000
			P(a)		1		250,000
			A		0		0
2.8	Plan de asistencia técnica integral (ATI) referentes a riego y/o producción agrícola en la cuenca Kullu Cachi implementado	Plan	P		1		250,000
			P(a)		1		250,000
			A		0		0

Component Nbr. 3 Componente 3: Manejo Integral de la cuenca y ordenamiento del territorio con visión de cambio climático

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2021	2016	EOP 2021
3.1	Plan de Manejo Integral de la Cuenca (MIC) del rio Jacha Jahuira con un enfoque de cambio climático implementado	Plan	P		1		1,669,611
			P(a)		1		1,669,611
			A		0		0
3.2	Plan de Manejo Integral de la Cuenca (MIC) del rio Kullu Khachi con un enfoque de cambio climático implementado	Plan	P		1		1,818,238
			P(a)		1		1,818,238
			A		0		0
3.3	Sistema de monitoreo y conservación de cuerpos de agua implementado	Sistema	P		1		882,151
			P(a)		1		882,151
			A		0		0

Other Cost

Apoyo a la Ejecución del Programa - Fuente Contrato de Prestamo	P					3,290,466.16
	P(a)					3,290,466.16
	A					0
Apoyo a la Ejecución del Programa - Fuente Fondo Nórdico	P					218,500
	P(a)					218,500
	A					0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditoría	P				250,000
		P(a)				250,000
		A				0
	Monitoreo y evaluación	P				581,000
		P(a)				581,000
		A				0
	Proyectos y Estudios Adicionales (Puede utilizarse en componentes 1, 2 y 3).	P				3,083,939
		P(a)				3,083,939
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P				133,015,136
		P(a)				133,015,136
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
