





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial		
Sector: WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN		
Número da Operação: 2732/OC-CO	Atual: 60.000.000,00	Original BID: 60.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 60.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: CO-T1262, RG-P1478	Saldo: 60.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 60.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 0

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-mar-2013 Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013

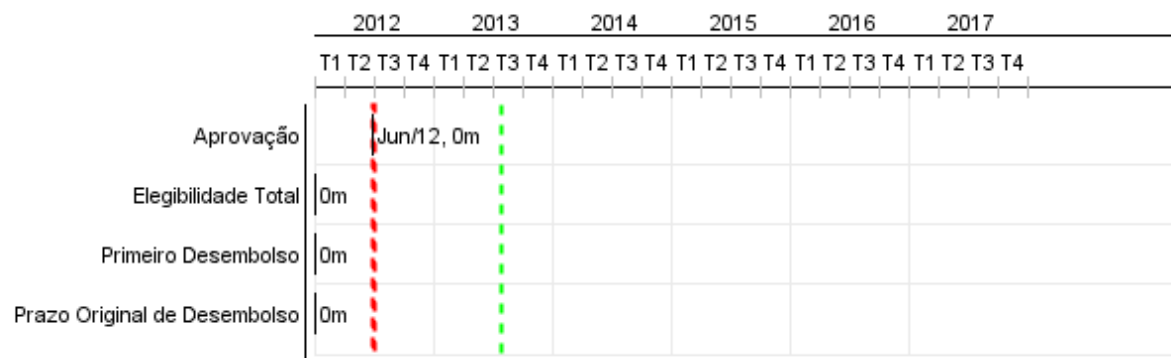

Progresso Acumulado até 2012

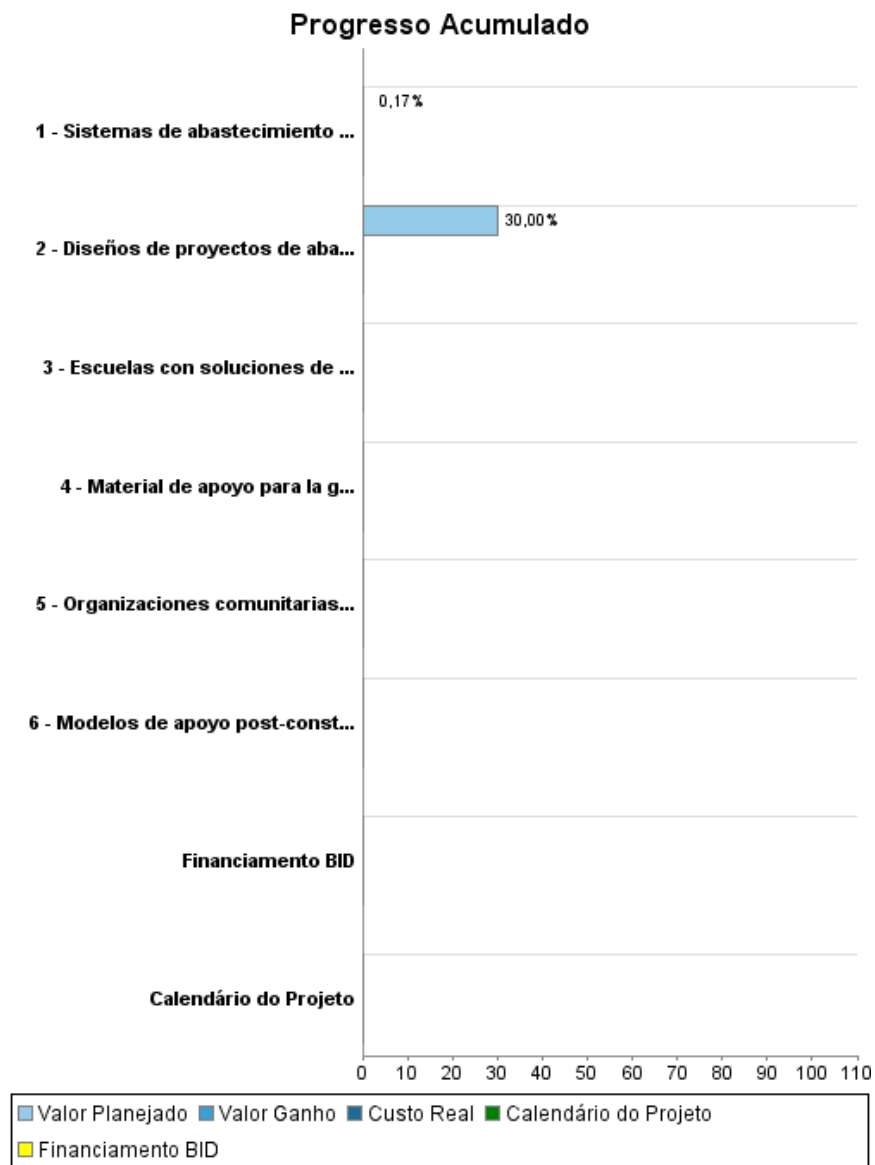

Resultados

Resultado: Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional Local

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Sistemas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales administrados por una organización creada o fortalecida	Sistemas		2011	P A			7,00	20,00	6,00	8,00	41,00

Resultado: Infraestructura de abastecimiento de aguas y manejo de aguas residuales en la zona rural

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Hogares con acceso domiciliario a agua potable a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados	Hogares		2011	P A			1.087,00	4.684,00	1.594,00	1.135,00	8.500,00
Hogares con nueva solución de saneamiento adecuada	Hogares		2011	P A			1.087,00	4.684,00	2.390,00	2.039,00	10.200,00
Establecimientos educativos con condiciones mejoradas de abastecimiento de agua y/o saneamiento básico	Escuelas		2011	P A			7,00	20,00	6,00	8,00	41,00

Resultado: Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en las zonas rurales

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Modelos implementados de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento	Modelos		2011	P A				1,00		1,00	2,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Desarrollo comunitario y Fortalecimiento Institucional Local									
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas	Organizaciones				41,00				700.000,00
Material de apoyo para la gestión técnica, operativa y administrativa para las organizaciones comunitarias elaborado	Set de Cartillas				3,00				300.000,00
Ingeniería e Infraestructura									
Diseños de proyectos de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales elaborados	Diseños				34,00				3.421.870,00
Sistemas de abastecimiento y de manejo de aguas residuales construidos, ampliados y/o optimizados.	Sistemas				41,00				48.662.000,00
Escuelas con soluciones de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales, mejoradas o construidas.	Escuelas				41,00				880.000,00
Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios									
Modelos de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento, diseñados.	Modelos				2,00				1.000.000,00
Administración y Supervisión									
Administración y supervisión del Programa	N/A								3.474.000,00
Auditoría y Seguimiento									
Auditoría y Seguimiento	N/A								600.000,00
Sin asignación específica - Imprevistos									
Sin asignación imprevistos - Imprevistos	N/A								962.000,00
TOTAL									59.999.870,00
