




Rapport Résumé

| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | | Coût Total et Source de Financement | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Agence d' Exécution (EA): | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | | | | |
| Secteur: | WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN | | | | |
| Numéro(s) de Prêt(s): | 2732/OC-CO | Montant Courant Approuvé: | 60.000.000,00 | Initial BID: | 60.000.000,00 |
| Étape: | Approved | Montant Décaissé à ce Jour: | | Courant BID: | 60.000.000,00 |
| Type d' Opération: | INV - Investissement | % Décaissé: | | Pari Passu: | 100,00 |
| Opération(s) Connexe(s): | CO-T1262, RG-P1478 | Solde: | 60.000.000,00 | Cofinancement/Pays: | |
| Sous-Type de l'Opération: | ESP - Specific Investment Operation | | | Estimation Initiale: | 60.000.000,00 |
| | | | | Période d'Amortissement (mois): | 0 |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B | () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 27-mar-2013 Validé par le Représentant: 10-abr-2013 |

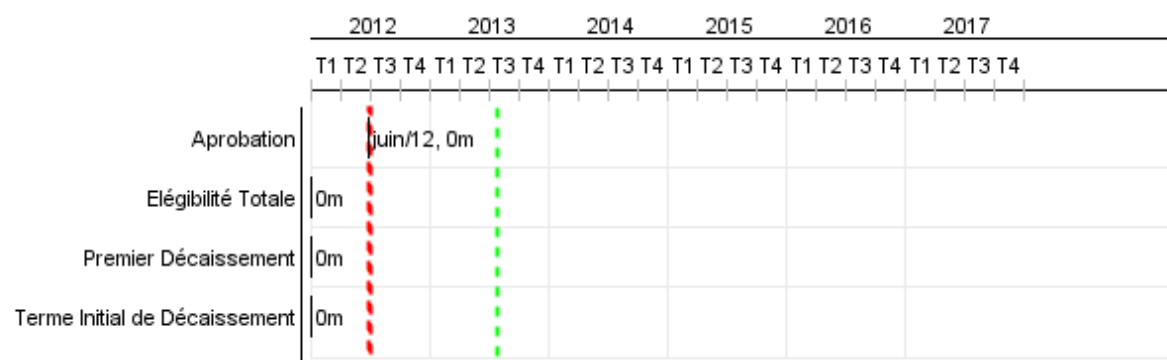

Progrès Cumulé à 2012

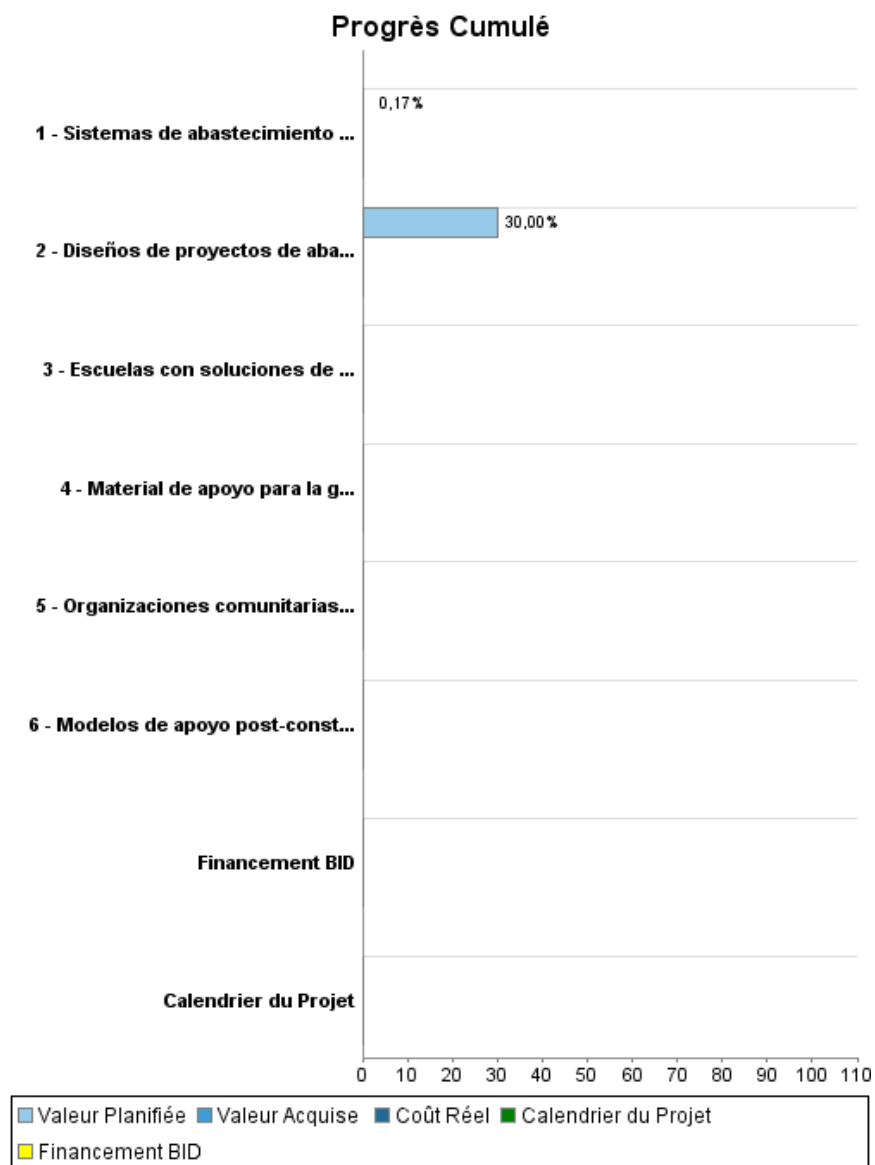

Résultats

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional Local |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|-------|------|------|---------------|
| Sistemas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales administrados por una organización creada o fortalecida | Sistemas | | 2011 | P A | | | 7,00 | 20,00 | 6,00 | 8,00 | 41,00 |

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Infraestructura de abastecimiento de aguas y manejo de aguas residuales en la zona rural |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Hogares con acceso domiciliario a agua potable a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados | Hogares | | 2011 | P A | | | 1.087,00 | 4.684,00 | 1.594,00 | 1.135,00 | 8.500,00 |
| Hogares con nueva solución de saneamiento adecuada | Hogares | | 2011 | P A | | | 1.087,00 | 4.684,00 | 2.390,00 | 2.039,00 | 10.200,00 |
| Establecimientos educativos con condiciones mejoradas de abastecimiento de agua y/o saneamiento básico | Escuelas | | 2011 | P A | | | 7,00 | 20,00 | 6,00 | 8,00 | 41,00 |

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en las zonas rurales |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| Modelos implementados de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadoras de sistemas de agua y saneamiento | Modelos | | 2011 | P A | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 |

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|---|------------------|----------|------|-----------------|------------|-----------|------|----------------|----------------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Desarrollo comunitario y Fortalecimiento Institucional Local | | | | | | | | | |
| Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas | Organizaciones | | | | 41,00 | | | | 700.000,00 |
| Material de apoyo para la gestión técnica, operativa y administrativa para las organizaciones comunitarias elaborado | Set de Cartillas | | | | 3,00 | | | | 300.000,00 |
| Ingeniería e Infraestructura | | | | | | | | | |
| Diseños de proyectos de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales elaborados | Diseños | | | | 34,00 | | | | 3.421.870,00 |
| Sistemas de abastecimiento y de manejo de aguas residuales construidos, ampliados y/o optimizados. | Sistemas | | | | 41,00 | | | | 48.662.000,00 |
| Escuelas con soluciones de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales, mejoradas o construidas. | Escuelas | | | | 41,00 | | | | 880.000,00 |
| Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios | | | | | | | | | |
| Modelos de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento, diseñados. | Modelos | | | | 2,00 | | | | 1.000.000,00 |
| Administración y Supervisión | | | | | | | | | |
| Administración y supervisión del Programa | N/A | | | | | | | | 3.474.000,00 |
| Auditoría y Seguimiento | | | | | | | | | |
| Auditoría y Seguimiento | N/A | | | | | | | | 600.000,00 |
| Sin asignación específica - Imprevistos | | | | | | | | | |
| Sin asignación imprevistos - Imprevistos | N/A | | | | | | | | 962.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 59.999.870,00 |
