
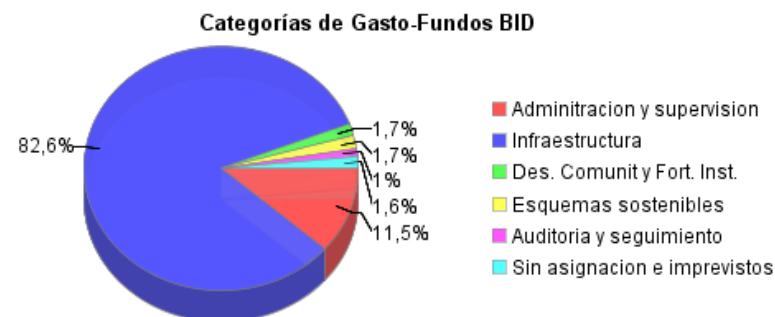




## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial		
Sector: WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN		
Número da Operação: 2732/OC-CO	Atual: 60.000.000,00	Original BID: 60.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 60.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: CO-T1262, RG-P1478	Saldo: 60.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 60.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 0

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 20-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 20-sep-2013

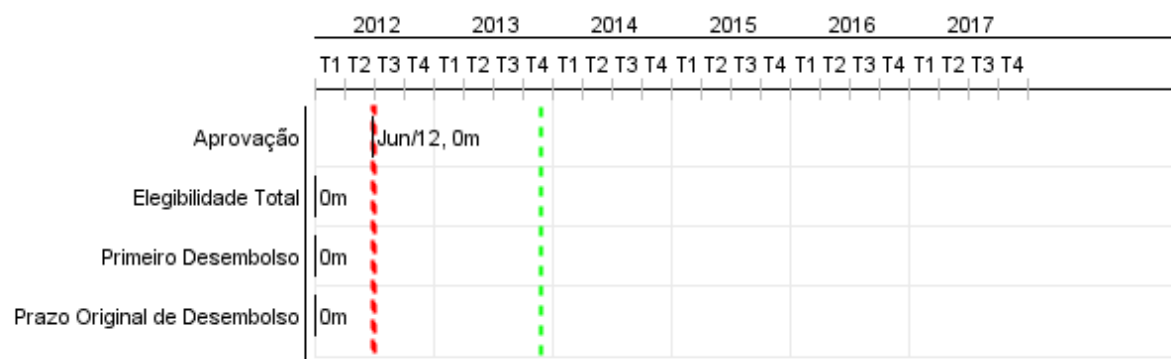

## Progresso Acumulado até 2013

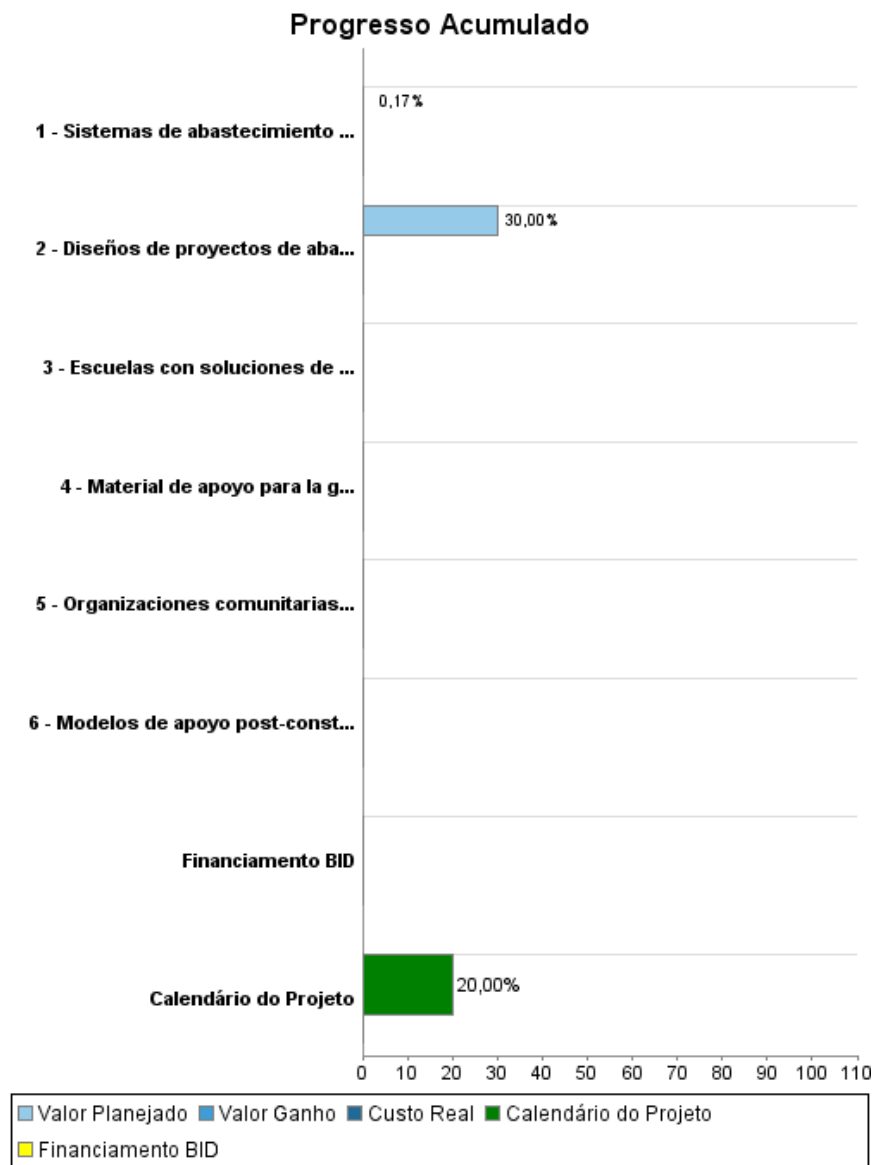

## Resultados

**Resultado:** Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional Local

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Sistemas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales administrados por una organización creada o fortalecida	Sistemas		2011	P A			7,00	20,00	6,00	8,00	41,00

**Resultado:** Infraestructura de abastecimiento de aguas y manejo de aguas residuales en la zona rural

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados	Hogares		2011	P A			1.087,00	4.684,00	1.594,00	1.135,00	8.500,00
Hogares con nueva solución de saneamiento adecuada	Hogares		2011	P A			1.087,00	4.684,00	2.390,00	2.039,00	10.200,00
Establecimientos educativos con condiciones mejoradas de abastecimiento de agua y/o saneamiento básico	Escuelas		2011	P A			7,00	20,00	6,00	8,00	41,00
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Hogares		2013	P A			1.087,00	4.684,00	2.390,00	2.039,00	10.200,00

**Resultado:** Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en las zonas rurales

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Modelos implementados de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento	Modelos		2011	P A				1,00		1,00	2,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Desarrollo comunitario y Fortalecimiento Institucional Local</b>									
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas	Organizaciones				41,00				700.000,00
Material de apoyo para la gestión técnica, operativa y administrativa para las organizaciones comunitarias elaborado	Set de Cartillas				3,00				300.000,00
<b>Ingeniería e Infraestructura</b>									
Diseños de proyectos de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales elaborados	Diseños				34,00	1.026.579,00			3.421.870,00
Sistemas de abastecimiento y de manejo de aguas residuales construidos, ampliados y/o optimizados.	Sistemas				41,00	82.911,00			48.662.000,00
Escuelas con soluciones de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales, mejoradas o construidas.	Escuelas				41,00				880.000,00
<b>Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios</b>									
Modelos de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento, diseñados.	Modelos				2,00				1.000.000,00
<b>Administración y Supervisión</b>									
Administración y supervisión del Programa	N/A					513.868,00			3.474.000,00
<b>Auditoría y Seguimiento</b>									
Auditoría y Seguimiento	N/A					12.000,00			600.000,00
<b>Sin asignación específica - Imprevistos</b>									
Sin asignación imprevistos - Imprevistos	N/A								962.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.635.358,00</b>			<b>59.999.870,00</b>
