
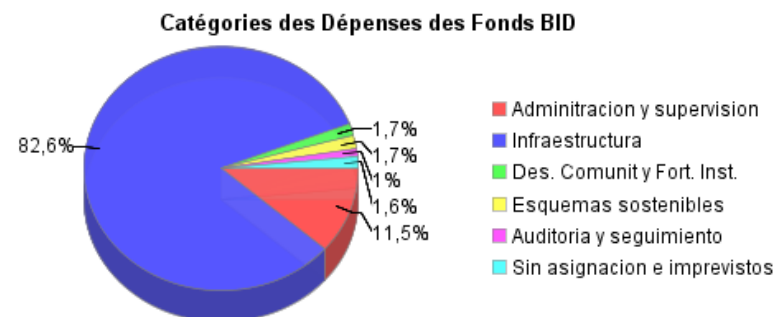




## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial				
Secteur:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN				
Numéro(s) de Prêt(s):	2732/OC-CO	Montant Courant Approuvé:	60.000.000,00	Initial BID:	60.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	60.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	CO-T1262, RG-P1478	Solde:	60.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	60.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	0

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 20-sep-2013 Validé par le Représentant: 20-sep-2013

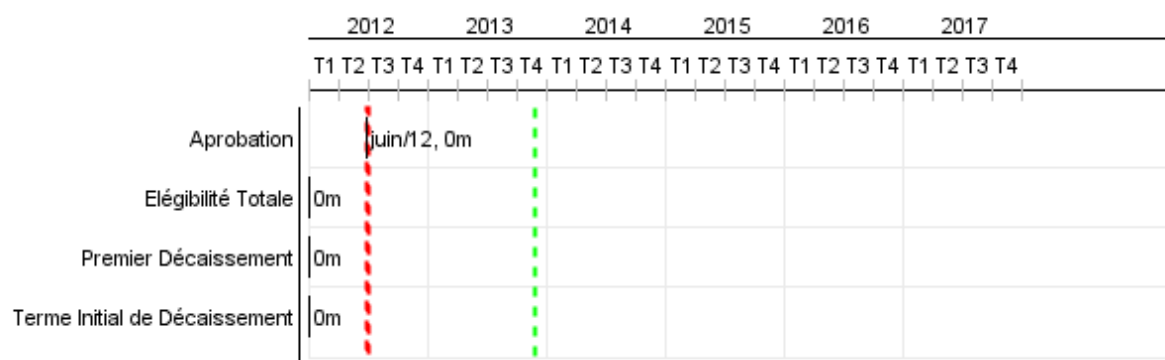

## Progrès Cumulé à 2013

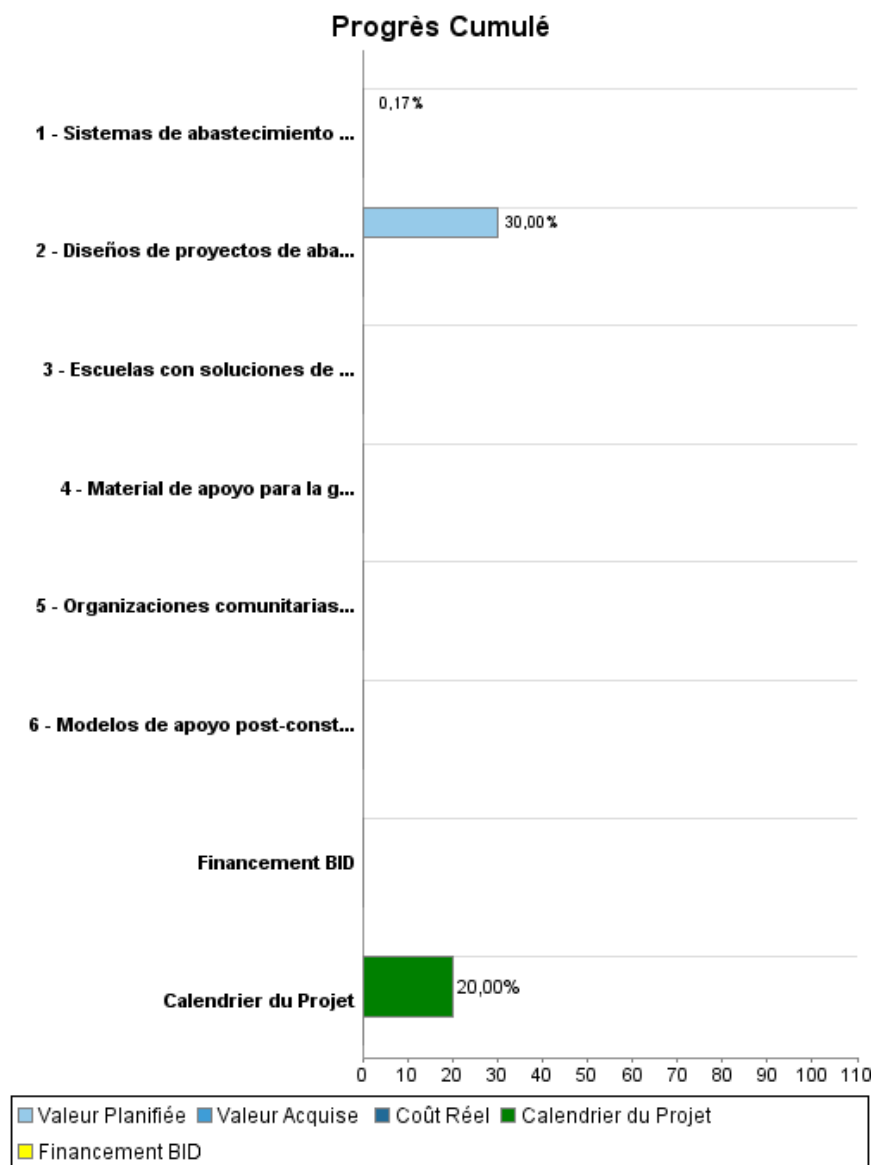

## Résultats

**Résultat:** Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional Local

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Sistemas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales administrados por una organización creada o fortalecida	Sistemas		2011	P A			7,00	20,00	6,00	8,00	41,00

**Résultat:** Infraestructura de abastecimiento de aguas y manejo de aguas residuales en la zona rural

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Hogares con acceso domiciliario a agua potable a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados	Hogares		2011	P A			1.087,00	4.684,00	1.594,00	1.135,00	8.500,00
Hogares con nueva solución de saneamiento adecuada	Hogares		2011	P A			1.087,00	4.684,00	2.390,00	2.039,00	10.200,00
Establecimientos educativos con condiciones mejoradas de abastecimiento de agua y/o saneamiento básico	Escuelas		2011	P A			7,00	20,00	6,00	8,00	41,00
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Hogares		2013	P A			1.087,00	4.684,00	2.390,00	2.039,00	10.200,00

**Résultat:** Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en las zonas rurales

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Modelos implementados de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento	Modelos		2011	P A				1,00		1,00	2,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Desarrollo comunitario y Fortalecimiento Institucional Local</b>									
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas	Organizaciones				41,00				700.000,00
Material de apoyo para la gestión técnica, operativa y administrativa para las organizaciones comunitarias elaborado	Set de Cartillas				3,00				300.000,00
<b>Ingeniería e Infraestructura</b>									
Diseños de proyectos de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales elaborados	Diseños				34,00	1.026.579,00			3.421.870,00
Sistemas de abastecimiento y de manejo de aguas residuales construidos, ampliados y/o optimizados.	Sistemas				41,00	82.911,00			48.662.000,00
Escuelas con soluciones de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales, mejoradas o construidas.	Escuelas				41,00				880.000,00
<b>Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios</b>									
Modelos de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento, diseñados.	Modelos				2,00				1.000.000,00
<b>Administración y Supervisión</b>									
Administración y supervisión del Programa	N/A					513.868,00			3.474.000,00
<b>Auditoría y Seguimiento</b>									
Auditoría y Seguimiento	N/A					12.000,00			600.000,00
<b>Sin asignación específica - Imprevistos</b>									
Sin asignación imprevistos - Imprevistos	N/A								962.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.635.358,00</b>			<b>59.999.870,00</b>
