
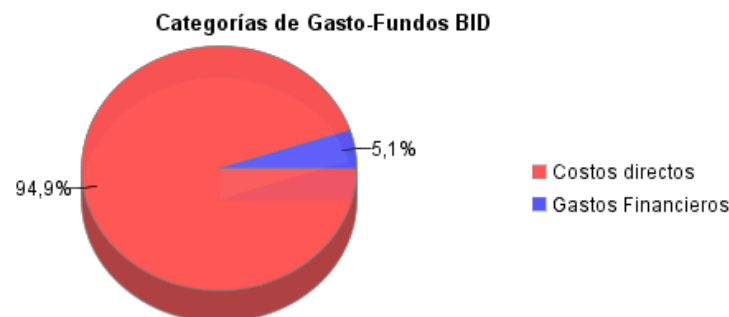
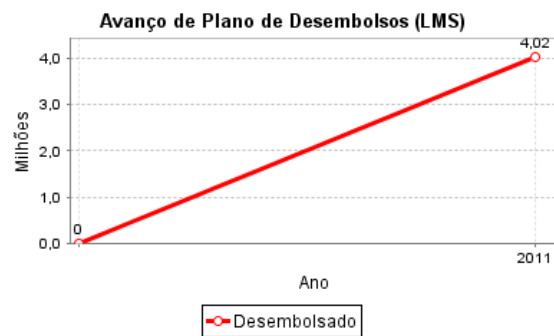


Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS				
Sector:	ENERGY-POWER LINES				
Número da Operação:	2342/BL-NI	Atual:	30.500.000,00	Original BID:	30.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	4.017.632,28	Corrente BID:	30.500.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	13,17	Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:	NI-T1094, NI-L1048	Saldo:	26.482.367,72	Cofinanciamento/País:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	30.500.000,00
				Período de Amortização (meses):	286

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Nov 18, 2011 Validado pelo Representante do País: Nov 18, 2011

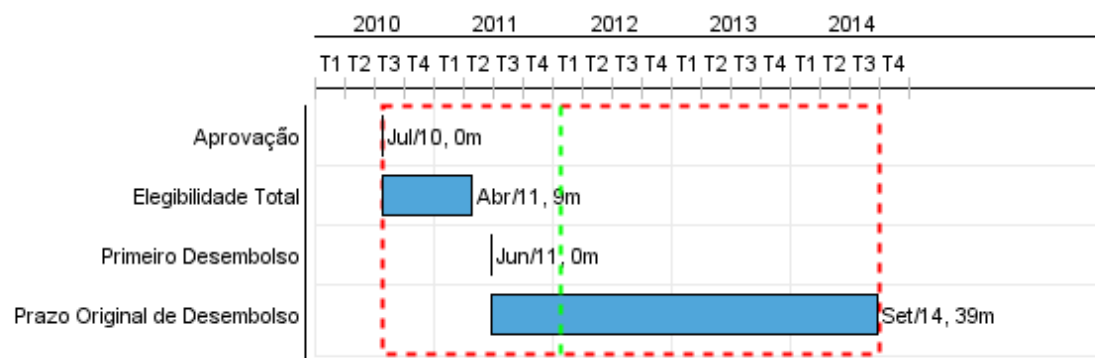

Progresso Acumulado até 2011




RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

NI-L1040 - National Sustainable Electrification and Renewable Energy Program (PNESER) Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento)

2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Última Atualização do PMR: 09/11/2011

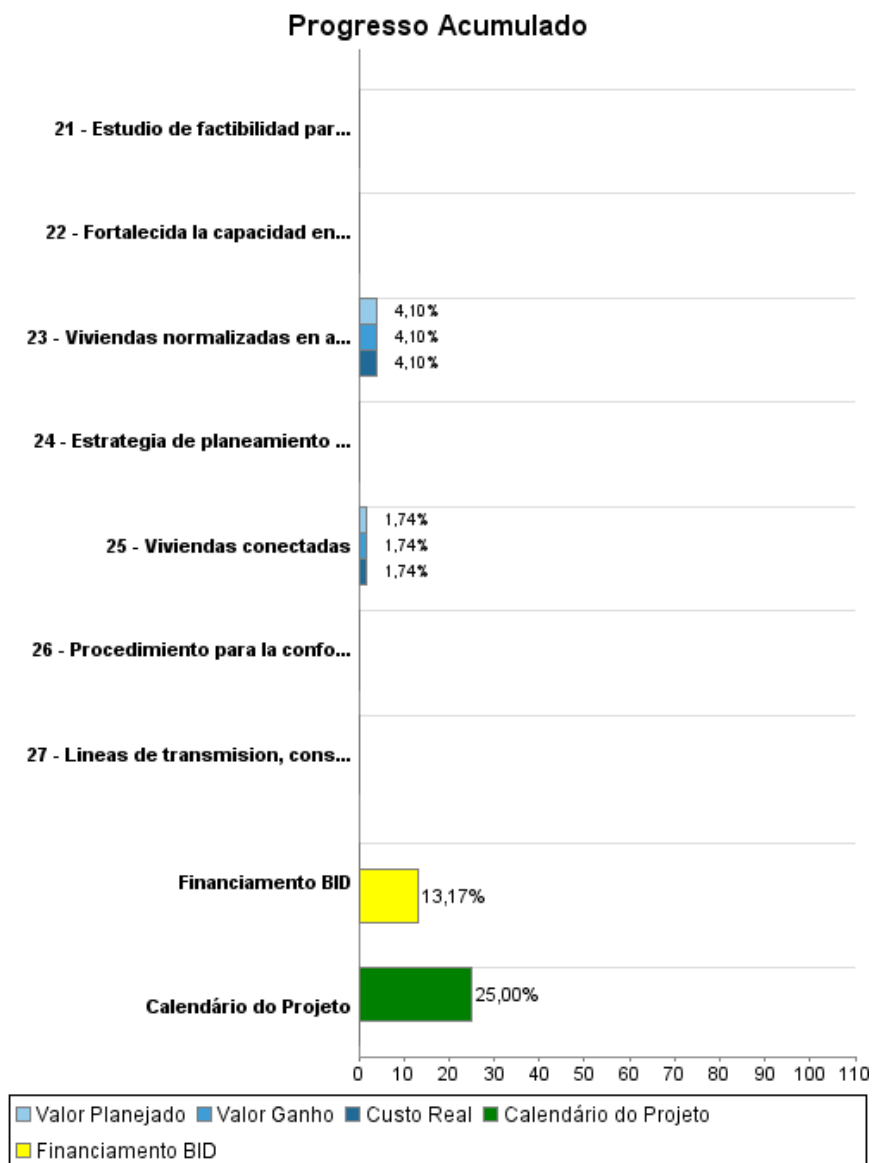

Resultados

Resultado: Proportion importante de la poblacion con acceso a un servicio de electricidad confiable

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2014	Final do Projeto
Cobertura del servicio electrico en el pais	Porcentaje	64,60	2009	P A	77,90	85,50	85,50
Confiabilidad del servicio electrico en el sistema de transmision, asociado al indice de falla	indice de falla	6,42	2009	P A	6,33	6,10	6,10

Resultado: Matriz energetica modificada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2014	Final do Projeto
Proporción de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables	%	35,00	2009	P A	55,00		86,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Electrificación rural por extension de redes									
Viviendas conectadas	Viviendas				117.390,00	1.862.000,00	1.862.000,00		106.932.000,00
2. Normalizacion del servicio en asentamientos									
Viviendas normalizados en asentamientos (clientes nuevos)	Viviendas				50.569,00	440.000,00	440.000,00		10.550.700,00
Viviendas normalizadas en asentamientos (clientes existentes)	Viviendas				113.476,00	1.319.000,00	1.318.962,00		32.155.400,00
3. Expansion en zonas aisladas con energia renovable (ER)									
Usuarios conectados en proyectos con ER en sistemas aislados	Usuarios				5.820,00				15.851.200,00
Una Estrategia para la atención de las Zonas aisladas aprobada	Estrategia				1,00				25.000,00
4. Preinversion y estudios proyectos generacion de ER									
Estrategia de planeamiento y expansión de la generación eléctrica del Pais actualizada y aprobada.	Estrategia				1,00				670.000,00
Plan maestro de la Cuenca del Rio Grande de Matagalpa y Superior del Río Coco, elaborado	Estudio				1,00				3.342.000,00
Estudio de prospección y evaluación de potencial eólico y Estudio de Factibilidad para sistema de generación eólica en seis sitios para interconexión al SIN, elaborados	Estudio				1,00				1.080.000,00
Estudio de factibilidad para la implementación de generación eléctrica distribuida en Nicaragua, elaborado	Estudio				1,00				80.000,00
Estudio de Pre-Factibilidad para el Proyecto Geotérmico Volcan Cosiguina, elaborado	Estudio				1,00				3.750.000,00
Capacidad/Potencia de energía renovable, estudiada a nivel de factibilidad	MW				358,00				9.977.900,00
5. Eficiencia Energetica									
Luminarias instaladas para plan de ahorro de alumbrado público	Luminarias				25.604,00				6.760.000,00
Luminarias instaladas para sustitución de bujías incandescentes por lámpara fluorescentes compactas en el sector residencial	Luminarias				2.000.000,00				3.200.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

NI-L1040 - National Sustainable Electrification and Renewable Energy Program (PNESER)
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Última Atualização do PMR: 09/11/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Luminarias instaladas para sustitución de lámparas fluorescentes magnéticas por electrónicas en el sector gobierno	Luminarias				20.000,00				1.100.000,00
Sistemas solares térmicos instalados para proyecto demostrativo	Sistemas				13,00				1.248.000,00
Sistemas instalados para ingeniería y desarrollo de la refrigeración y climatización con energía solar	Sistemas				75,00				750.000,00
Sistemas fotovoltaicos instalados para la implementación de sistemas productivos en zonas rurales	Sistemas				750,00				1.500.000,00
Procedimiento para la conformidad de normativas de eficiencia energética, elaborado	Estudio				1,00				100.000,00
Estudio para el desarrollo de política, programa nacional y anteproyecto de ley de eficiencia energética, elaborado	Estudio				1,00				100.000,00
Estudio para la definición de indicadores de eficiencia energética para los sectores de consumo energético, elaborado	Estudio				1,00				100.000,00
Fortalecida la capacidad en materia de eficiencia energética en áreas: eléctrica, térmica, aire comprimido y procesos industriales; funcionarios capacitados	Funcionarios				4,00				142.000,00
6. Refuerzo sistema transmision zonas rurales									
Lineas de transmision, construidas	Kilómetros				554,00				105.300.000,00
Subestaciones ampliadas	MVA				130,00				28.324.200,00
7. Sostenibilidad sistema aislados ENEL									
Agencias de ENEL conectadas al Sistema de Gestión Comercial	Agencias				28,00	86.000,00			2.500.000,00
Capacidad/Potencia de energía renovable evaluada	kW				7.060,00				1.084.000,00
Comunidades aisladas con estudios de potencial de energía renovable	Comunidades				20,00				400.000,00
Capacidad/Potencia de energía renovable instalada	kW				982,00				4.993.000,00
TOTAL						3.707.000,00	3.620.962,00		342.015.400,00
