
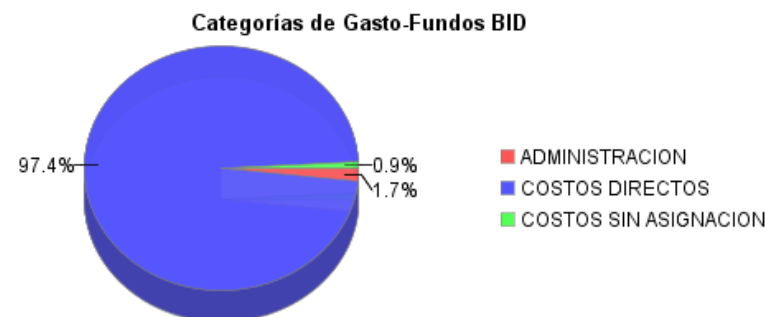



## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
Setor:	TRANSPORT-RURAL ROADS				
Número da Operação:	2369/OC-ES	Atual:	35.000.000,00	Original BID:	35.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	500.000,00	Corrente BID:	35.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	1,43	Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:	ES-P1060	Saldo:	34.500.000,00	Cofinanciamento/País:	
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimado:	35.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	242

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 28-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012

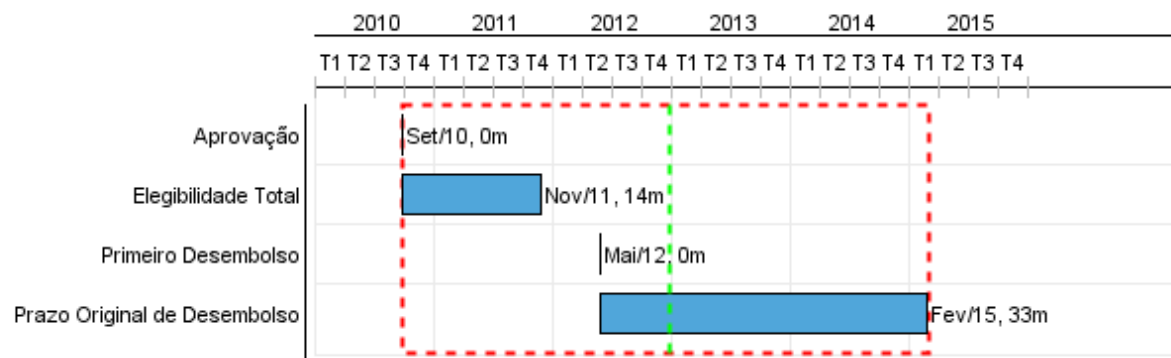

## Progresso Acumulado até 2012

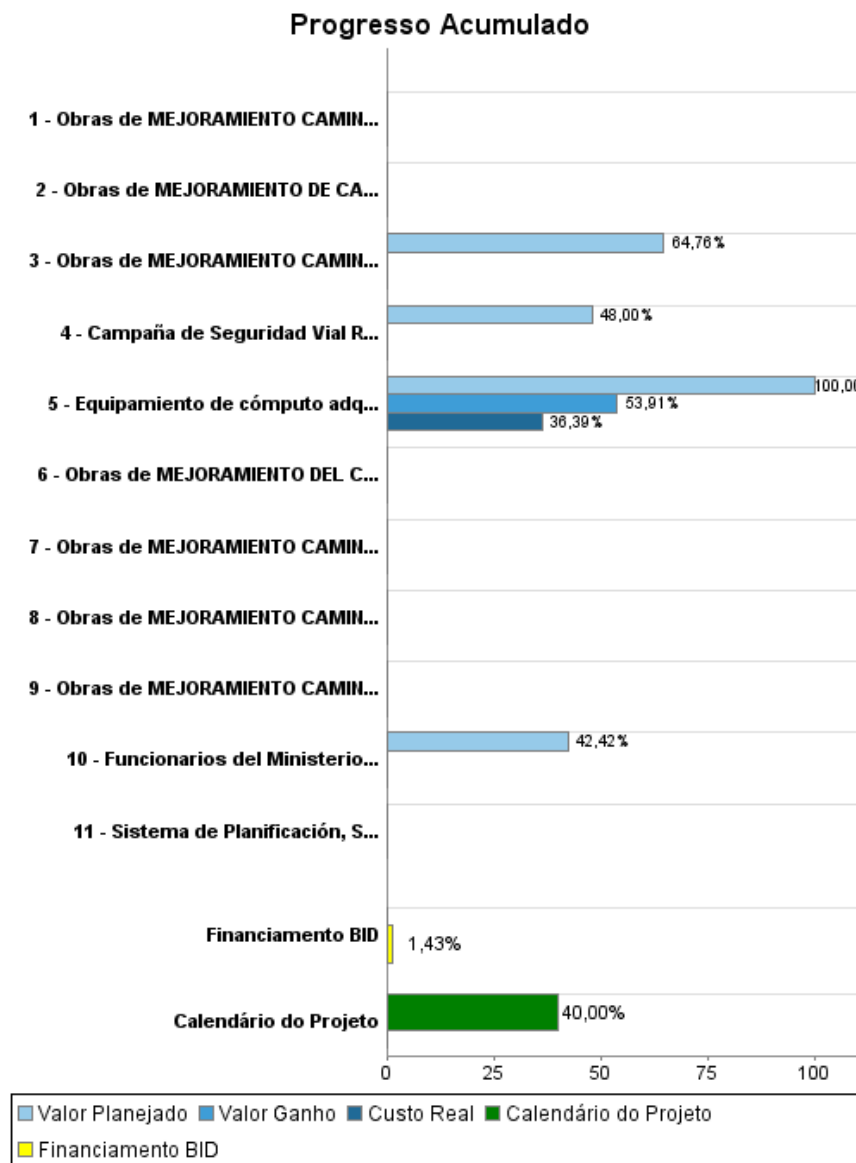

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Costo de Transporte reducido
<b>Observações:</b>	Se definirán los valores de los indicadores una vez finalizado el Estudio de Factibilidad Económica; Valorar meta para primer año de habilitación de las obras de mejora; Transitabilidad permanente para primer año de las obras

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2011	P A	0.40
Velocidad para los Usuarios de Automóviles	Km/h	24.70	2011	P A	50.00
Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5.93	2011	P A	3.50
Velocidad para los Usuarios de Autobuses	Km/h	22.70	2011	P A	45.00
Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2011	P A	2.15
Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	Km/h	22.70	2011	P A	45.00

<b>Resultado:</b>	Acceso a través de los caminos rurales mejorado
-------------------	-------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Días de intransitabilidad o con restricciones severas al tránsito a través de los caminos	Días		2011	P A	

<b>Resultado:</b>	Calidad de la red de caminos rurales incrementada
-------------------	---------------------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Caminos con un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 3 m/km, dotados de drenajes y de dispositivos de seguridad	Km		2011	P A	61.26

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente I: Obras de Vialidad Rural y su Supervisión</b>									
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario LIB31N, Tramo: San Pablo Tacachico - Canton San Isidro, La Libertad ejecutadas	Kilómetros				12,17				5.910.991,67
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario CHA25N, Tramo: Nueva Concepción - LD. La Libertad, Chalaténango ejecutadas	Kilómetros				9,42	2.755.146,40			4.254.716,09
Obras de MEJORAMIENTO DE CAMINO Terciario LIB22S: Et. LIB05W (Dv. Comasagua) - Dv. LIB18S (Chiltiupan). La Libertad ejecutadas	Kilómetros				9,58				5.880.961,32
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAM33, Tramo Canton San Antonio - Canton El Carrizal Dep. San Miguel - Morazan ejecutadas	Kilómetros				7,00				3.945.098,08
Obras de MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MOR13W Tramo San Simon - San Isidro, Dep. Morazan ejecutadas	Kilómetros				3,50				1.972.549,55
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO RURAL No. 7, ejecutadas	Kilómetros				7,52				3.841.622,34
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario SAV29S, Tramo: San Carlos Lempa (SAV 09S) hacia La Pita, Tecoluca, San Vicente, ejecutadas	Kilómetros				13,92				6.844.061,11
<b>Componente II: Fortalecimiento Institucional</b>									
Sistema de Planificación, Supervisión y Evaluación de Impacto implantado	Sistema				1,00				400.000,00
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) capacitados	Funcionarios	76,00			548,00	84.835,00			200.000,00
Equipamiento de cómputo adquirido	Unidades	256,00	138,00		256,00	650.000,00	236.557,18		650.000,00
Campaña de Seguridad Vial Rural ejecutada	Campaña	1,00			7,00	96.000,00			200.000,00
<b>Costo y Financiamiento</b>									
Administración y Auditoría	N/A					155.000,00			600.000,00
Costos sin asignación	N/A								300.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.740.981,40</b>	<b>236.557,18</b>		<b>35.000.000,16</b>
