
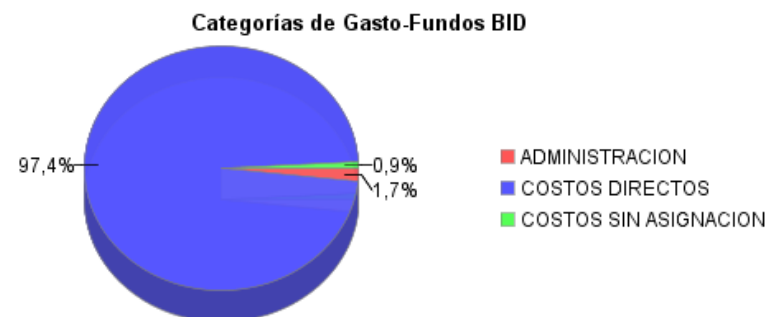
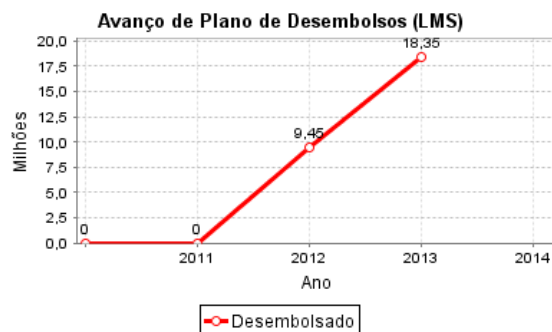



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
Setor:	TRANSPORT-RURAL ROADS				
Número da Operação:	2369/OC-ES	Atual:	35.000.000,00	Original BID:	35.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	18.346.993,44	Corrente BID:	35.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	52,42	Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:	ES-P1060	Saldo:	16.653.006,56	Cofinanciamento/País:	
Subtipo de Operação:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimado:	35.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	242

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2013

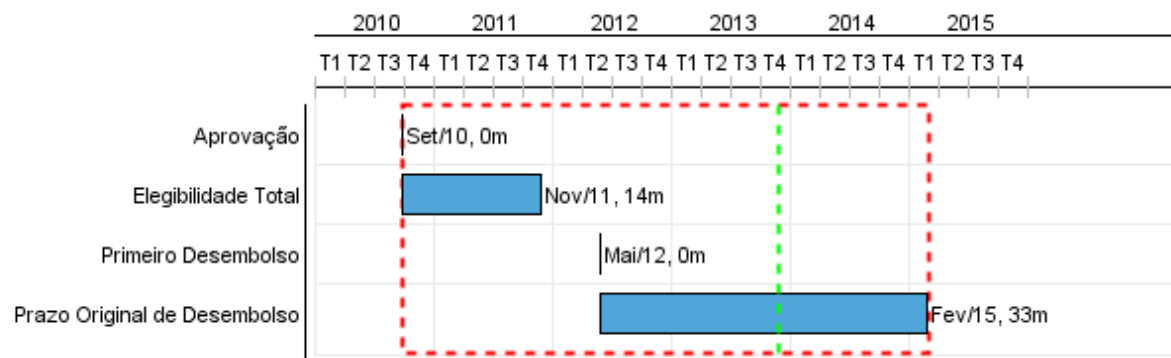

Progresso Acumulado até 2013

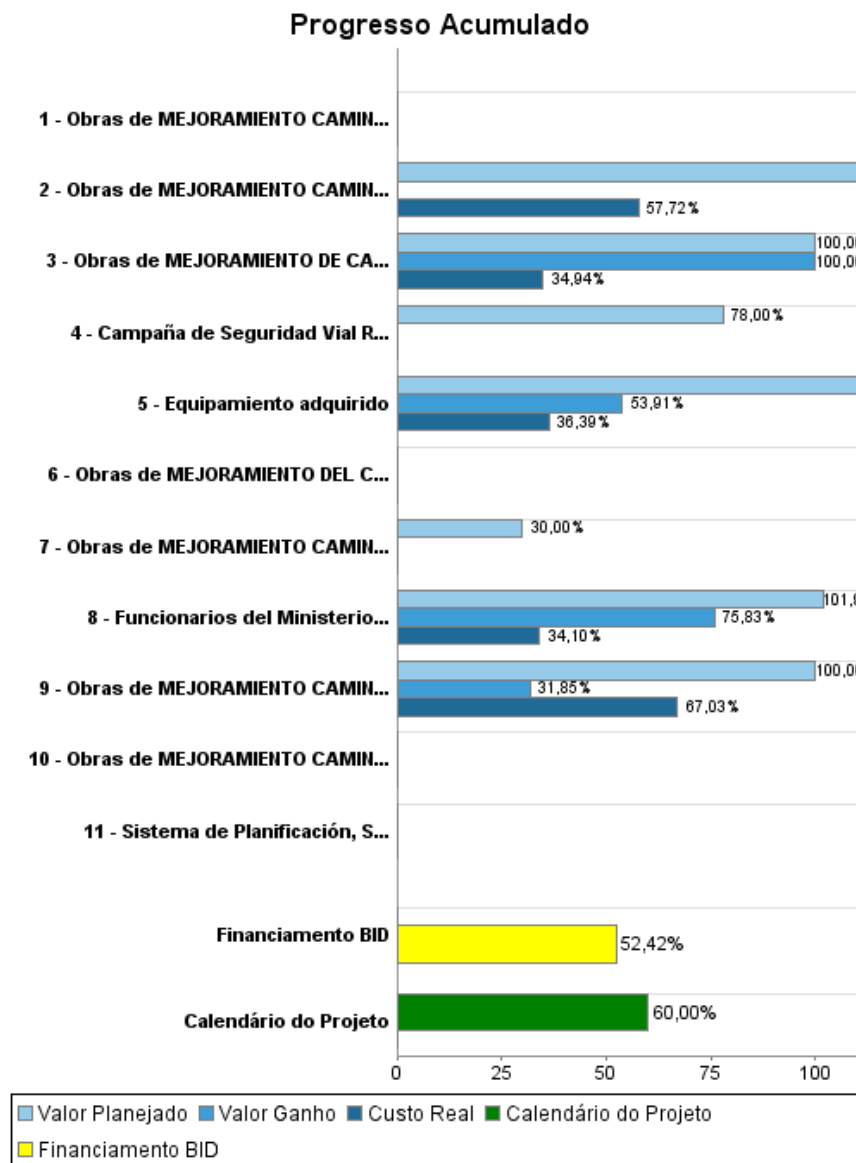

Resultados

Resultado:	Costo de Transporte reducido
Observações:	Se definirán los valores de los indicadores una vez finalizado el Estudio de Factibilidad Económica; Valorar meta para primer año de habilitación de las obras de mejora; Transitabilidad permanente para primer año de las obras

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0,59	2011	P A	0,40
Velocidad para los Usuarios de Automóviles	Km/h	24,70	2011	P A	50,00
Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5,93	2011	P A	3,50
Velocidad para los Usuarios de Autobuses	Km/h	22,70	2011	P A	45,00
Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3,19	2011	P A	2,15
Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	Km/h	22,70	2011	P A	45,00

Resultado:	Acceso a través de los caminos rurales mejorado
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Días de intransitabilidad o con restricciones severas al tránsito a través de los caminos	Días		2011	P A	

Resultado:	Calidad de la red de caminos rurales incrementada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Caminos con un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 3 m/km, dotados de drenajes y de dispositivos de seguridad	Km		2011	P A	61,26

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I: Obras de Vialidad Rural y su Supervisión									
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB31N, TRAMO:SAN PABLO TACACHICO - CANTON SAN ISIDRO, LA LIBERTAD ejecutadas	Kilómetros	12,07			12,07	4.010.269,22	2.070.380,05		5.884.111,74
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CHA25N, TRAMO: NUEVA CONCEPCIÓN - LD. LA LIBERTAD, CHALATENANGO ejecutadas	Kilómetros	9,42			9,42	4.103.123,47	2.368.321,90		4.103.123,47
Obras de MEJORAMIENTO DE CAMINO TERCARIO LIB22S: Et. LIB05W (Dv. COMASAGUA) - Dv. LIB18S (CHILTIUPAN). LA LIBERTAD ejecutadas	Kilómetros	9,58	9,58		9,58	4.033.738,89	218.494,80		5.864.381,57
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAM33, TRAMO CANTON SAN ANTONIO-CANTON EL CARRIZAL DEP.SAN MIGUEL-MORAZAN ejecutadas	Kilómetros				7,00				3.945.098,08
Obras de MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MOR13W TRAMO SAN SIMON-SAN ISIDRO, DEP. MORAZAN ejecutadas	Kilómetros				3,50				1.972.549,55
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAZ18W/PAZ21S, TRAMO ENTRE VERAPAZ Y MERCEDES LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	Kilómetros				8,33				3.238.168,41
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE, ejecutadas	Kilómetros				14,32	2.292.770,15			7.642.567,18
Componente II: Fortalecimiento Institucional									
Sistema de Planificación, Supervisión y Evaluación de Impacto implantado	Sistema				1,00				400.000,00
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) capacitados	Funcionarios	200,00	238,00		548,00	119.000,00	67.347,61		200.000,00
Equipamiento adquirido	Unidades	118,00			256,00	225.020,38			650.000,00
Campaña de Seguridad Vial Rural ejecutada	Campaña	2,00			7,00	60.000,00			200.000,00
Costo y Financiamiento									
Administración y Auditoria	N/A					150.000,00	61.098,60		600.000,00
Costos sin asignación	N/A								300.000,00
TOTAL						14.993.922,11	4.785.642,96		35.000.000,00
