


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1258	Chief of Operations Validation Date	04/28/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/01/23
Last Update	03/28/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Water and Sanitation Services Development Program – Belgrano Plan	Loan Number	4312/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , MINISTERIO DEL INTERIOR	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	CEVALLOS VAREA, MARCO ANTONIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las obras en ejecución cuentan con un programa de comunicación y con un mecanismo de quejas y reclamos que garantiza el involucramiento de las partes tanto afectadas como interesadas. Dentro del procedimiento se incluye la instalación de buzones en los obradores, cartelería con email en cada uno de los frentes de obra y acercamiento con folletería casa por casa de los frentistas. A su vez cuentan con una planilla que permite realizar y conocer el seguimiento dado a cada consulta, queja o reclamo. Sin embargo, se identificó la necesidad de fortalecer el equipo socioambiental del subejecutor en terminos sociales y de higiene y seguridad dado la cantidad de proyectos que inspeccionan y dada la necesidad de mejorar aspectos de higiene y seguridad como son la señalización y la instalación de vestuarios y áreas de comedor en obra.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1258	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	45,070,169	22.54%	154,929,831
Aggregated	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	45,070,169	22.54%	154,929,831
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

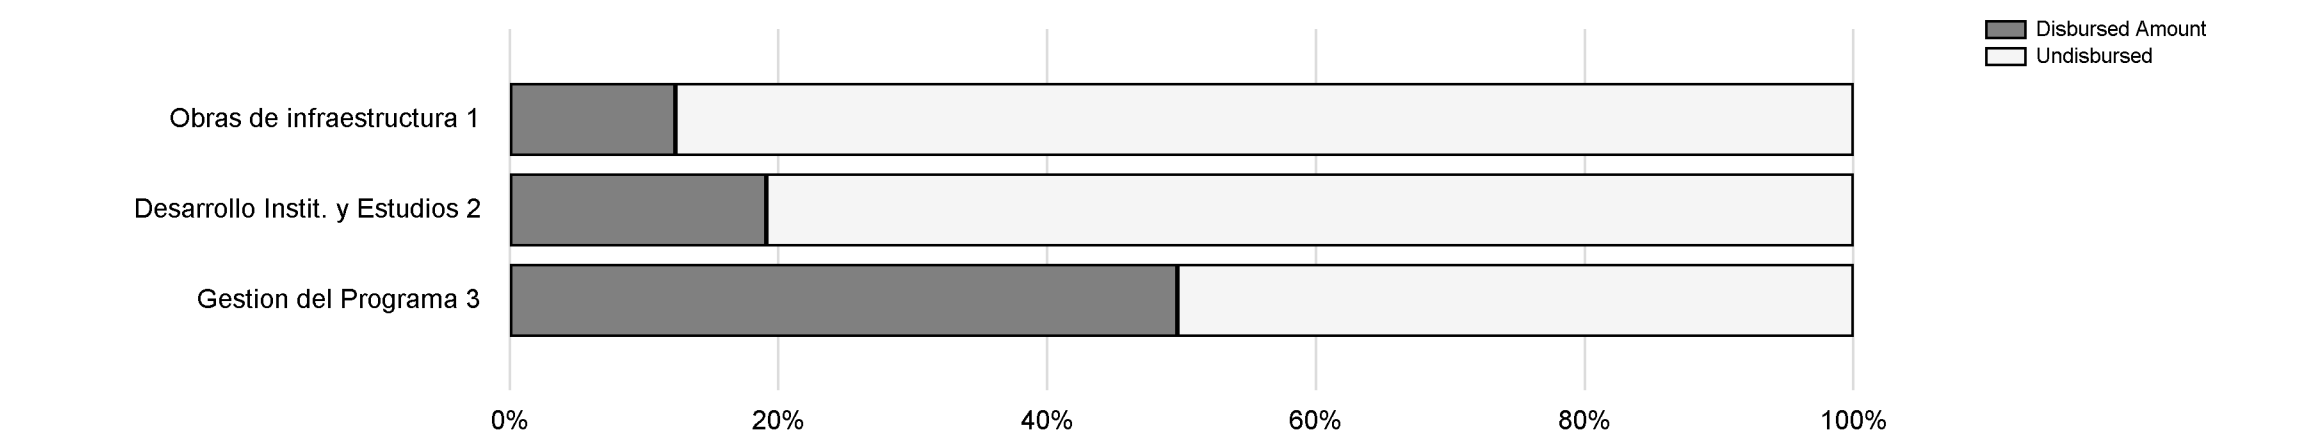

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejora de la Salud y el Bienestar de la Población

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
0.0	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	3415	2017	2023	P	2,732
						A	3,415

Details

Means of Verification: Boletín integrado de vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

Observations: Ninguna

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX															
Specific Development Objectives															
Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado 1: Cobertura del servicio de agua potable ampliada															
Observation:															
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	Hogares con nuevo acceso a sistemas de agua potable por red en la región del Plan Belgrano.	# of households	0	2017	P	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	1,500
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Details															
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto															
Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente															
Evaluation Methodology: -															
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)										
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.1	Cobertura de agua potable en la región del Plan Belgrano.	%	92.4	2010	P	-	-	-	-	-	-	92.47	-	-	92.47
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Details															
Means of Verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC															
Observations:															
Evaluation Methodology: -															
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator											
Specific Development Objectives Nbr. 1: Resultado 2: Cobertura del servicio de saneamiento ampliada															
Observation:															
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Hogares con acceso a nuevas redes cloacales en la región del Plan Belgrano	# of households	0	2016	P	-	-	-	-	8,750	5,750	14,500	-	-	29,000
					A	-	-	-	-	24,241	4,770	-	-	-	-
Details															
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto;															
Observations: se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente															
Evaluation Methodology: -															
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)										
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la región del Plan Belgrano	Households (#)	100000	2017	P	-	-	-	200,000	19,000	-	-	-	-	219,000
					A	-	-	-	-	4,762	280	-	-	-	-
Details															
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto															
Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente.															
Evaluation Methodology: -															
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Households with wastewater treatment (#) ()										

1.2	Cobertura de saneamiento en la región del Plan Belgrano.	%	46.7	2010	P	-	-	-	-	48.14	-	-	-	-	48.14
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Details															
Means of Verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC															
Observations:															
Evaluation Methodology: -															
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator											
Specific Development Objectives Nbr. 2: Resultado 3: Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados															
Observation:															

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Obras de infraestructura

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Sistemas de agua potable construidos	Sistema	P	1	1	2,470,962	15,000,000
			P (a)	-	1	1,339,699	15,000,000
			A	-	-	-	-
1.02	Sistemas de Saneamiento Construidos	Sistema	P	-	5	19,061,732	232,000,000
			P (a)	3	10	51,950,337	232,000,000.04
			A	3.57	4.57	26,009,510	30,588,748.74

Component Nbr. 2 Componente 2: Desarrollo institucional y estudios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	Actividades realizadas por los prestadores priorizadas en los Planes de Gestión por Resultados	No. de Planes	P	-	4	-	5,325,000
			P (a)	-	4	-	5,655,899.44
			A	-	2	-	5,655,899.44
2.02	Micromedidores instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de micromedidores	P	937	25,000	50,000	9,675,000
			P (a)	12,969	12,000	1,537,499.56	9,241,671
			A	-	-	-	-
2.03	Macromedidores instalados en la región del Plan Belgrano	No. de macromedidores	P	42	160	1,312,500	5,000,000
			P (a)	92	66	3,006,250	4,990,437
			A	-	-	-	-
2.04	Estudio de pre-inversión realizado	cantidad	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	111,992
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administracion del programa	P	300,000	1,500,000
		P (a)	307,766.55	2,139,792.52
		A	701,402	1,586,067.2
	Monitoreo, Evaluación y Auditorías	P	300,000	1,500,000
		P (a)	630,563.7	860,208
		A	92,502	338,636
Total Cost				
	Total Cost	P	23,495,194	270,000,000
		P (a)	58,772,115.81	270,000,000
		A	26,803,414	38,169,351.38

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Estudio de pre-inversión realizado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RCASTELLO	3/20/2023
	Macromedidores instalados en la región del Plan Belgrano	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RCASTELLO	3/20/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	RCASTELLO	3/20/2023
	Micromedidores instalados en la región del Plan Belgrano.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RCASTELLO	3/28/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	RCASTELLO	3/20/2023
	Sistemas de Saneamiento construidos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RCASTELLO	3/20/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	RCASTELLO	3/20/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Sustainability
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	2	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Planning
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Inactive		Organizational Structure		
	Response Actions				
	4	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
5	Inactive		Social Environment		
	Response Actions				
	5	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Sustainability
	Response Actions		
	6	Management Strategy	Status

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
