


PMR Public Report

Operation Number	UR-L1094	Chief of Operations Validation Date	03/31/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	03/31/23
Last Update	03/30/23	Country Representative Validation Date	04/13/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Ciudad de la Costa-west area Sanitation Project	Loan Number	3258/OC-UR, 3259/CH-UR
Executing Agency	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	BASANI, MARCELLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Deben mejorarse las condiciones de orden y limpieza en el obrador de la contratista, y también debe mejorarse los vallados y señalizaciones en los sectores de obra y desvíos peatonales. En los reportes de la contratista no se incluye suficiente información respecto a quejas y reclamos.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1094	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	63,700,000	84.93%	11,300,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	63,700,000	84.93%	11,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

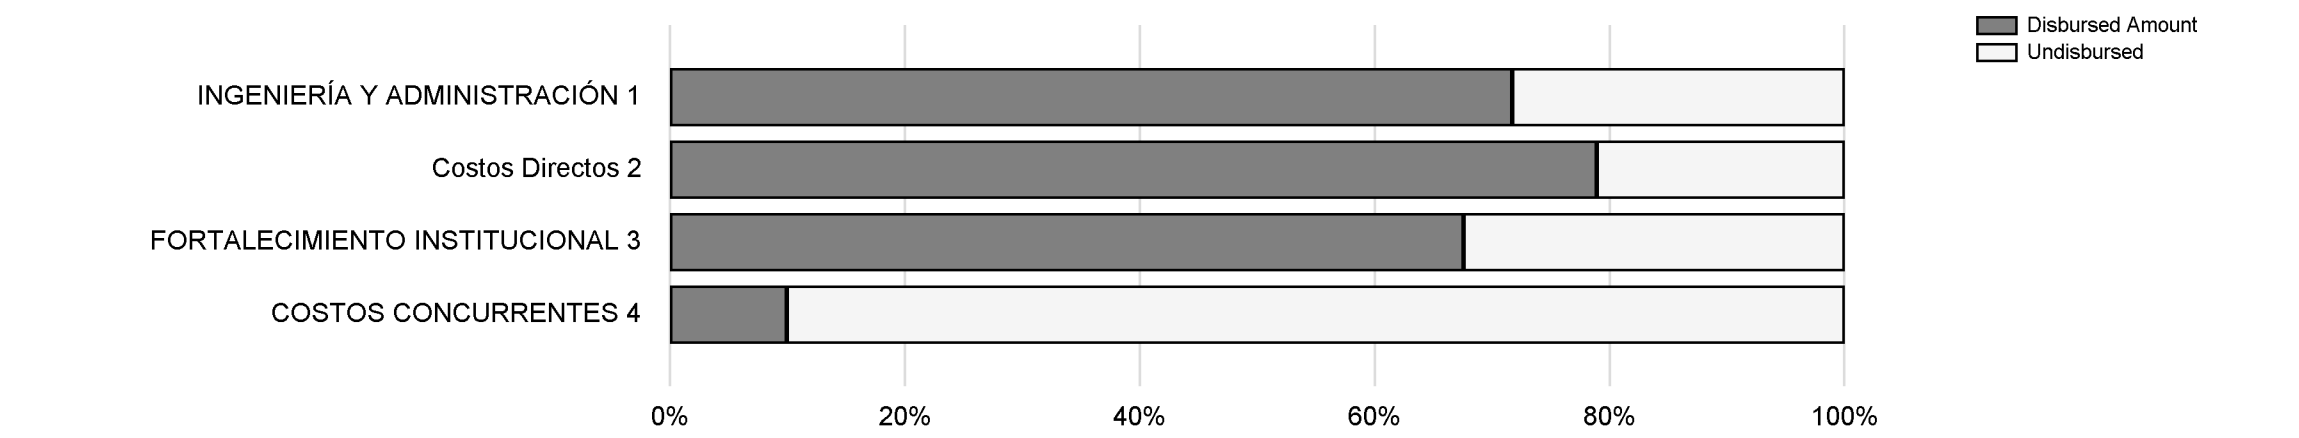

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX																	
Specific Development Objectives																	
Specific Development Objectives Nbr. 0: Ampliar la cobertura de saneamiento por redes en la zona oeste de CdC																	
Observation:																	
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.0	Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en la zona oeste de Ciudad de la Costa	# of households	0	2014	P	-	-	600	1,000	750	700	1,285	-	-	-	-	4,335
					A	-	-	-	-	367	595	1,005	674	471	-	-	3,112
Details																	
Means of Verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE																	
Observations:																	
Evaluation Methodology: -																	
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.1	Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa	Households (#)	0	2014	P	-	-	600	1,000	750	700	1,285	-	-	-	-	4,335
					A	-	-	-	-	367	595	1,005	674	471	-	-	-
Details																	
Means of Verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE																	
Observations:																	
Evaluation Methodology: -																	
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Households with wastewater treatment (#) ()												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.2	Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en las zonas limítrofes de Ciudad de la Costa Oeste	# of households	0	2019	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	867	871	390	350	240	-	-	2,718
Details																	
Means of Verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE.																	
Observations:																	
Evaluation Methodology: -																	
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator													
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.3	Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en las zonas limítrofes de Ciudad de la Costa Oeste	Households (#)	0	2019	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	867	871	390	350	240	-	-	2,718
Details																	
Means of Verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE.																	
Observations:																	
Evaluation Methodology: -																	
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator													
Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad y la eficiencia operativa del servicio de agua potable en la zona oeste y central de CdC																	
Observation:																	

Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Agua no contabilizada en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	l/conexion/dia	365	2014	P	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	150
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Details																	
Means of Verification: Balances de agua realizados por la Gerencia de Agua no contabilizada-OSE																	
Observations:																	
Evaluation Methodology: -																	
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator													
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Hogares con conexiones de agua mejoradas en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	# of households	0	2014	P	-	379	1,904	2,444	1,523	450	300	-	-	-	-	7,000
					A	-	206	4,987	2,910	929	1,414	6,443	6,709	-	-	-	-
Details																	
Means of Verification: Cantidad de conexiones sustituidas según certificados de obra Responsable: gerencia de Obras-OSE																	
Observations:																	
Evaluation Methodology: -																	
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)												
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.2	Número de roturas de la red en la zona central y oeste de Ciudad de la Costa	numero/km/año	8	2014	P	-	-	-	-	-	-	.9	-	-	-	-	.9
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Details																	
Means of Verification: Numero de arreglos de roturas registrados por la Gerencia del área metropolitana-OSE																	
Observations:																	
Evaluation Methodology: -																	
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator													
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.3	Hogares con conexiones de agua mejoradas en las zonas limitrofes de Ciudad de la Costa Oeste	# of households	0	2019	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-	-	249
Details																	
Means of Verification: Cantidad de conexiones sustituidas según certificados de obra. Responsable: gerencia de Obras-OSE.																	
Observations:																	
Evaluation Methodology: -																	
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator													
Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecer al operador con las capacidades necesarias para operar y mantener el sistema de saneamiento de CdC																	
Observation:																	
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Sistemas operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño	Sistemas	0	2014	P	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Details																	
Means of Verification: Cumplimiento de los niveles de tratamiento de las aguas residuales en la Planta de Tratamiento y de disposición final en el Rio de la Plata																	

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras de saneamiento en Ciudad de la Costa – zona oeste

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Estaciones de bombeo construidas en ciudad de la costa zona oeste	Numero	P	-	7	-	7,800,000
			P (a)	-	5	2,390,000	5,142,000
			A	-	2	214,000	5,067,000
1.02	Interceptor costero construido	Metros	P	-	2,165	-	2,000,000
			P (a)	-	2,264	-	1,150,000
			A	-	2,264	-	1,150,000
1.03	Redes de Saneamiento construidas en ciudad de la costa zona oeste	Metros	P	-	97,515	-	41,500,000
			P (a)	-	84,762	4,525,000	23,681,000
			A	-	78,981	415,000	21,231,000
1.04	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa zona oeste	Numero	P	-	-	-	-
			P (a)	365	3,311	372,000	1,240,000
			A	365	2,711	196,000	906,000
1.05	Estaciones de bombeo construidas en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste	Numero	P	-	-	-	-
			P (a)	-	8	-	2,178,000
			A	-	2	410,000	789,000
1.06	Redes de Saneamiento construidas en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste	Numero	P	-	-	-	-
			P (a)	22,737	44,363	-	8,579,000
			A	22,737	35,962	3,223,000	6,359,000
1.07	Conexiones de saneamiento en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste	Numero	P	-	-	-	-
			P (a)	306	2,789	-	945,000
			A	306	2,789	165,000	945,000

Component Nbr. 2 Obras de agua potable en Ciudad de la Costa-zona oeste y central

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas en ciudad de la costa zona oeste y central	Metros	P	-	122,261	-	10,200,000
			P (a)	16,478	193,668	2,036,000	20,732,000
			A	16,478	192,428	214,000	20,292,000
2.02	Redes de distribución de agua potable en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste y central	Metros	P	-	-	-	-
			P (a)	9,191	19,859	-	3,203,000
			A	9,191	19,485	1,686,000	2,518,000
2.03	Troncal agua potable cuarta línea de bombeo	Metros	P	-	-	-	-
			P (a)	-	3,750	-	5,483,000
			A	834	834	2,222,000	2,222,000

Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa	Personas	P	-	40	-	200,000
			P (a)	-	69	-	22,600
			A	-	69	-	22,600
3.02	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado	reportes	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	136,000
			A	-	1	-	136,000

Other Cost				
	Gastos de unidad ejecutora y Administrativos	P		13,300,000
		P (a)	300,000	2,533,000
		A	354,000	1,863,000
	Imprevistos	P		0
		P (a)		0
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	75,000,000
		P (a)	9,623,000	75,024,600
		A	9,099,000	63,500,600

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Physical Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa zona oeste	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Financial Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Output name	NICOLASRE	3/10/2023
	Conexiones de saneamiento en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste	Create Output	N/A	NICOLASRE	3/10/2023
		Modify Output	Modify Financial Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Physical Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
	Estaciones de bombeo construidas	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
	Estaciones de bombeo construidas en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste	Create Output	N/A	NICOLASRE	3/10/2023
		Modify Output	Modify Financial Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Physical Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Financial Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
	Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Financial Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NICOLASRE	3/10/2023
	Redes de distribución de agua potable en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste y central	Create Output	N/A	NICOLASRE	3/10/2023
		Modify Output	Modify Financial Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Physical Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas en ciudad de la costa zona oeste y central	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Financial Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Output name	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Unit of Measure	NICOLASRE	3/10/2023
	Redes de Saneamiento construidas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Financial Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Physical Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
	Redes de Saneamiento construidas en ciudad de la costa zona oeste	Modify Output	Modify Output name	NICOLASRE	3/13/2023
	Redes de Saneamiento construidas en las zonas limitrofes de ciudad de la costa zona oeste	Create Output	N/A	NICOLASRE	3/10/2023
		Modify Output	Modify Financial Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
			Modify Physical Historical Actual	NICOLASRE	3/10/2023
	Troncal agua potable cuarta línea de bombeo	Create Output	N/A	NICOLASRE	3/10/2023
Specific Development Objective	Hogares con conexiones de agua mejoradas en las zonas limitrofes de Ciudad de la Costa Oeste	Create Specific Development Objective Indicator	N/A	CECILIAVID	3/29/2023
	Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en las zonas limitrofes de Ciudad de la Costa Oeste	Create Specific Development Objective Indicator	N/A	CECILIAVID	3/29/2023
	Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en las zonas limitrofes de Ciudad de la Costa Oeste	Create Specific Development Objective Indicator	N/A	CECILIAVID	3/29/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy	
1	Active		Planning	
	Response Actions			
	1.01	Management Strategy	Status	
		ENHANCE	ACTIVE	
	1.02	Management Strategy	Status	
		ENHANCE	ACTIVE	
	1.03	Management Strategy	Status	
		ENHANCE	ACTIVE	
	1.04	Management Strategy	Status	
		AVOID	ACTIVE	
	1.05	Management Strategy	Status	
ENHANCE		ACTIVE		

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	2.01	Management Strategy		Status	
		ENHANCE		ACTIVE	
	2.02	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	2.03	Management Strategy		Status	
		AVOID		ACTIVE	
	2.04	Management Strategy		Status	
		AVOID		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Inactive		Planning		
	Response Actions				
	3.01	Management Strategy		Status	
		AVOID		ACTIVE	
	3.02	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	3.03	Management Strategy		Status	
		ENHANCE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	4.01	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	5	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	6	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	7.01	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	7.02	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	7.03	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	7.04	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	7.05	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	7.06	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Social Environment
	Response Actions		
	8	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	9.01	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Monitoring & Evaluation
