
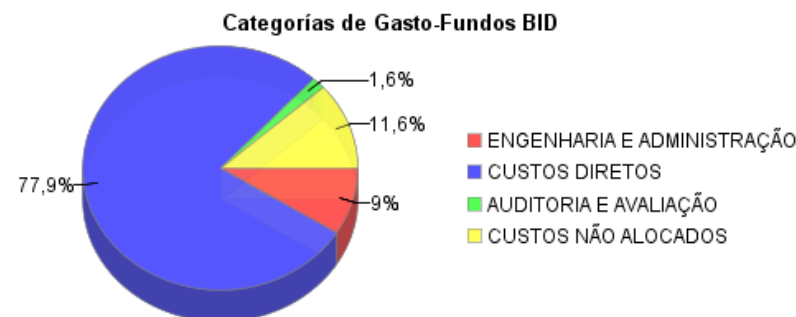
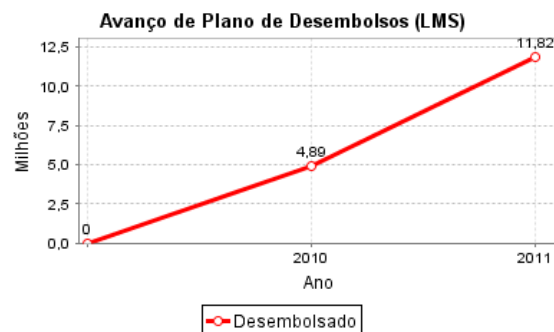



## Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO		
Sector: WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número da Operação: 1979/OC-BR	Atual: 83.270.000,00	Original BID: 83.270.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 7.554.995,59	Corrente BID: 83.270.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 9,07	Pari-passu: 49,00
Operação Relacionada:	Saldo: 75.715.004,41	Cofinanciamento/País: 85.804.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 169.074.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 30, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011

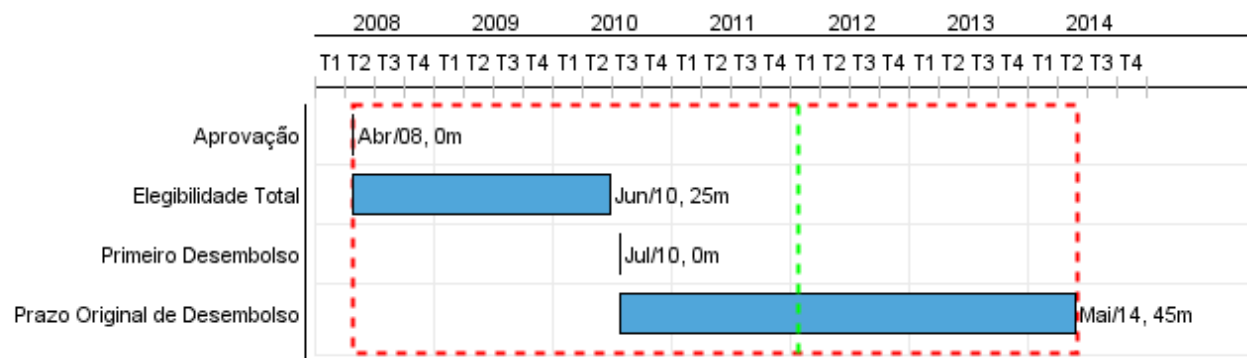

## Progresso Acumulado até 2011

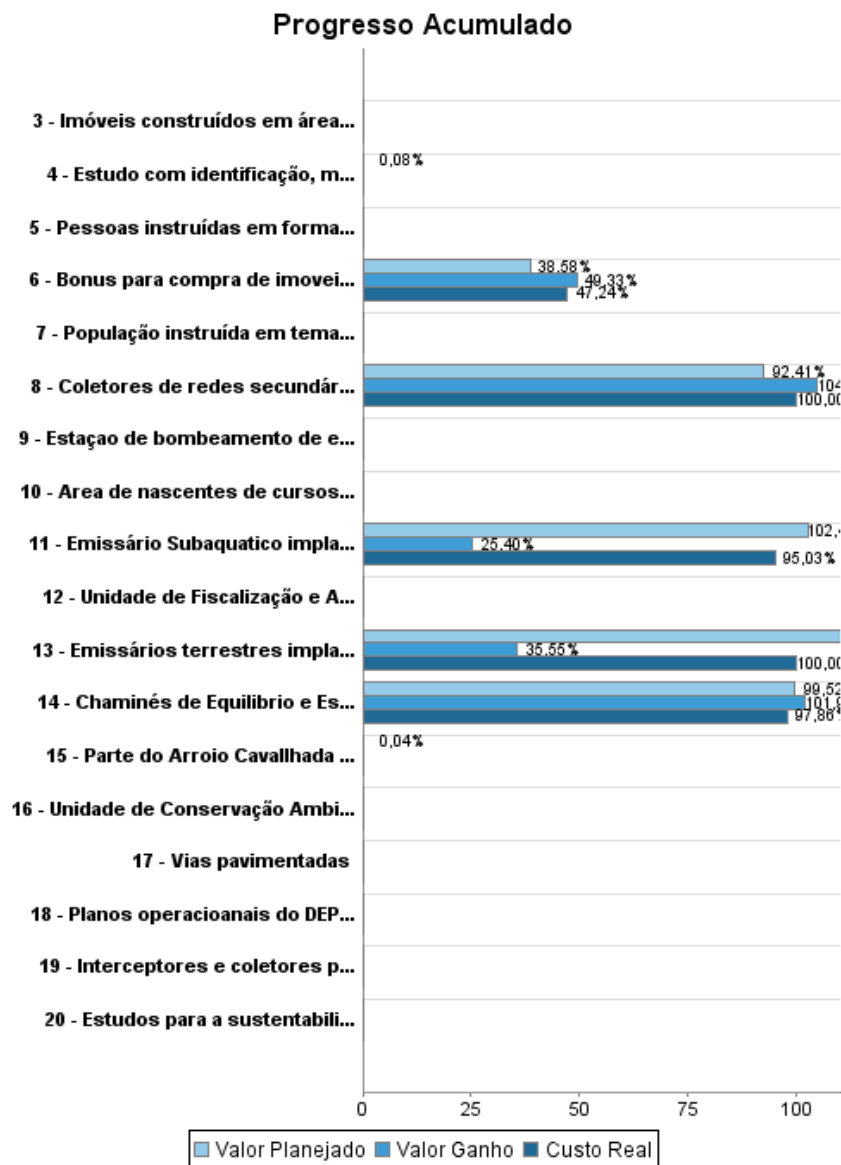

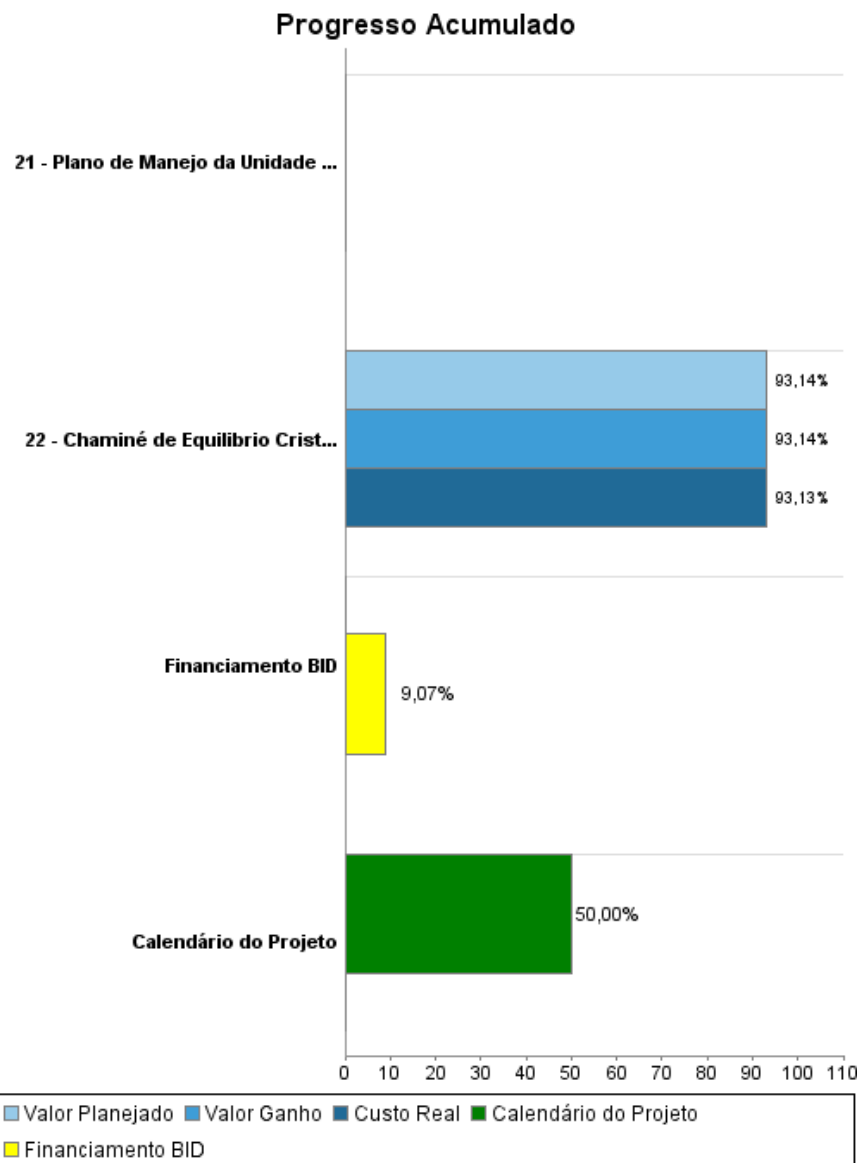

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Qualidade da Água do Lago Guaíba melhorada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2012	Final do Projeto
Concentração de Oxigênio Dissolvido ( OD) no ponto de coleta Estação 46	mg/l	7,46	2008	P A			8,80
Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 50	mg/l	7,70	2008	P A			8,80
Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigenio) no ponto de coleta Estação 46	mg O2/l	0,60	2008	P A			5,00
Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigenio) no ponto de coleta Estação 50	mg O2/l	1,20	2008	P A			5,00
Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 50	NMP/100ml	3.400,00	2008	P A	2.000,00	1.900,00	150,00
Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 46	NMP/100ml	20.000,00	2008	P A			150,00

<b>Resultado:</b>	Risco de inundações reduzido
-------------------	------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2012	Final do Projeto
Areas de inundação ao longo do Rio Cavalhada, para um evento de recorrência de 10 anos	km2	0,66	2008	P A	0,66	0,66	0,00
Famílias reassentadas fora de áreas de risco	famílias	195,00	2008	P A			1.680,00

<b>Resultado:</b>	Qualidade ambiental urbana melhorada
-------------------	--------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2012	Final do Projeto
Areas de protecao ambiental e de lazer	hectares		2008	P A			30,00

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Qualidade de água</b>									
Coletores de redes secundárias construídos ( Sistema Cavallhada)	km	1.908,00	4.321,00		63.500,00	3.159.000,00	3.159.000,00		18.301.000,00
Emissários terrestres implantados	m	8.400,00	6.025,00		9.500,00		2.113.000,00		17.180.000,00
Emissário Subaquático implantado	m	7.634,00	3.605,00		11.000,00	12.280.000,00	11.502.000,00		31.502.000,00
Chaminés de Equilíbrio e Estação de Bombeamento Ponta da Cadeia concluídos	chaminé				1,00	128.000,00			5.984.000,00
Chaminé de Equilíbrio Cristal e Estações de Bombeamento -EBEs C2 e Cristal	chaminé	2,00	2,00		3,00	7.461.000,00	6.801.000,00		9.602.000,00
<b>Desenvolvimento Urbano</b>									
Parte do Arroio Cavallhada canalizado	m				1.900,00				7.942.000,00
Estação de bombeamento de esgotos construída e reabilitada	Estações				2,00				3.593.000,00
Interceptores e coletores pluviais implantados	m				4.300,00				5.770.000,00
Vias pavimentadas	m				1.520,00				2.557.000,00
Bonus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas.	bonus	70,00	67,00		840,00	1.745.000,00	1.572.000,00		18.648.000,00
Imóveis construídos em áreas urbanizadas para o reassentamento da população	imóveis				840,00				18.648.000,00
Pessoas instruídas em formação profissional	pessoas				1.680,00				1.500.000,00
<b>Gestão Urbana e Proteção Ambiental</b>									
Estudo com identificação, mapeamento e avaliação de áreas municipais com riscos ambientais elaborado.	km2				51,00				265.000,00
Parque linear implantado	Parque				1,00				1.935.000,00
Área de nascentes de cursos de água protegidas	Áreas				4,00				53.000,00
Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro criada.	Unidade de Conservação				1,00				746.000,00
Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Morro São Pedro elaborado.	Plano				1,00				60.000,00
Unidade de Fiscalização e Administração do Morro São Pedro implantada	Unidade de Fiscalização				1,00				1.044.000,00
População instruída em temas de educação sanitária e ambiental	pessoas				1.500,00				110.000,00
<b>Fortalecimento Institucional</b>									
Estudos para a sustentabilidade financeira do DMAE e DEP ( reforma tarifária DMAE, recuperação de custos DEP e sistema contábil DMAE e DEP) elaborados	Estudos				2,00				1.337.000,00

# RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1081 - Programa Integrado Sócio-Ambiental de Porto Alegre  
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento  
Última Atualização do PMR: 29/09/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Estudo para a implementação de Agencia de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento.	Estudo				1,00				322.000,00
Planos operacioanais do DEP, DEMHAB, SMOV, SMAM, SMCPGL desenvolvidos	Planos				5,00				341.000,00
<b>Engenharia e Administração e outros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>24.773.000,00</b>	<b>25.147.000,00</b>		<b>147.440.000,00</b>
