
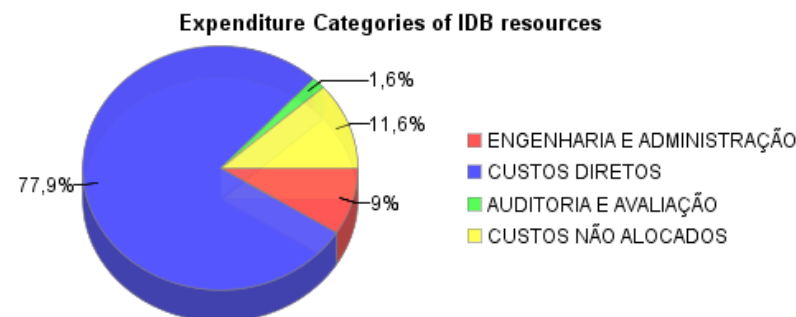
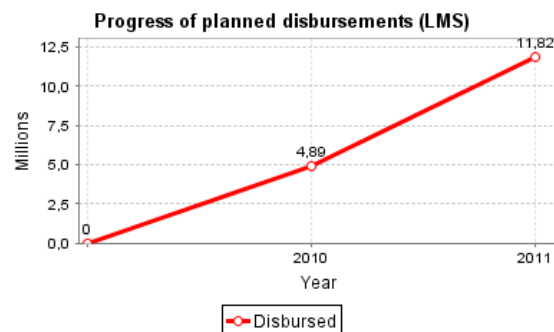



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO				
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Loan Number(s):	1979/OC-BR	Current Approved Amount:	83.270.000,00	Original IDB:	83.270.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	7.554.995,59	Current IDB:	83.270.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	9,07	Pari-passu:	49,00
Related Operation(s):		Balance:	75.715.004,41	Co-Financing/Country:	85.804.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	169.074.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 30, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011

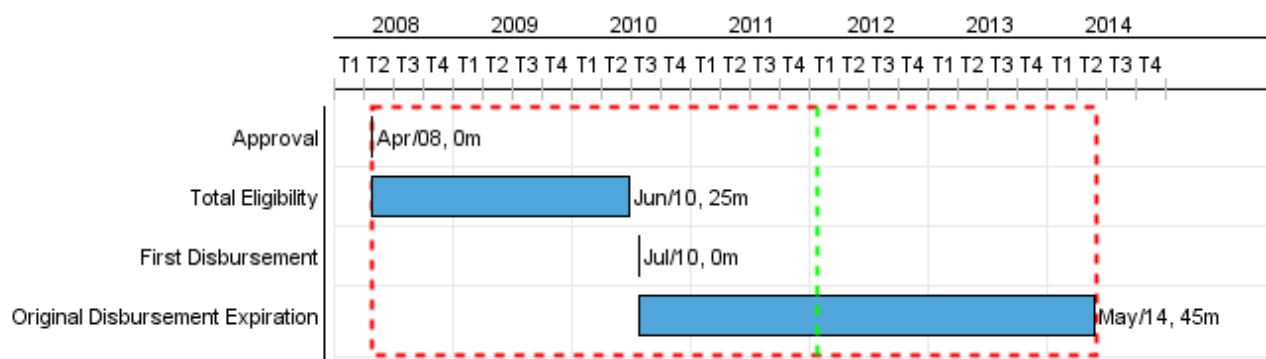


Accumulated Progress as of 2011

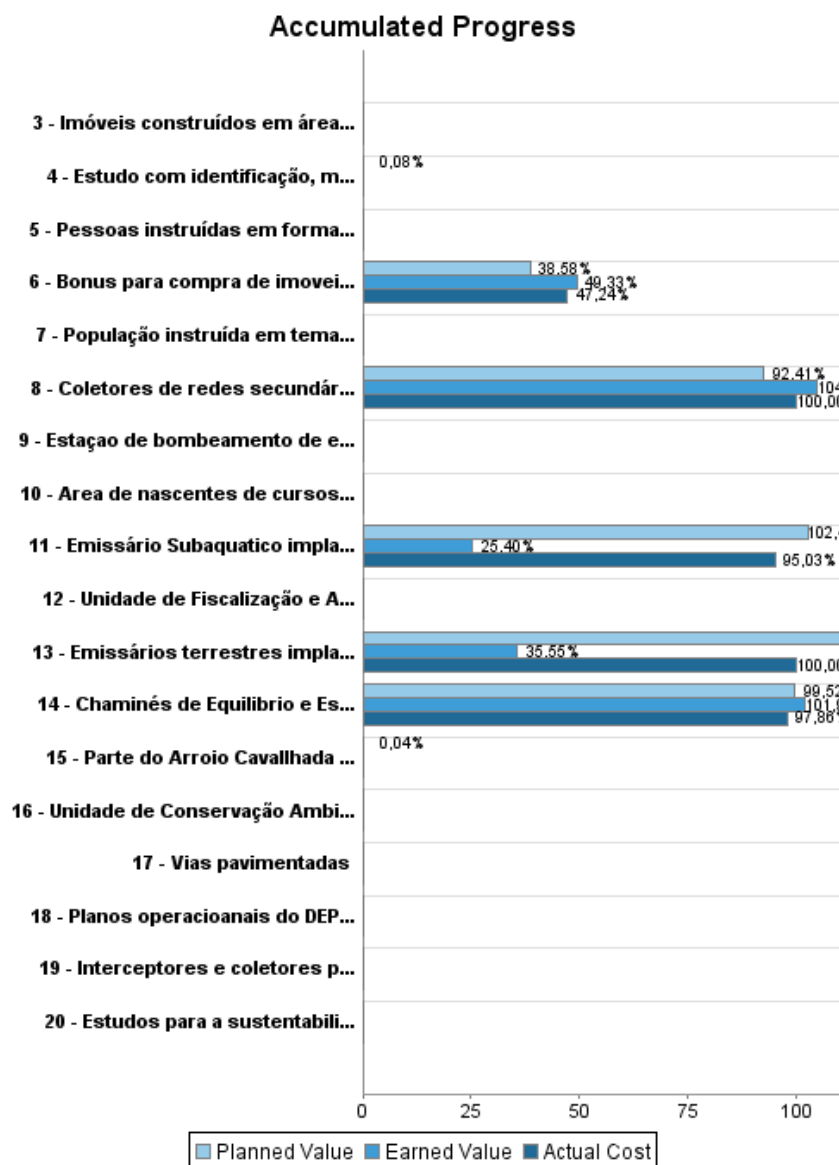

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1081 - Porto Alegre Integrated Socio Environmental Program
2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Accumulated Progress

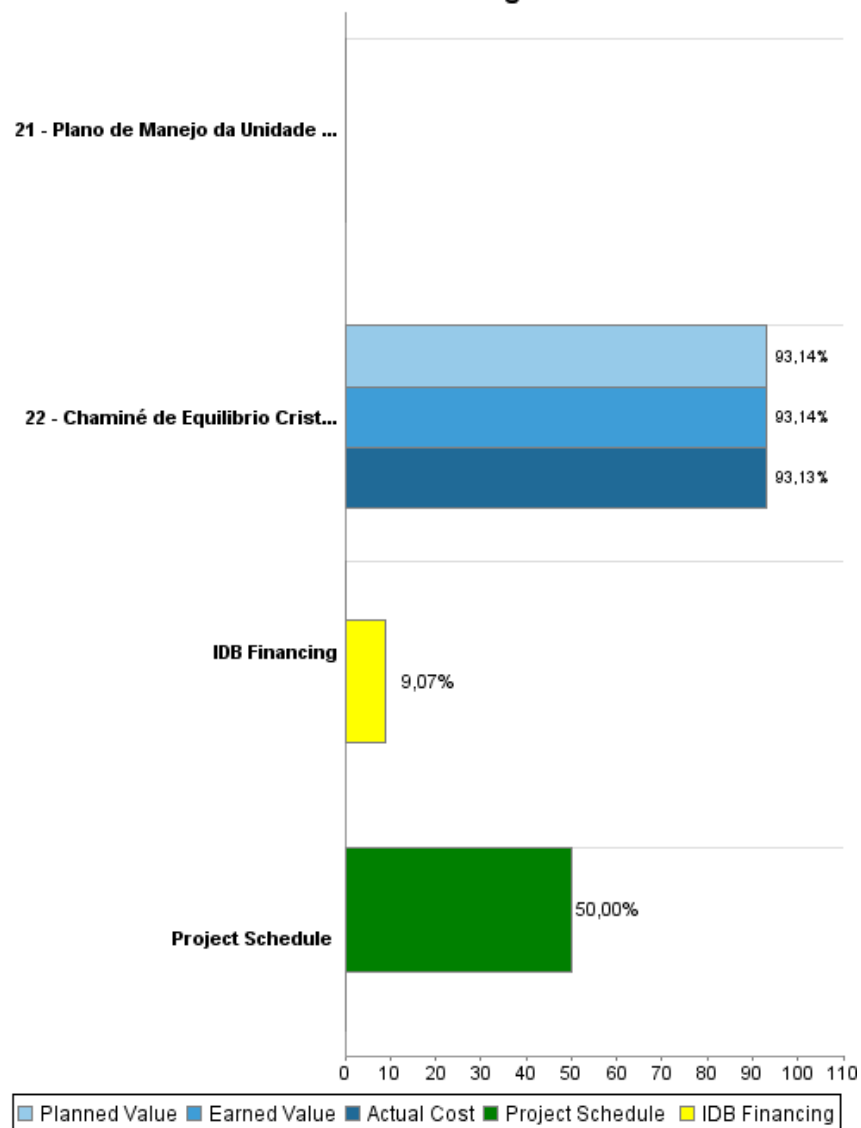

Outcomes

Outcome:	Qualidade da Agua do Lago Guaiba melhorada
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	End of project
Concentração de Oxigenio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 46	mg/l	7,46	2008	P A			8,80
Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 50	mg/l	7,70	2008	P A			8,80
Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigenio) no ponto de coleta Estação 46	mg O2/l	0,60	2008	P A			5,00
Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigenio) no ponto de coleta Estação 50	mg O2/l	1,20	2008	P A			5,00
Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 50	NMP/100ml	3.400,00	2008	P A	2.000,00	1.900,00	150,00
Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 46	NMP/100ml	20.000,00	2008	P A			150,00

Outcome:	Risco de inundações reduzido
-----------------	------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	End of project
Areas de inundação ao longo do Rio Cavalhada, para um evento de recorrência de 10 anos	km2	0,66	2008	P A	0,66	0,66	0,00
Familias reassentadas fora de áreas de risco	famílias	195,00	2008	P A			1.680,00

Outcome:	Qualidade ambiental urbana melhorada
-----------------	--------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	End of project
Areas de protecao ambiental e de lazer	hectares		2008	P A			30,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Qualidade de agua									
Coletores de redes secundárias construídos (Sistema Cavallhada)	km	1.908,00	4.321,00		63.500,00	3.159.000,00	3.159.000,00		18.301.000,00
Emissários terrestres implantados	m	8.400,00	6.025,00		9.500,00		2.113.000,00		17.180.000,00
Emissário Subaquático implantado	m	7.634,00	3.605,00		11.000,00	12.280.000,00	11.502.000,00		31.502.000,00
Chaminés de Equilíbrio e Estação de Bombeamento Ponta da Cadeia concluídos	chaminé				1,00	128.000,00			5.984.000,00
Chaminé de Equilíbrio Cristal e Estações de Bombeamento -EBEs C2 e Cristal	chaminé	2,00	2,00		3,00	7.461.000,00	6.801.000,00		9.602.000,00
Desenvolvimento Urbano									
Parte do Arroio Cavallhada canalizado	m				1.900,00				7.942.000,00
Estação de bombeamento de esgotos construída e reabilitada	Estações				2,00				3.593.000,00
Interceptores e coletores pluviais implantados	m				4.300,00				5.770.000,00
Vias pavimentadas	m				1.520,00				2.557.000,00
Bonus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas.	bonus	70,00	67,00		840,00	1.745.000,00	1.572.000,00		18.648.000,00
Imóveis construídos em áreas urbanizadas para o reassentamento da população	imóveis				840,00				18.648.000,00
Pessoas instruídas em formação profissional	pessoas				1.680,00				1.500.000,00
Gestão Urbana e Proteção Ambiental									
Estudo com identificação, mapeamento e avaliação de áreas municipais com riscos ambientais elaborado.	km2				51,00				265.000,00
Parque linear implantado	Parque				1,00				1.935.000,00
Área de nascentes de cursos de água protegidas	Áreas				4,00				53.000,00
Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro criada.	Unidade de Conservação				1,00				746.000,00
Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Morro São Pedro elaborado.	Plano				1,00				60.000,00
Unidade de Fiscalização e Administração do Morro São Pedro implantada	Unidade de Fiscalização				1,00				1.044.000,00
População instruída em temas de educação sanitária e ambiental	pessoas				1.500,00				110.000,00
Fortalecimento Institucional									
Estudos para a sustentabilidade financeira do DMAE e DEP (reforma tarifária DMAE, recuperação de custos DEP e sistema contábil DMAE e DEP) elaborados	Estudos				2,00				1.337.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1081 - Porto Alegre Integrated Socio Environmental Program
2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 29/09/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Estudo para a implementação de Agencia de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento.	Estudo				1,00				322.000,00
Planos operacioanais do DEP, DEMHAB, SMOV, SMAM, MCPGL desenvolvidos	Planos				5,00				341.000,00
Engenharia e Administração e outros									
TOTAL						24.773.000,00	25.147.000,00		147.440.000,00
