
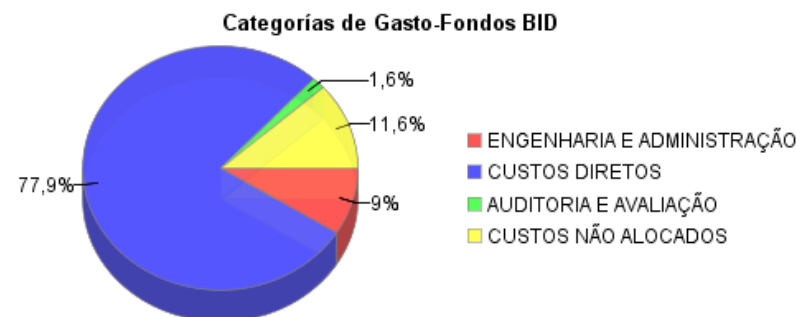
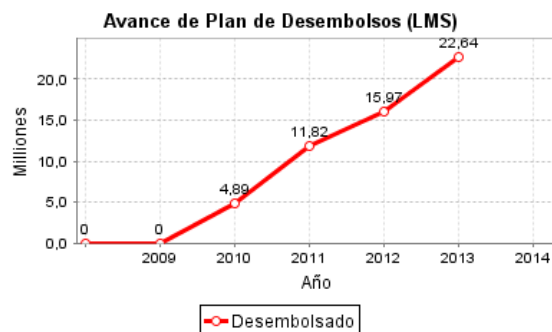



Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | | Costo total y Fuente | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | |
| Sector: | WATER AND SANITATION | | | | |
| Número(s) de Préstamo: | 1979/OC-BR | Monto Aprobado Actual: | 83.270.000,00 | BID Original: | 83.270.000,00 |
| Etapas: | Approved | Monto Desembolsado a la fecha: | 22.644.188,25 | Actual BID: | 83.270.000,00 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | % Desembolsado: | 27,19 | Pari-passu: | 49,00 |
| Operación(es) Relacionada(s): | | Saldo: | 60.625.811,75 | Co-financiamiento/País: | 85.804.000,00 |
| Subtipo de Operación: | ESP - Inversión Específica | | | Estimado Original: | 169.074.000,00 |
| | | | | Período de Amortización (meses): | 234 |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 03-oct-2013 Validado por Representante de País: 04-oct-2013 |

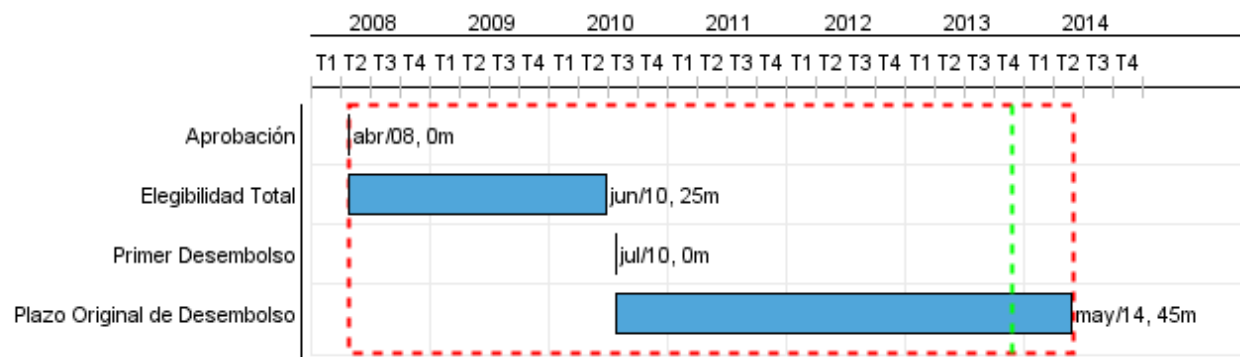


Progreso Acumulado al 2013

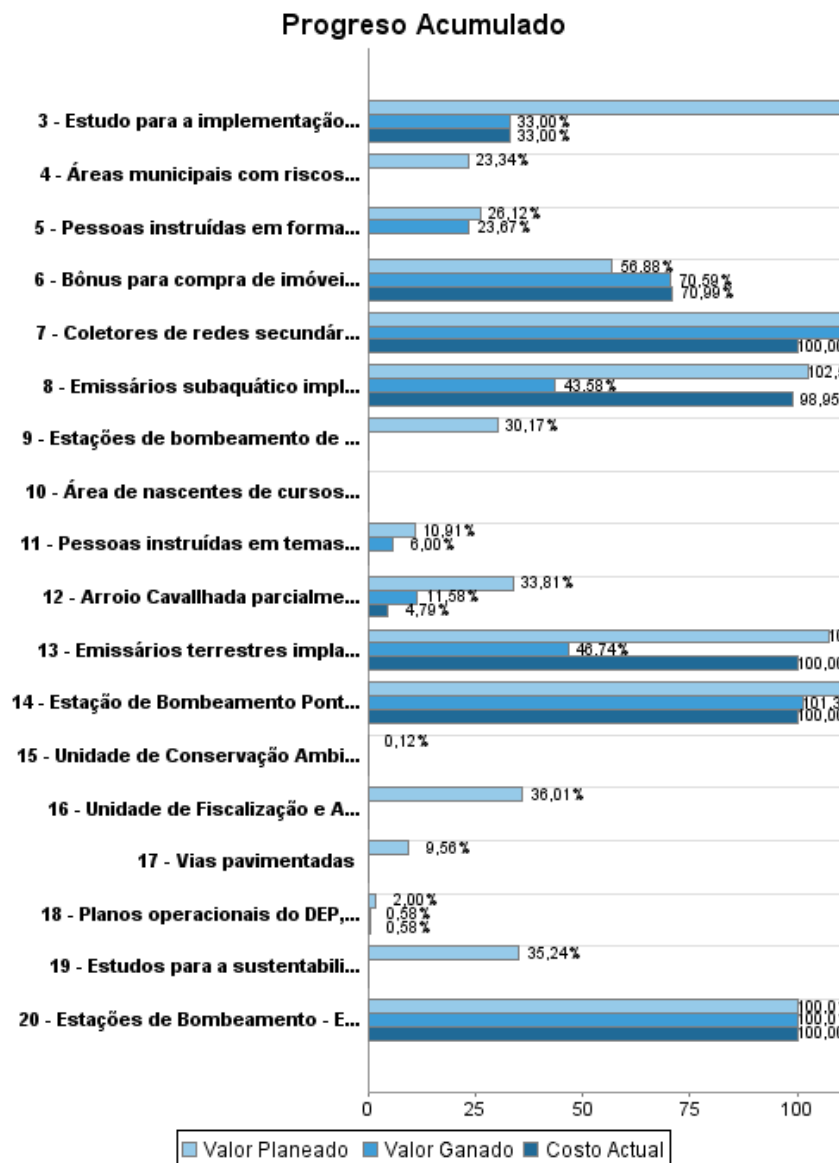

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1081 - Programa Integrado Socio-Ambiental de Porto Alegre
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Progreso Acumulado

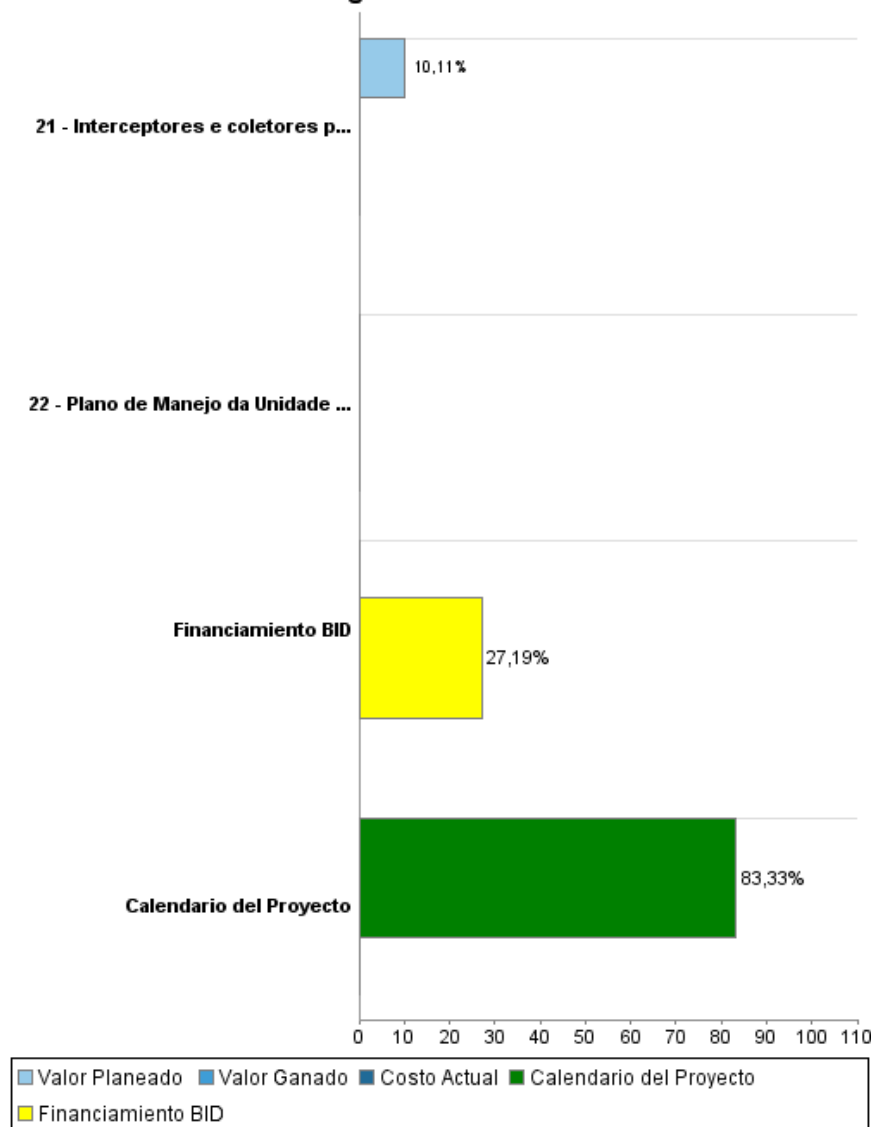

Resultados

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Qualidade da Água do Lago Guaíba melhorada |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|----------|----------------------|-----------------|
| Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 46 | mg/l | 7,46 | 2008 | P A | | | 8,80 |
| Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 50 | mg/l | 7,70 | 2008 | P A | | | 8,80 |
| Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 46 | mg O2/l | 0,60 | 2008 | P A | | | 5,00 |
| Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 50 | mg O2/l | 1,20 | 2008 | P A | | | 5,00 |
| Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 50 | NMP/100ml | 3.400,00 | 2008 | P A | 2.000,00 | 1.900,00 3.400,00 | 150,00 |
| Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 46 | NMP/100ml | 20.000,00 | 2008 | P A | | | 150,00 |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Resultado: | Risco de inundações reduzido |
|-------------------|------------------------------|

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Áreas de inundação ao longo do Rio Cavalhada, para um evento de recorrência de 10 anos | km2 | 0,66 | 2008 | P A | 0,66 | 0,66 0,66 | |
| Famílias reassentadas fora de áreas de risco | famílias | 195,00 | 2008 | P A | | | 1.680,00 |

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Resultado: | Qualidade ambiental urbana melhorada |
|-------------------|--------------------------------------|

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|-----------------|
| Áreas de proteção ambiental e de lazer | hectares | | 2008 | P A | | | 30,00 |
| Hogares cuyas aguas residuales son tratadas | domicilios | | 2013 | P A | | | 30.000,00 |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|---|-------------------------|----------|--------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Qualidade de agua | | | | | | | | | |
| Coletores de redes secundárias construídos (Sistema Cavallhada) | metro | | | | 63.500,00 | | | | 16.548.150,00 |
| Emissários terrestres implantados | metro | | | | 9.500,00 | | | | 20.764.800,00 |
| Emissários subaquático implantados | metro | | | | 11.000,00 | 415.237,68 | | | 39.043.070,00 |
| Estação de Bombeamento Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluídas | estação | | | | 1,00 | | | | 6.212.980,00 |
| Estações de Bombeamento - EBEs C2 e Cristal (Cristal com chaminés de equilibrio) concluídas | estação | | | | 3,00 | | | | 8.942.000,00 |
| Desenvolvimento Urbano | | | | | | | | | |
| Arroio Cavallhada parcialmente canalizado | metro | 420,00 | 164,00 | | 1.900,00 | 4.000.000,00 | 683.509,01 | | 15.107.000,00 |
| Estações de bombeamento de esgotos construídas | estação | | | | 2,00 | 1.068.300,00 | | | 9.805.300,00 |
| Interceptores e coletores pluviais implantados | metro | 200,00 | | | 3.976,00 | 724.000,00 | | | 7.162.300,00 |
| Vias pavimentadas | metro | | | | 2.222,00 | 300.000,00 | | | 8.968.000,00 |
| Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas | bônus | 60,00 | 23,00 | | 704,00 | 1.400.000,00 | 606.231,35 | | 17.560.000,00 |
| Imóveis construídos em áreas urbanizadas para o reassentamento da população | Domicílios | 29,00 | | | 223,00 | 1.400.000,00 | 440.795,57 | | 7.856.000,00 |
| Pessoas instruídas em formação profissional | pessoa | 10,00 | 3,00 | | 600,00 | 6.000,00 | | | 536.000,00 |
| Gestão Urbana e Proteção Ambiental | | | | | | | | | |
| Áreas municipais com riscos ambientais identificadas, mapeadas e avaliadas | ha | 2,00 | | | 1.250,00 | 1.000,00 | | | 318.000,00 |
| Parque linear implantado | parque | | | | 1,00 | | | | 367.000,00 |
| Área de nascentes de cursos de água protegidas | área | | | | | 1.000,00 | | | |
| Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro criada. | unidade de conservação | | | | 1,00 | 1.000,00 | | | 847.400,00 |
| Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Morro São Pedro elaborado. | plano | | | | 1,00 | | | | 60.000,00 |
| Unidade de Fiscalização e Administração do Morro São Pedro implantada | unidade de fiscalização | | | | 1,00 | 1.000,00 | | | 858.000,00 |
| Pessoas instruídas em temas de educação sanitária e ambiental | pessoa | 10,00 | | | 1.500,00 | 1.000,00 | | | 110.000,00 |
| Fortalecimento Institucional | | | | | | | | | |
| Estudos para a sustentabilidade financeira do DMAE e DEP (reforma tarifária DMAE, recuperação de custos DEP e sistema contábil DMAE e DEP) elaborados | estudo | | | | 2,00 | 10.000,00 | | | 1.192.000,00 |

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1081 - Programa Integrado Socio-Ambiental de Porto Alegre
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 26/09/2013

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|---|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Estudo para a implementação de Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento | estudo | | | | 1,00 | 260.000,00 | 89.760,00 | | 272.000,00 |
| Planos operacionais do DEP, DEMHAB, SMOV, SMAM, SMCPGL desenvolvidos | plano | | | | 5,00 | 18.000,00 | | | 1.272.000,00 |
| Engenharia e Administração e outros | | | | | | | | | |
| Engenharia e Administração | N/A | | | | | 2.751.700,00 | 1.294.002,24 | | 13.833.000,00 |
| Auditoria e Avaliação | N/A | | | | | 18.000,00 | | | 381.000,00 |
| Contingência | N/A | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.376.237,68 | 3.114.298,17 | | 178.016.000,00 |
