
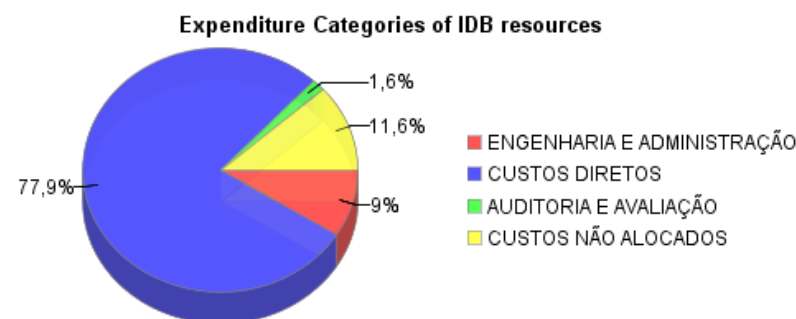
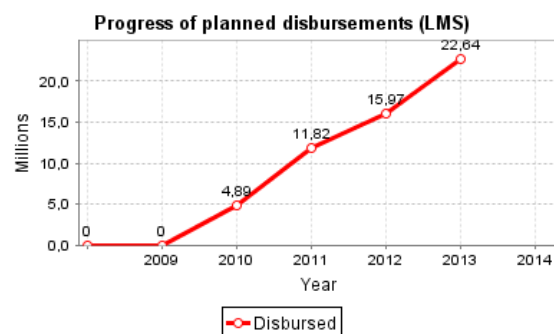



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	1979/OC-BR	Current Approved Amount:	83.270.000,00	Original IDB:	83.270.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	22.644.188,25	Current IDB:	83.270.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	27,19	Pari-passu:	49,00
Related Operation(s):		Balance:	60.625.811,75	Co-Financing/Country:	85.804.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	169.074.000,00
				Amortization Period (months):	234


Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 03-oct-2013 Validated by Country Representative: 04-oct-2013

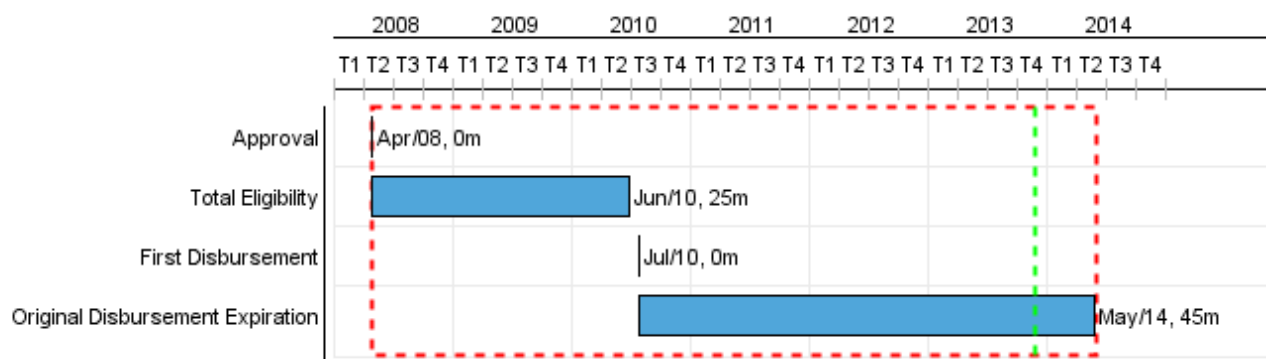

Accumulated Progress as of 2013

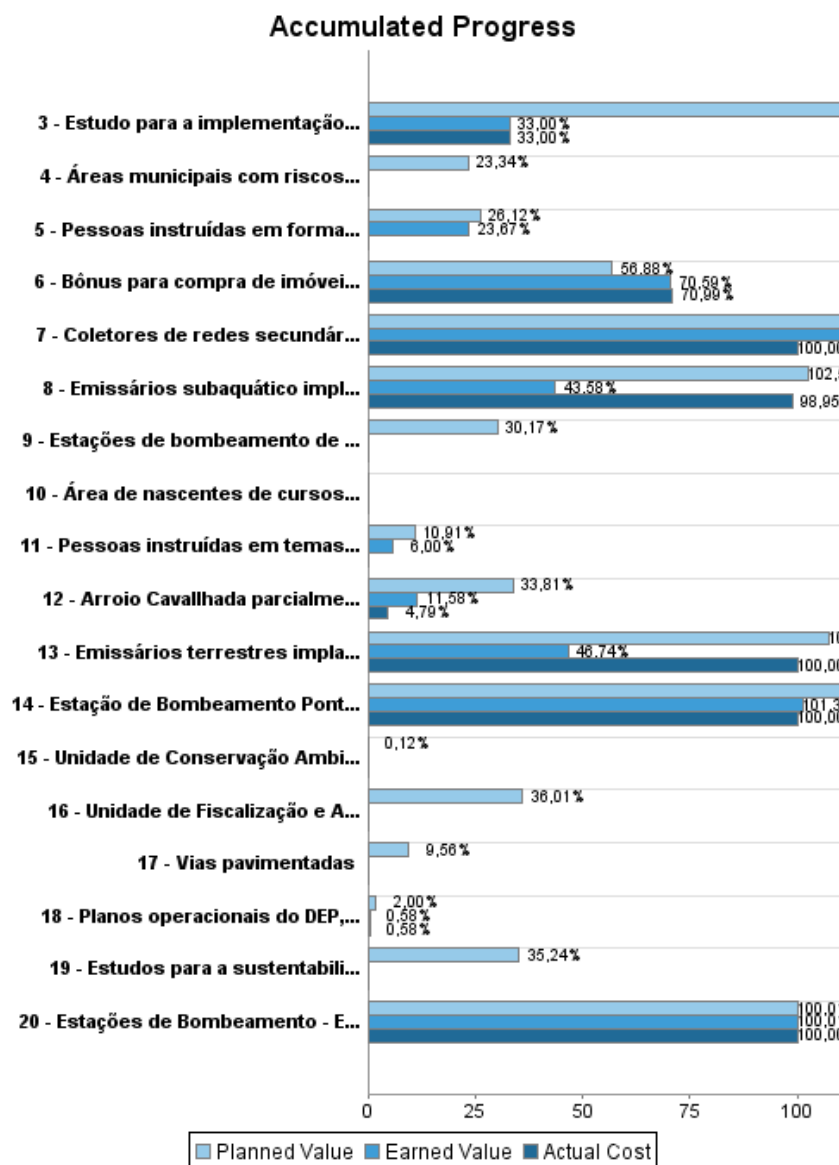

Accumulated Progress

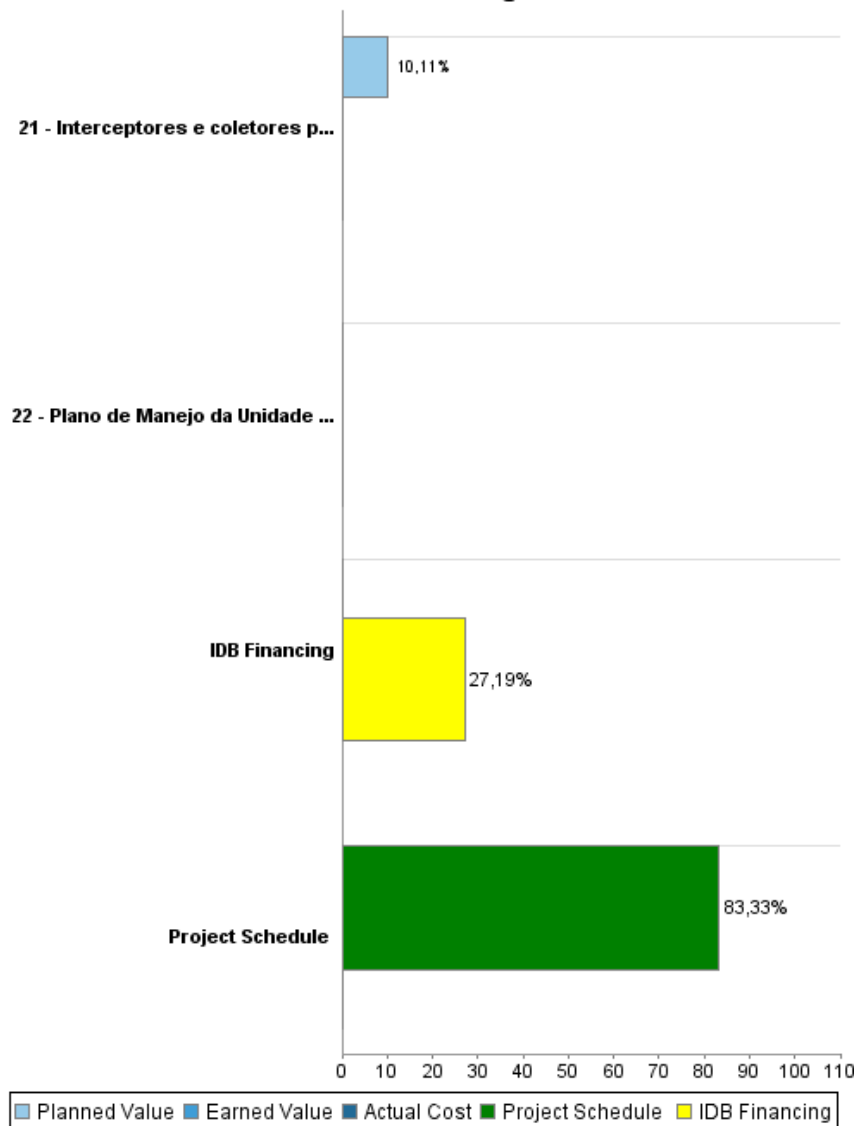

Outcomes

Outcome:	Qualidade da Água do Lago Guaíba melhorada
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	End of project
Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 46	mg/l	7,46	2008	P A			8,80
Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 50	mg/l	7,70	2008	P A			8,80
Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 46	mg O2/l	0,60	2008	P A			5,00
Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 50	mg O2/l	1,20	2008	P A			5,00
Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 50	NMP/100ml	3.400,00	2008	P A	2.000,00	1.900,00 3.400,00	150,00
Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 46	NMP/100ml	20.000,00	2008	P A			150,00

Outcome:	Risco de inundações reduzido
-----------------	------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	End of project
Áreas de inundação ao longo do Rio Cavalhada, para um evento de recorrência de 10 anos	km2	0,66	2008	P A	0,66	0,66 0,66	
Famílias reassentadas fora de áreas de risco	famílias	195,00	2008	P A			1.680,00

Outcome:	Qualidade ambiental urbana melhorada
-----------------	--------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	End of project
Áreas de proteção ambiental e de lazer	hectares		2008	P A			30,00
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	domicilios		2013	P A			30.000,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Qualidade de água									
Coletores de redes secundárias construídos (Sistema Cavallhada)	metro				63.500,00				16.548.150,00
Emissários terrestres implantados	metro				9.500,00				20.764.800,00
Emissários subaquático implantados	metro				11.000,00	415.237,68			39.043.070,00
Estação de Bombeamento Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluídas	estação				1,00				6.212.980,00
Estações de Bombeamento - EBEs C2 e Cristal (Cristal com chaminés de equilíbrio) concluídas	estação				3,00				8.942.000,00
Desenvolvimento Urbano									
Arroio Cavallhada parcialmente canalizado	metro	420,00	164,00		1.900,00	4.000.000,00	683.509,01		15.107.000,00
Estações de bombeamento de esgotos construídas	estação				2,00	1.068.300,00			9.805.300,00
Interceptores e coletores pluviais implantados	metro	200,00			3.976,00	724.000,00			7.162.300,00
Vias pavimentadas	metro				2.222,00	300.000,00			8.968.000,00
Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	bônus	60,00	23,00		704,00	1.400.000,00	606.231,35		17.560.000,00
Imóveis construídos em áreas urbanizadas para o reassentamento da população	Domicílios	29,00			223,00	1.400.000,00	440.795,57		7.856.000,00
Pessoas instruídas em formação profissional	pessoa	10,00	3,00		600,00	6.000,00			536.000,00
Gestão Urbana e Proteção Ambiental									
Áreas municipais com riscos ambientais identificadas, mapeadas e avaliadas	ha	2,00			1.250,00	1.000,00			318.000,00
Parque linear implantado	parque				1,00				367.000,00
Área de nascentes de cursos de água protegidas	área					1.000,00			
Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro criada.	unidade de conservação				1,00	1.000,00			847.400,00
Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Morro São Pedro elaborado.	plano				1,00				60.000,00
Unidade de Fiscalização e Administração do Morro São Pedro implantada	unidade de fiscalização				1,00	1.000,00			858.000,00
Pessoas instruídas em temas de educação sanitária e ambiental	pessoa	10,00			1.500,00	1.000,00			110.000,00
Fortalecimento Institucional									
Estudos para a sustentabilidade financeira do DMAE e DEP (reforma tarifária DMAE, recuperação de custos DEP e sistema contábil DMAE e DEP) elaborados	estudo				2,00	10.000,00			1.192.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1081 - Porto Alegre Integrated Socio Environmental Program
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 26/09/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Estudo para a implementação de Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento	estudo				1,00	260.000,00	89.760,00		272.000,00
Planos operacionais do DEP, DEMHAB, SMOV, SMAM, SMCPGL desenvolvidos	plano				5,00	18.000,00			1.272.000,00
Engenharia e Administração e outros									
Engenharia e Administração	N/A					2.751.700,00	1.294.002,24		13.833.000,00
Auditoria e Avaliação	N/A					18.000,00			381.000,00
Contingência	N/A								
TOTAL						12.376.237,68	3.114.298,17		178.016.000,00
