



Operation Number: **BR-L1335**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**
Last Update: **10/17/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **10/17/2014**
Division Chief validation date: **10/20/2014**
Country Representative validation date: **10/20/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Rehabilitación Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS - Suplementar a P	Loan Number:	2962/OC-BR
Executing Agency (EA):	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		
Team Leader:	Nery,Claudia Regina Borges	Sector/Subsector:	SANITATION URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1335	\$55,000,000.00	\$55,000,000.00	\$55,000,000.00	\$0.00	\$110,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1335	\$55,000,000.00	\$31,112,014.70	56.57%	\$23,887,985.30


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

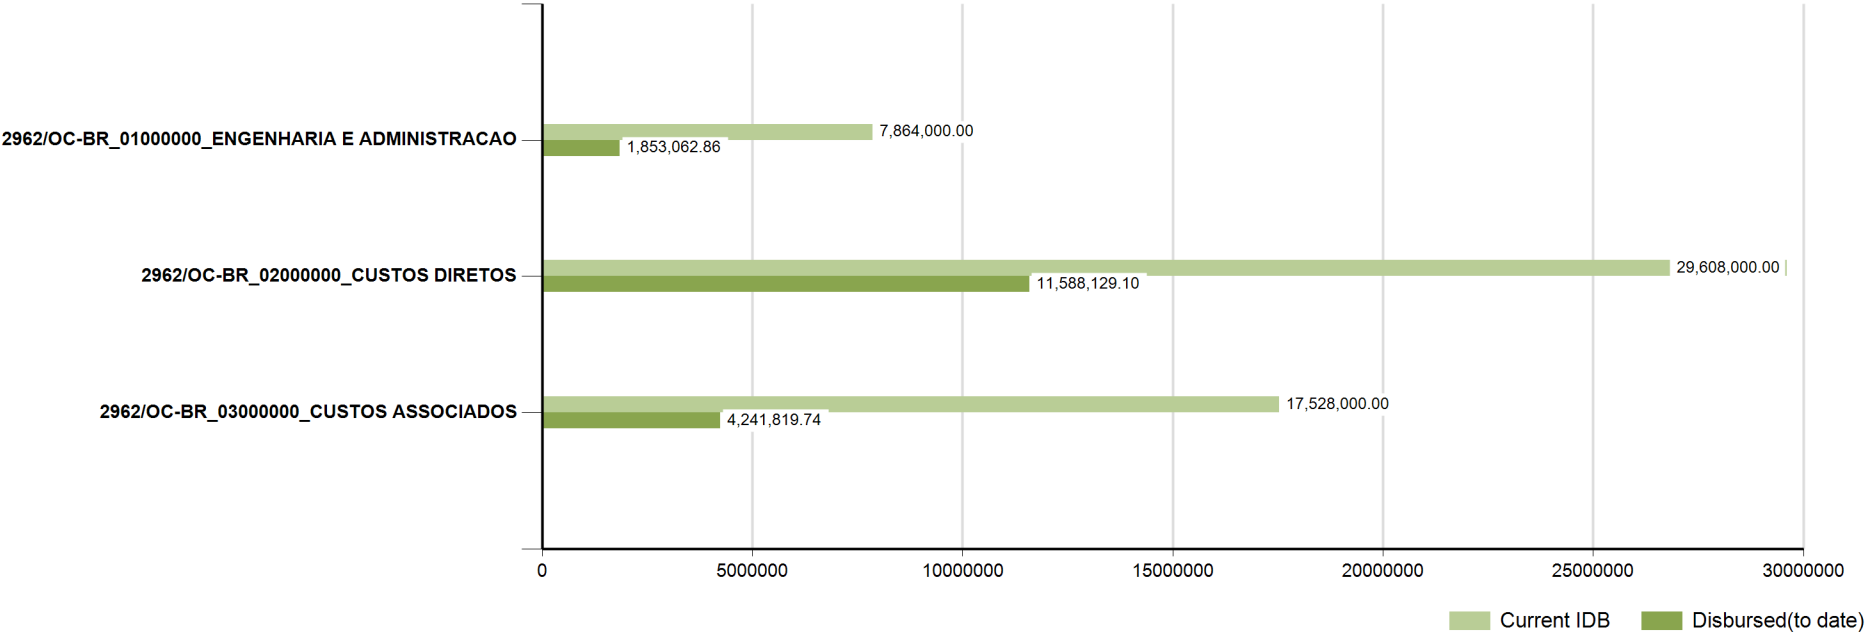

Results Matrix

Impacts

Impact: 0 Melhoria da Qualidade de vida dos habitantes das Bacias/Sub-bacias dos Córregos 1º de Maio, Baleares, N. Sra. da Piedade e Engenho Nogueira

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0.1 Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego 1º de Maio		índice	0.90	2003	Relatório bienal do Plano Municipal de Saneamento/ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Projeto concluído em 2012 (O Índice de	P	0.92					
						Salubridade Ambiental (ISA) estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana.)	P(a)	0.92					
							A	0.92		0.00			

EOP
0.92
0.92
0.92

0.2 Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego de Baleares		índice	0.82	2003	Relatório bienal do Plano Municipal de Saneamento/ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Projeto concluído em 2012 (O Índice de Salubridade Ambiental (ISA) estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana).	P	0.95						
	P(a)						0.95							
	A						0.95		0.00					
0.3 Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego N. Sra da Piedade		índice	0.88	2003	Relatório bienal do Plano Municipal de Saneamento/ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Projeto concluído em 2012 (O Índice de Salubridade Ambiental (ISA) estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana).	P	0.99						
	P(a)						0.99							
	A						0.99		0.00					

0.95
0.95
0.95

0.99
0.99
0.99

0.4 Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego Engenho Nogueira						Projeto concluído em 2012 (O Índice de	P	0.96						
						de	P(a)	0.96						
						Salubridade Ambiental (ISA) estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana).	A	0.96		0.00				
		índice	0.74	2003	Relatório bienal do Plano Municipal de Saneamento/ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte									

Impact: 1 Melhoria da Qualidade de vida dos habitantes da Bacia do Córregos Bonsucesso.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.0 Aumento do Índice de Salubridade Ambiental (ISA) da Bacia do Córrego Bonsucesso						Previsão de conclusão da obra em 2018 (O Índice de Salubridade Ambiental (ISA)	P						0.98
						estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, avalia a situação ambiental do município a partir de indicadores relativos às coberturas dos serviços à população de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana).	P(a)						0.98
							A		0.81				
		índice	0.67	2011	Relatorio bienal do Plano Municipal de Saneamento\ Conselho Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte								

0.96
0.96
0.96

EOP
0.98
0.98

Outcomes

Outcome:	0 Condição de salubridade ambiental nas bacias contempladas melhoradas													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
0.0 Carga contaminada interceptada nos cursos d'água		Kg DBO/dia	3,620.00	2011	Monitoramento da qualidade de água realizado pela UEP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Companhia de Saneamento de Minas Gerais		P					630.00	630.00	
							P(a)			2,097.00	1,247.00	1,172.00	630.00	630.00
							A		0.00					
0.1 Deposição irregular de resíduos sólidos		m3/ano	374.00	2011	Registro da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte		P					67.00	67.00	
							P(a)			122.00	122.00	80.00	67.00	67.00
							A		37.00					
0.2 Trechos com problemas de inundação no município		trechos	13.00	2011	Registro da Coordenação da Defesa Civil		P					0.00	0.00	
							P(a)			3.00	1.00	0.00	0.00	0.00
							A		3.00					
0.3 Domicílios com acesso ao sistema de saneamento	RF	Houesholds	0.00	2011	Informações da COPASA transmitidas à UEP		P	3,711.00	30.00	920.00	694.00		5,355.00	
							P(a)	3,711.00	30.00	210.00	1,082.00	322.00	0.00	5,355.00
							A	3,711.00	30.00					
0.4 Domicílios cujas águas residuais são tratadas		Houesholds	0.00	2011	Informações da COPASA transmitidas à UEP		P							
							P(a)			210.00	1,082.00	322.00	0.00	1,614.00
							A		0.00					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Redução do Risco de Inundação		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 1 - Canais de Macro drenagem construídos	km	P	3.00	11.78	P	11,286.00	33,239.00
		P(a)	3.00	11.78	P(a)	11,286.00	33,239.00
		A	3.34	9.76	A	3,857.33	19,850.33
Produto 2 - Parque Lineares implantados	ha	P	5.20	16.10	P	14,825.00	60,268.00
		P(a)	5.20	16.10	P(a)	14,825.00	60,268.00
		A	5.20	16.10	A	11,809.21	53,037.21
Produto 3 - Vias marginais construídas	km	P	1.64	9.32	P	20,019.00	37,034.00
		P(a)	1.64	9.32	P(a)	20,019.00	37,034.00
		A	1.64	8.80	A	19,857.05	24,478.05
Produto 4 - Número de famílias realocalizadas nas Bacias contempladas no Programa, de acordo com diretrizes do PDR.	famílias	P	273.00	1,295.00	P	2,286.00	20,652.00
		P(a)	273.00	1,295.00	P(a)	2,286.00	20,652.00
		A	102.00	1,048.00	A	1,788.94	19,928.94
Melhoria da Qualidade dos Cursos d'água		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 5 - Sistema de esgotamento sanitário construído	unidade	P	0.00	5.00	P	2,869.00	7,238.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	2,869.00	7,238.00
		A	0.00	4.00	A	2,758.02	4,840.02
Produto 6 - Novas ligações domiciliares de esgotos sanitários construídas	unidades	P	30.00	5,355.00	P	38.00	1,955.00
		P(a)	30.00	5,355.00	P(a)	38.00	1,955.00
		A	30.00	3,741.00	A	0.00	129.00
Melhoria da Gestão Urbana e Ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 7 - Plano de Gestão Socioambiental implementado	plano	P	0.00	5.00	P	1,032.00	8,644.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	1,032.00	8,644.00
		A	0.00	4.00	A	629.10	6,939.10
Other Cost			2014		Cost		
Outros		P	\$18,299.00		\$61,811.00		
		P(a)	\$18,299.00		\$61,811.00		
		A	\$7,335.61		\$39,673.61		
Total Cost			2014		Total Cost		
		P	\$70,654.00		\$230,841.00		
		P(a)	\$70,654.00		\$184,100.26		
		A	\$48,035.26		\$168,876.26		

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Resultado	Domicílios com acesso ao sistema de saneamento	Modify Means of Verification	Correção do nome da empresa de saneamento responsável pela medição do indicador.	10/15/2014	10/15/2014
Resultado	Domicílios cujas águas residuais são tratadas	Modify Means of Verification	Correção do nome da empresa.	10/15/2014	10/15/2014
Resultado	Domicílios cujas águas residuais são tratadas	Modify Unit of Measure	erroneamente foi inserida a bandeira do marco setorial, este erro já foi sanado.	10/2/2014	10/15/2014

Resultado	Domicílios cujas águas residuais são tratadas	Crear Indicador de Resultado	O presente indicador foi introduzido neste ciclo por solicitação da Sede, por se tratar de um indicador setorial.	10/2/2014	10/15/2014
Producto	Producto 4 - Número de famílias realocizadas nas Bacias contempladas no Programa, de acordo com diretrizes do PDR.	Modify Output name	O nome do produto estava escrito de maneira errada e agora foi corrigido.	9/15/2014	9/12/2014
Resultado	Domicílios conectados aos sistema de tratamento sanitário.	Borrar Indicador de Resultado	Este indicador de resultados estava em duplicidade e por isso foi removido	9/15/2014	9/12/2014
Impacto	Melhoria da Qualidade de vida dos habitantes da Bacia do Córregos Bonsucesso.	Modify Statement	O nome do indicador estava incorreto fazendo referencia anteriormente à Bacias/Sub-bacias, mas na verdade ela se refere apenas à Melhoria da Qualidade de vida dos habitantes da Bacia do Córregos Bonsucesso.	9/15/2014	9/12/2014
Impacto	Melhoria da Qualidade de vida dos habitantes das Bacias/Sub-bacias dos Córregos Bonsucesso.	Borrar Impacto	O indicador estava em duplicidade e por isso foi removido	9/15/2014	9/12/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
