





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA		
Sector: WATER AND SANITATION-SOLID WASTE		
Número da Operação: 2880/BL-BO	Atual: 20.000.000,00	Original BID: 20.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 20.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: BO-T1154, RG-P1478	Saldo: 20.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: GOM - Global of Multiple Works Operation		Original Estimado: 20.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 25-sep-2013

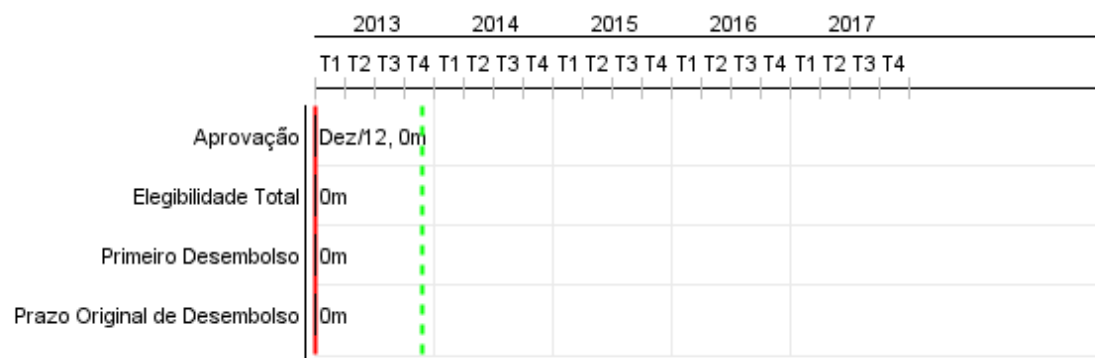

Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: Cobertura del Servicio de Recolección Aumentada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	Final do Projeto
Cobertura del servicio de recolección de Residuos Sólidos en Riberalta	%	84,00	2012	P A	87,00	90,00	90,00
Cobertura del servicio de recolección de Residuos Sólidos en Potosí	%	75,00	2012	P A	78,00	80,00	80,00
Hogares con acceso al servicio de recolección en Riberalta	Hogares	16.682,00	2012	P A	18.716,00	19.262,00	19.262,00
Hogares con acceso al servicio de recolección en Potosí	Hogares	29.004,00	2012	P A	31.340,00	32.544,00	32.544,00

Resultado: Cobertura del Servicio de barrido aumentada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	Final do Projeto
Cobertura del servicio de barrido en Potosí	%	41,00	2012	P A	52,00	57,00	57,00
Cobertura del servicio de barrido en Riberalta	%	61,00	2011	P A	72,00	75,00	75,00

Resultado: Disposición de RSU en relleno sanitario aumentada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	Final do Projeto
Residuos Sólidos dispuestos en relleno sanitario en Riberalta	Ton/día		2012	P A	43,00	46,30	46,30
Residuos Sólidos dispuestos en relleno sanitario en Potosí	Ton/día		2012	P A	103,40	112,12	112,20
Hogares cuyos Residuos Sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios en Riberalta	Hogares		2012	P A			19.262,00
Hogares con Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios en Potosí	Hogares		2012	P A			32.544,00

Resultado: Aprovechamiento de Residuos Sólidos aumentada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	Final do Projeto
Residuos Sólidos para aprovechamiento en Riberalta	Ton/día		2012	P A	3,50	4,70	4,70
Residuos Sólidos para aprovechameinto en Potosí	Ton/día		2012	P A	9,10	12,30	12,30

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BO-L1073 - Program for Comprehensive Solid Waste Management Implementation in
Bolivia
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 19/09/2013

Resultado:	Eficiencia comercial aumentada
-------------------	--------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	Final do Projeto
Eficiencia en la cobranza (recaudado / facturado) en Riberalta	%	83,00	2011	P A		85,00	85,00
Eficiencia en la cobranza (recaudado / facturado) en Potosí	%	90,40	2010	P A		92,40	92,40

Resultado:	Inclusión/Formalización de segregadores
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2016	2017	Final do Projeto
Segregadores ocupados en actividades contempladas en el plan de inclusión / formalización en Riberalta	Segregadores		2012	P A		40,00	40,00
Segregadores ocupados en actividades contempladas en el plan de inclusión / formalización en Potosí	Segregadores		2012	P A		10,00	10,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I: Infraestructura									
Botaderos actualmente en operación cerrados	Numero de Botaderos				3,00				3.195.908,00
Rellenos sanitarios construidos	Relleno sanitario				3,00				10.546.814,00
Lote de maquinaria pesada para la operación de rellenos sanitarios adquiridos	Lote de maquinaria				3,00				1.292.049,00
Lotes de vehículos para recolección y barrido adquiridos	Lote de vehículos				3,00				609.053,00
Estaciones de transferencia construidas	Estaciones				1,00				523.500,00
Estudios y diseños elaborados	Estudios				6,00				510.342,00
Componente II: Aprovechamiento de RSU e Inclusión y formalización de segregadores									
Plantas de aprovechamiento de residuos sólidos construidas	Plantas				3,00				1.100.823,00
Segregadores capacitados	Personas				160,00				240.000,00
Componente III: Desarrollo de Instrumentos para la sostenibilidad de los servicios									
Estudios Elaborados	Estudios				8,00				230.000,00
Sistema de Planificación, Seguimiento e Información Sectorial de Residuos Sólidos desarrollado	Sistema				1,00				172.000,00
Sistema de Planificación, Gestión e Información Gerencial de Gestión Integral de Residuos Sólidos para entidades municipales desarrollado	Sistema				1,00				295.126,00
Estudios de generación y caracterización de Residuos Sólidos elaborados	Estudios				2,00				45.000,00
Plan de Comunicación y Concientización Ciudadana sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborado	Estudios				1,00				30.000,00
Administración y Gestión del Programa									
Administración y Gestión	N/A								1.209.386,00
TOTAL									20.000.001,00
