



Operation Number: **AR-L1119**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **3/31/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **05/04/2015**
Division Chief validation date: **05/04/2015**
Country Representative validation date: **05/04/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Barrio Improvement Program, Second Individual Operation	Loan Number:	2662/OC-AR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INV ERSION PUBLICA Y SERVICIOS		
Team Leader:	Adler,Veronica	Sector/Subsector:	NEIGHBORHOOD UPGRADING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1119	\$400,000,000.00	\$400,000,000.00	\$45,000,000.00	\$0.00	\$445,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1119	\$400,000,000.00	\$138,000,000.00	34.50%	\$262,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

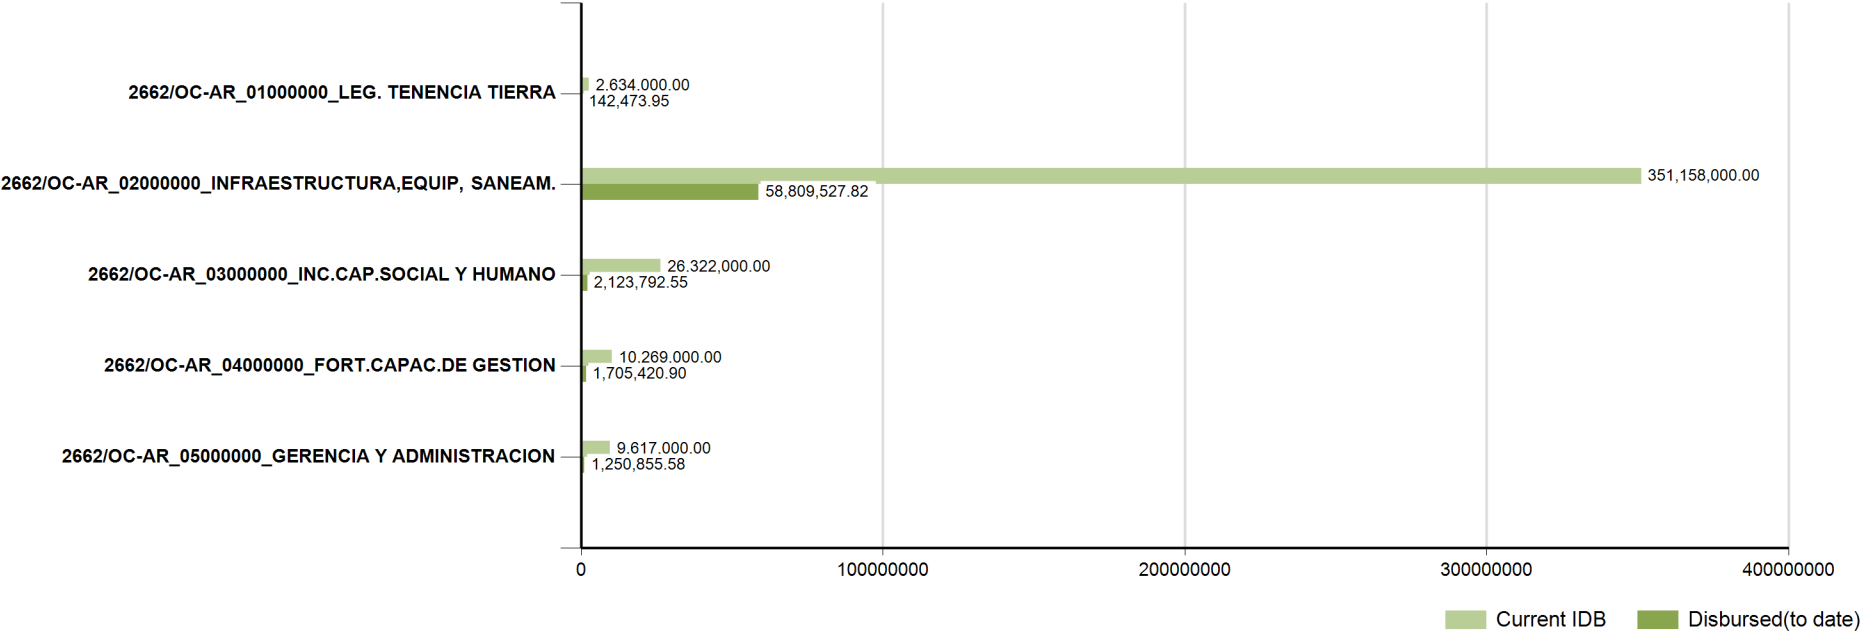

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condiciones de habitabilidad de los hogares residentes en villas y asentamientos irregulares del país mejorada.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Porcentaje de viviendas de calidad insuficiente en las villas y asentamientos informales en los que interviene el programa.		%		2012	Informe Final de la Unidad Coordinadora Nacional y en evaluación final. Fuente: Ficha Única de Proyecto y ficha post obra de cada barrio.	Esta situación de viviendas se corresponde con las categorías CALMAT IV y CALMAT V. El indicador compuesto CALMAT es utilizado por el INDEC para clasificar las viviendas existentes según su calidad constructiva. El INDEC capta la informaiación para esta cat	P	-30.00
							P(a)	-30.00
							A	
1.2 Porcentaje de hacinamiento promedio en las villas y los asentamientos informales en los que interviene el programa.		%		2012	Informe Anual y Final de la Unidad Coordinadora Nacional y en evaluación final. Fuente: Ficha Única de Proyecto y Ficha Post-Obra.	El indicador proviene del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que utiliza el INDEC: se define como condición de hacinamiento a aquellas viviendas y hogares con más de tres personas por habitación. Meta: reducción del 30%. La línea de base s	P	-30.00
							P(a)	-30.00
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Seguridad en la tenencia de la tierra mejorada
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Familias de los barrios que tienen títulos de propiedad			%		2012	Informe anual y final de la UCN y en la evaluación final. Fuente: FUP y FPO.	Línea de base: % actual en los barrios, medido a la fecha de inicio de la intervención.	P	30.00
								P(a)	30.00
								A	
Outcome:	2 Cobertura en servicios básicos mejorada								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Barrios intervenidos donde funcionan satisfactoriamente al menos tres de los servicios básicos (agua, cloacas, gas y alumbrado público)			%	0.00	2012	Informe anual y final de la UCN y en la evaluación final. Fuente: FPO.	Agua corriente 75% del tiempo, cloacas conectadas a plantas de tratamiento, gas con fluido constante, alumbrado público en el acceso principal.	P	100.00
								P(a)	100.00
								A	
2.2 Barrios intervenidos donde los equipamientos comunitarios operan satisfactoriamente			%		2012	Informe anual y final de la UCN y en la evaluación final. Fuente: FPO.	Sala SUM operando al menos 15 días al mes; recaudación propia de ingresos que cubre más del 50% de los costos de operación.	P	75.00
								P(a)	75.00
								A	
Outcome:	3 Organizaciones comunitarias de base integradas a la ciudad formal								

Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Hogares que participan en actividades comunitarias		%		2012	Informe anual y final de la UCN y en la evaluación final. Fuente: FUP y FPO. Línea de base: medida a la fecha de inicio de la intervención.		P	40.00
	P(a)						40.00	
	A							
3.2 Incremento del capital social y humano de participantes en PFCSyH y PICs		%		2012	Valoración de las UE de las capacidades de los participantes en PICs y PFCSyH. Encuesta especial al iniciar y finalizar los proyectos.		P	40.00
	P(a)						40.00	
	A							
Outcome:	4 Desempeño de los equipos de supervisión y gestión de las unidades ejecutoras mejorado							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.1 Desfase entre el tiempo programado vs realizado en la licitación de obras		%	34.80	2012	Informe anual y final de la UCN. Línea de base: % promedio de desfase proyectos del préstamo 1842/OC-AR.		P	20.00
	P(a)						20.00	
	A							
4.2 Desfase entre el tiempo programado vs realizado en la ejecución de las obras		%	31.90	2012	Informe anual y final de la UCN. Línea de base: % promedio en la ejecución del préstamo 1842/OC-AR.		P	20.00
	P(a)						20.00	
	A							

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Legalización de la tenencia de la tierra		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Barrios con trazado urbano regularizado	barrios	P	5.00	70.00	P	121,000.00	1,686,000.00
		P(a)	5.00	70.00	P(a)	121,000.00	1,686,000.00
		A	16.00	23.00	A	79,000.00	125,000.00
Familias de los barrios con situación legal en sus lotes.	familias	P	15,692.00	55,059.00	P	354,000.00	1,241,000.00
		P(a)	15,692.00	74,213.00	P(a)	354,000.00	1,241,000.00
		A	34,483.00	49,126.00	A	63,000.00	97,000.00
Provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable, cloacas, gas y electricidad	Hogares	P	2,030.00	55,059.00	P	24,692,000.00	86,525,000.00
		P(a)	2,030.00	55,059.00	P(a)	24,692,000.00	86,525,000.00
		A	11,226.00	18,531.00	A	16,465,000.00	22,558,000.00
Barrios con equipamiento comunitario instalado	barrios	P	8.00	64.00	P	15,284,000.00	52,225,000.00
		P(a)	8.00	64.00	P(a)	15,284,000.00	50,225,000.00
		A	7.00	16.00	A	13,130,000.00	15,624,000.00
Kilómetros de redes viales construidas o mejoradas	kilómetros	P	56.00	196.00	P	71,752,000.00	251,427,000.00
		P(a)	56.00	199.00	P(a)	71,752,000.00	251,427,000.00
		A	75.00	104.00	A	28,605,000.00	42,727,000.00
Número de hogares reasentados	hogares	P	200.00	5,500.00	P		0.00
		P(a)	200.00	4,369.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Incremento de capital humano y social		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Líneas de acción de acompañamiento integral y gestión asociada desarrolladas anualmente en los proyectos por los equipos de campo (talleres, curso de capacitación, ferias)	líneas de acción	P	540.00	2,651.00	P	4,737,000.00	23,254,000.00
		P(a)	540.00	2,651.00	P(a)	4,737,000.00	23,254,000.00
		A	448.00	769.00	A	2,030,000.00	2,839,000.00
Proyectos de iniciativa productiva comunitaria ejecutados	proyectos	P	4.00	39.00	P	405,000.00	3,951,000.00
		P(a)	4.00	39.00	P(a)	405,000.00	3,951,000.00
		A	2.00	2.00	A	126,000.00	170,000.00
Proyectos de fortalecimiento de capital social y humano ejecutados	proyectos	P	7.00	40.00	P	357,000.00	2,040,000.00
		P(a)	7.00	40.00	P(a)	357,000.00	2,040,000.00
		A	5.00	9.00	A	175,000.00	223,000.00
Fortalecimiento de la capacidad de gestión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Funcionarios de las unidades ejecutoras y/o actores sociales del programa que participan en talleres y seminarios de capacitación	participantes	P	800.00	4,000.00	P	400,000.00	2,000,000.00
		P(a)	800.00	4,000.00	P(a)	400,000.00	2,000,000.00
		A	932.00	1,356.00	A	105,000.00	183,000.00
Estudios técnicos en gestión urbana producidos por la UCN y UEP	estudios	P	0.00	3.00	P	0.00	1,500,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	1,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Proyectos ejecutivos integrales producidos por la UEP y UEM	proyectos	P	30.00	115.00	P	1,933,000.00	7,410,000.00
		P(a)	30.00	239.00	P(a)	1,933,000.00	7,410,000.00
		A	129.00	207.00	A	1,360,000.00	2,295,000.00

Sistemas de gestión en UEP mejorados	sistemas de gestión	P	4.00	25.00	P	80,000.00	500,000.00
		P(a)	4.00	15.00	P(a)	80,000.00	540,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración, Auditoría y Evaluación							

Other Cost			2014	Cost
Administración, Auditoría y Evaluación	P		\$2,132,000.00	\$11,241,000.00
	P(a)		\$2,132,000.00	\$11,241,000.00
	A		\$1,014,000.00	\$2,859,000.00
Total Cost			2014	Total Cost
	P		\$122,247,000.00	\$445,000,000.00
	P(a)		\$122,247,000.00	\$330,855,000.00
	A		\$63,152,000.00	\$89,700,000.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistemas de gestión en UEP mejorados	Modify Financial P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015
Output	Barrios con equipamiento comunitario instalado	Modify Financial P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015
Output	Sistemas de gestión en UEP mejorados	Modify Physical P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015
Output	Proyectos ejecutivos integrales producidos por la UEP y UEM	Modify Physical P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015
Output	Funcionarios de las unidades ejecutoras y/o actores sociales del programa que participan en talleres y seminarios de capacitación	Modify Physical P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015
Output	Proyectos de fortalecimiento de capital social y humano ejecutados	Modify Physical P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015
Output	Proyectos de iniciativa productiva comunitaria ejecutados	Modify Physical P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015
Output	Número de hogares reasentados	Modify Physical P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015
Output	Kilómetros de redes viales construidas o mejoradas	Modify Physical P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015
Output	Familias de los barrios con situación legal en sus lotes.	Modify Physical P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor.	3/27/2015	3/25/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
