
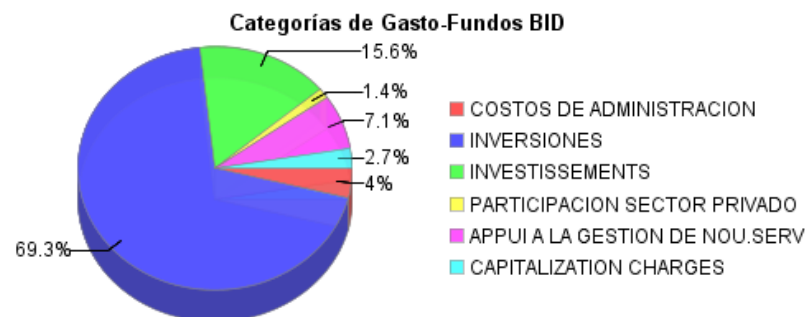
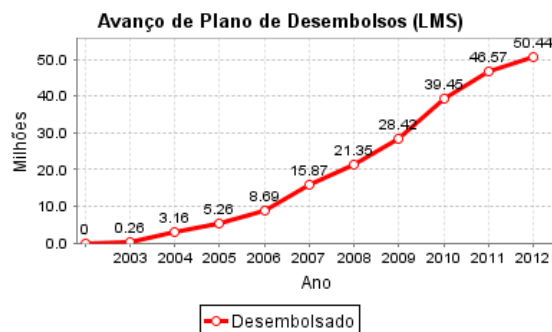



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ENERGIE ET COMMUNICATIONS		
Sector: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: 1010/SF-HA;2381/GR-HA	Atual: 54.000.000,00	Original BID: 72.455.213,93
Estágio: Approved	Desembolsado: 50.230.633,63	Corrente BID: 54.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 93,02	Pari-passu: 86,00
Operação Relacionada: HA-T1009	Saldo: 3.769.366,37	Cofinanciamento/País: 6.730.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 79.185.213,93
		Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2012

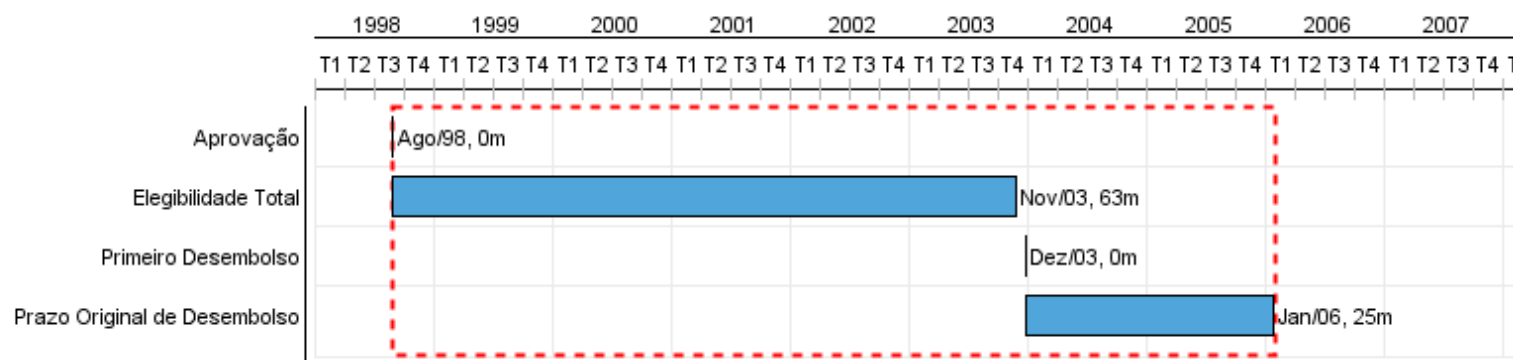

## Progresso Acumulado até 2012

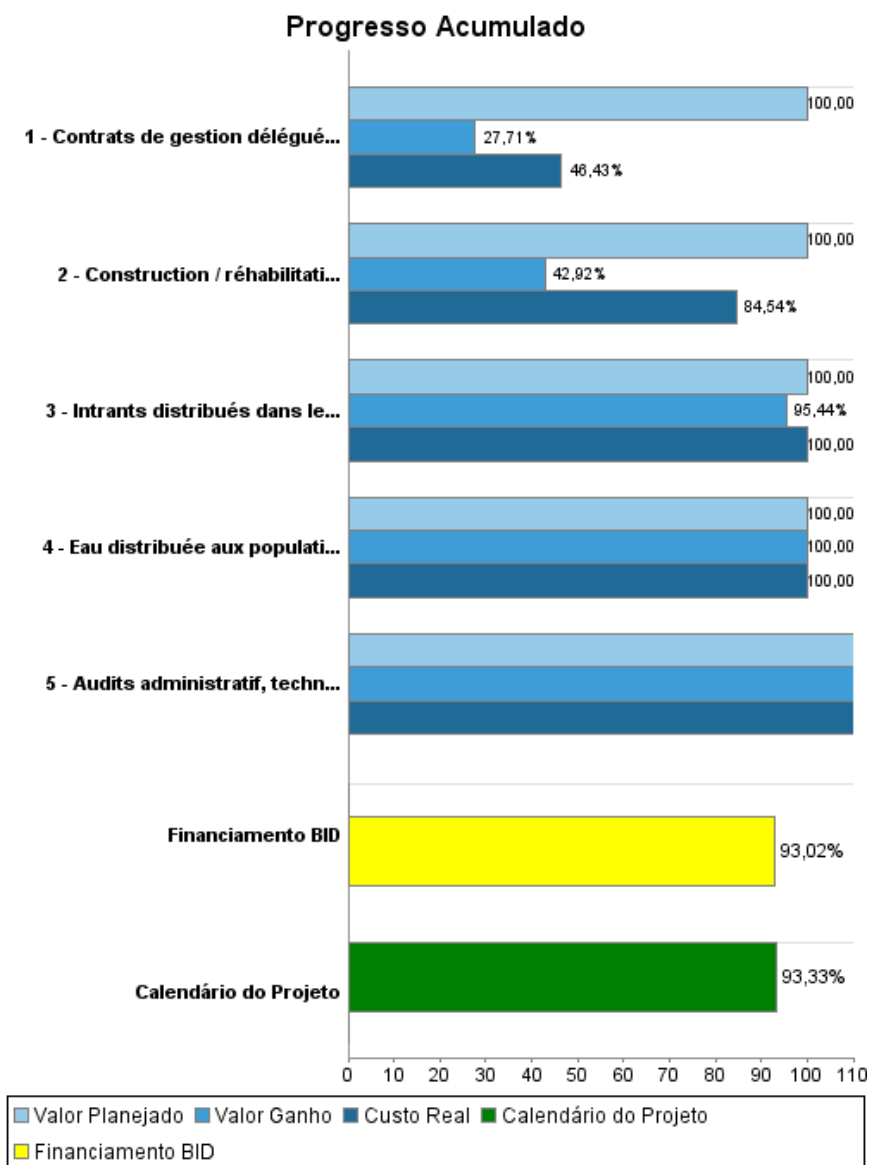

## Resultados

**Resultado:** Améliorer durablement l'accès et la qualité des services d'eau potable et d'assainissement dans villes de Saint-Marc, les Cayes, Jacmel, Port-de-Paix et Ouanaminthe

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Recouvrement des coûts liés aux services d'eau potable - Saint Marc	%	3.50	2008	P	20.00	45.00	65.00	65.00	65.00
				A	18.00	60.00	65.00	65.00	
Recouvrement des coûts liés aux services d'eau potable - Port de Paix	%	5.00	2008	P		5.00	30.00	50.00	50.00
				A		25.00	30.00	30.00	
Recouvrement des coûts liés aux services d'eau potable - Les Cayes	%	3.50	2008	P	3.50	3.50	30.00	50.00	50.00
				A	3.50	3.50	30.00	30.00	
Recouvrement des coûts liés aux services d'eau potable - Ouanaminthe	%		2008	P			30.00	50.00	50.00
				A					
Ménages disposant d'une nouvelle connexion ou d'une connexion améliorée au service d'Eau potable - Saint Marc	Households		2008	P		3,000.00	1,000.00	500.00	4,500.00
				A	1,500.00	3,000.00	1,435.00		
Ménages disposant d'une nouvelle connexion ou d'une connexion améliorée au service d'Eau potable - Port de Paix	Households		2008	P			600.00	2,400.00	3,000.00
				A	400.00	400.00	400.00	135.00	
Ménages disposant d'une nouvelle connexion ou d'une connexion améliorée au service d'Eau potable - Les Cayes	Households	1,000.00	2008	P				2,000.00	6,000.00
				A	1,000.00				
Ménages disposant d'une nouvelle connexion ou d'une connexion améliorée au service d'Eau potable - Ouanaminthe	Households		2008	P				2,000.00	2,000.00
				A					

**Resultado:** Définir une stratégie d'intervention dans ce secteur pour la région métropolitaine.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Existence d'un plan stratégique de restructuration des services dans la zone métropolitaine pour les 3 prochaines années	plan		2008	P		1.00			1.00
				A		1.00			
Nb de personnes sinistrées 6 mois après le séisme du 12 janvier 2010 ayant eu accès a un service d'eau potable au niveau de Port au Prince	personne		2008	P		500,000.00			500,000.00
				A		500,000.00			

**Resultado:** Les populations en besoin suite à des situations d'urgence ont eu un accès rapide à un service d'eau potable

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Nombre d'intervention d'urgence réalisé par la DINEPA depuis sa création en 2009 ayant permis un accès rapide au service de base	intervention		2009	P		2.00			2.00
				A		2.00			

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Composante III. Investissements</b>									
Construction / réhabilitation achevées pour les réseaux d'alimentation en eau portable (AEPs) des villes secondaires (St Marc, Port-de-Paix, Ouanaminthe et les Cayes)	systèmes	3,00	1,00		4,00	3.500.000,00	3.000.000,00		44.100.000,00
Contrats de gestion déléguée ou d'assistance technique signés pour la gestion des AEPs	contrats	2,00			4,00	220.000,00			4.620.000,00
<b>Composante III.7 interventions d'urgence post-séisme</b>									
Eau distribuée aux populations sinistrées suite au tremblement de terre de janvier à juillet 2010	m3				500.000,00				2.500.000,00
Intrants distribués dans le cadre de la lutte contre épidémie choléra (chlore, comprimés de purification, savon)	distribution				1,00				2.500.000,00
<b>Composante IV. Participation du secteur privé (stratégie Port-au-Prince)</b>									
Audits administratif, technique et financier de la CAMEP réalisés. Clôture des comptes CAMEP 2010	audit		1,00		4,00		136.000,00		950.000,00
<b>Administration du projet</b>									
frais de fonctionnement de l'Unité d'exécution - OUTPUT = CREATION ET FONCTIONNEMENT EFFECTIF DE LA DINEPA	N/A					530.000,00	530.000,00		4.430.000,00
pas d'output applicable - audit du projet	N/A					35.400,00			210.000,00
pas d'output applicable - suivi évaluation	N/A					150.000,00	64.000,00		150.000,00
<b>charges capitalisation</b>									
pas d'output applicable	N/A					1.140.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.575.400,00</b>	<b>4.870.000,00</b>		<b>60.600.000,00</b>
