



Operation Number: **CO-L1125**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/15/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/16/2015**
Division Chief validation date: **04/29/2015**
Country Representative validation date: **04/29/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program for Support of Sustainable Development in the Departament of the Archipi	Loan Number:	3104/OC-CO
Executing Agency (EA):	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres		
Team Leader:	Lopez Ghio,Ramiro Andres	Sector/Subsector:	DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	REPUBLICA DE COLOMBIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1125	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1125	\$70,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$70,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

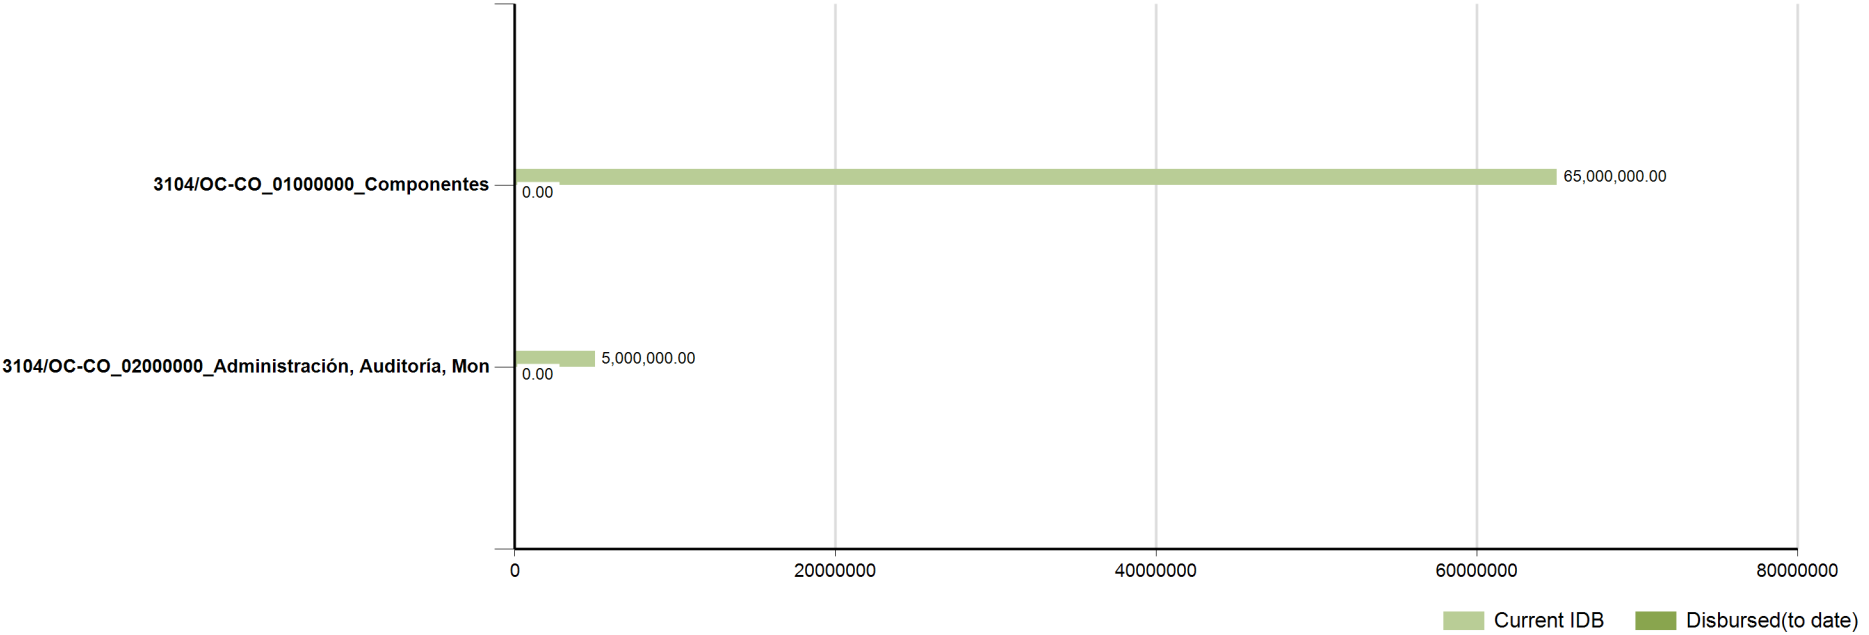

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mejora en los indicadores sociales del Departamento de San Andrés						
Observation:							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP
1.1 % de Población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN		%	80.90	2013	Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)		P 75.00
							P(a) 75.00
							A

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Condiciones habitacionales de la población de menores ingresos mejoradas.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
1.1 Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB		%	78.60	2011	Encuesta de calidad de vida del DANE	El programa de mejoramientos de barrios no está directamente relacionado con el aumento de cobertura de todos los servicios	P					30.00	
							P(a)		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
							A	0.00					0.00
Outcome:	2 Ambiente urbano en el área urbana central y en las adyacencias de las principales playas de la isla de San Andrés mejorado												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
2.1 Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.		Millones de pesos	64.65	2013	Encuesta inmobiliaria . Encuesta financiada por el programa.		P					93.10	
							P(a)		0.00	0.00	0.00	93.10	93.10
							A	0.00					0.00

2.2 Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.		Millones de pesos	45.00	2013	Encuesta inmobiliaria . Encuesta financiada por el programa.		P						57.80
	P(a)							0.00	0.00	0.00	59.85	59.85	
	A						0.00					0.00	
Outcome:	3 Micro y pequeñas empresas desarrolladas												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
3.1 Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.		Miles de US\$	42.70	2012	Fichas Departamentales de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo en base a datos DANE		P					47.00	
							P(a)		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00
	A						0.00					0.00	
Outcome:	4 Cobertura ampliada y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento) de las viviendas mejorada												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
4.1 Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto		Número de Hogares	800.00	2013	Reportes operativos y comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago		P	1,000.00	1,500.00	2,000.00			2,500.00
							P(a)	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00
	A						0.00					0.00	
4.2 Continuidad del servicio en la zona rural nucleada		Horas/día	7.00	2013	Reportes comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago.		P	7.00	10.00	11.00			12.00
							P(a)	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00	12.00
	A						0.00					0.00	
Outcome:	5 Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal fortalecida												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
5.1 Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.		IDF	55.54	2012	Índice de Desempeño fiscal de departamentos y municipios es calculado por el DNP		P					59.00
	P(a)							0.00	0.00	0.00	59.00	59.00
	A						0.00					0.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Desarrollo Urbano Integral		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P	0.00	6.00	P	219,000.00	12,600,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	219,000.00	16,600,700.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Programas	P	0.00	3.00	P	0.00	200,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	km	P	0.00	0.90	P	75,000.00	6,753,000.00
		P(a)	0.00	0.90	P(a)	75,000.00	3,241,300.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Paseo peatonal Spratt Bight con el sector noroeste de la isla construido (ELIMINAR APARECE EN EL PRODUCTO DE ARRIBA)	Paseo	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P	0.00	1.00	P	0.00	2,457,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	2,402,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P	0.00	1.00	P	0.00	2,490,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	2,056,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P	0.00	25.00	P	0.00	6,335,000.00
		P(a)	0.00	25.00	P(a)	0.00	6,648,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Redes rehabilitadas	Km	P	0.00	25.00	P	0.00	7,919,000.00
		P(a)	0.00	25.00	P(a)	0.00	8,309,999.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Solución de Saneamiento	P	0.00	350.00	P	0.00	3,696,000.00
		P(a)	0.00	350.00	P(a)	0.00	3,878,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P	0.00	1.00	P	898,000.00	4,387,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	898,000.00	3,502,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Aguas Lluvias de SAPSC formulado y aprobado (ELIMINAR)	Plan	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P	0.00	1.00	P	305,000.00	1,663,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	305,000.00	1,661,999.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Talleres de capacitación a la Unidad de Servicios Públicos de San Andrés realizados. (ELIMINAR)	Talleres de capacitacion	P		0.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP

Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P	0.00	3.00	P	24,000.00	4,800,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	24,000.00	1,710,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P	0.00	1.10	P	0.00	3,200,000.00
		P(a)	0.00	1.10	P(a)	0.00	6,290,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Estudios	P	0.00	4.00	P	0.00	500,000.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	0.00	500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Sistema	P	0.00	1.00	P	0.00	300,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Talleres	P	0.00	3.00	P	0.00	200,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Desarrollo económico local		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Personas	P	30.00	90.00	P	75,000.00	240,000.00
		P(a)	30.00	90.00	P(a)	75,000.00	70,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	Empresas	P	0.00	95.00	P	90,000.00	4,760,000.00
		P(a)	0.00	95.00	P(a)	90,000.00	5,000,002.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados a la base de catastro	Predios	P	0.00	18,315.00	P	0.00	750,000.00
		P(a)	0.00	18,315.00	P(a)	0.00	750,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Funcionarios capacitados en temas de finanzas públicas y evaluación de proyectos	Funcionarios	P	0.00	30.00	P	0.00	210,000.00
		P(a)	0.00	30.00	P(a)	0.00	210,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Estudio	P	0.00	1.00	P	0.00	340,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	270,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación, ejecución y evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Funcionarios	P	0.00	30.00	P	80,000.00	600,000.00
		P(a)	0.00	30.00	P(a)	80,000.00	600,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P	0.00	1.00	P	0.00	300,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de información para la administracion de la defensa juridica diseñado e implementado	Sistema	P	0.00	1.00	P	0.00	300,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Other Cost					2014		Cost
Administración, monitoreo y evaluación del programa				P	\$900,000.00		\$4,500,000.00
				P(a)	\$900,000.00		\$3,500,000.00
				A	\$0.00		\$0.00

Auditoria	P	\$100,000.00	\$500,000.00
	P(a)	\$100,000.00	\$1,500,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$2,766,000.00	\$70,000,000.00
	P(a)	\$2,766,000.00	\$65,382,487.00
	A		

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Modify EOP P(a)	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/14/2015	4/13/2015
Outcome	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/14/2015	4/13/2015
Outcome	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/14/2015	4/13/2015
Outcome	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	Modify EOP P(a)	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/14/2015	4/13/2015
Output	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	Modify Financial P(a) value	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación, ejecución y evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Modify Unit of Measure	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015

Output	Funcionarios capacitados en temas de finanzas públicas y evaluación de proyectos	Modify Unit of Measure	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Funcionarios capacitados en temas de finanzas públicas y evaluación de proyectos	Modify Output name	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Modify Output name	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	Modify Output name	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Proyectos integrales de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales formulados	Delete Output	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Paseo peatonal Spratt Bight con el sector noroeste de la isla construido	Delete Output	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Modify Output name	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Proyectos integrales de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales formulados	Create Output	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/13/2015	4/13/2015
Output	Paseo peatonal Spratt Bight con el sector noroeste de la isla construido	Create Output	Replanificación de metas por solicitud de Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso al 31 de diciembre de 2014 y actualización al PEP/POA 2015.	4/9/2015	4/13/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
