



Operation Number: **BR-L1081**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**  
Last Update: **3/17/2016**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/31/2016**  
Division Chief validation date: **03/31/2016**  
Country Representative validation date: **04/28/2016**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Porto Alegre Integrated Socio Environmental Program	Loan Number:	1979/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO		
Team Leader:	Nery,Claudia Regina Borges	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1081	\$83,270,000.00	\$83,270,000.00	\$85,804,000.00	\$0.00	\$169,074,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1081	\$83,270,000.00	\$41,684,121.96	50.06%	\$41,585,878.04


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	Partially Satisfactory

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

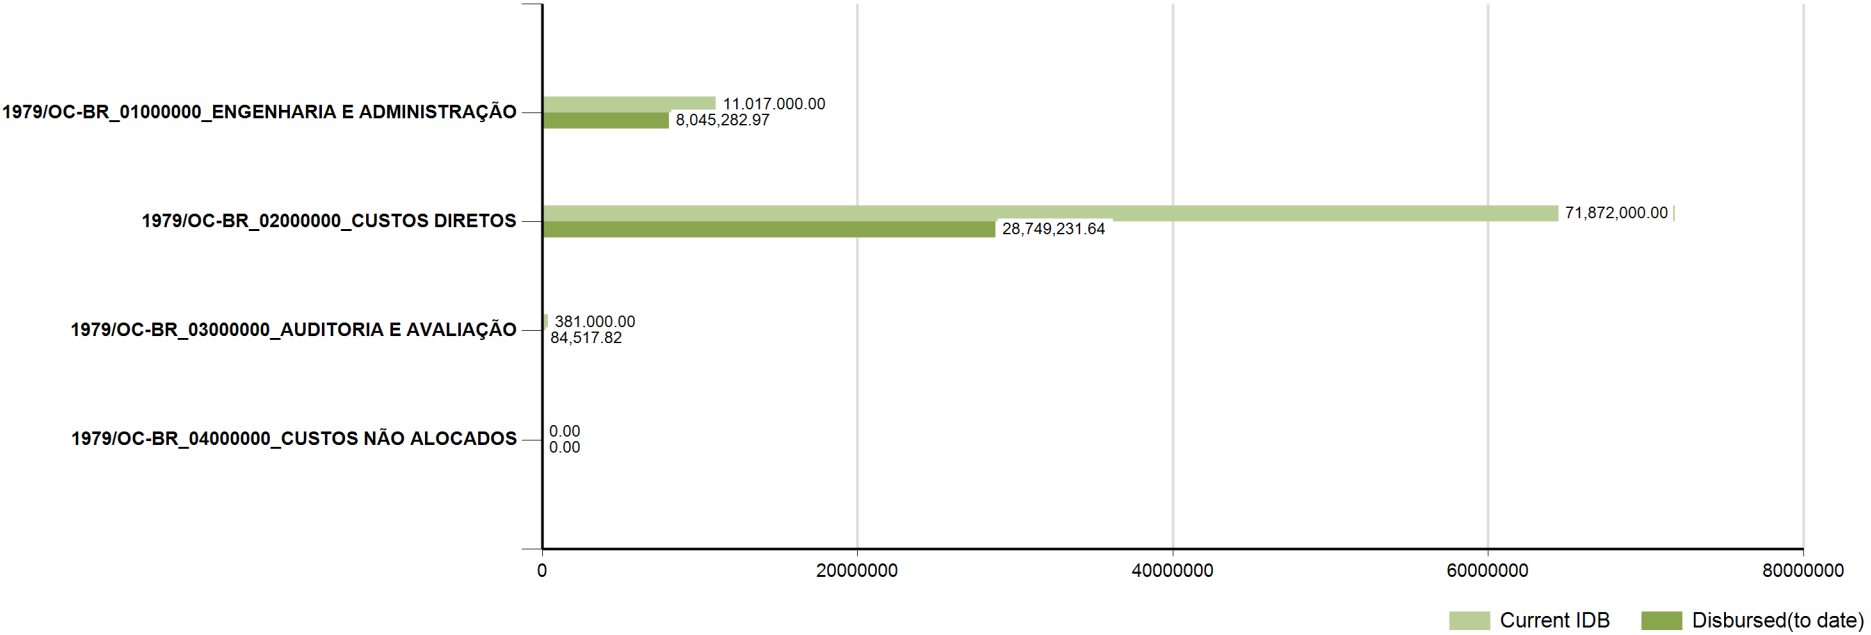

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Qualidade de vida da população do Município melhorada											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2010	2012	2016	2017	EOP
1.1 Índice de Desenvolvimento Socioeconômico da cidade de Porto Alegre		índice	0.75	2008	Informe oficial da Fundação de Economia e Estatística do Governo Estadual do Rio Grande do Sul - FEE		P	0.75	0.75			0.78
							P(a)	0.75	0.75		0.82	0.82
							A		0.75			
1.2 Internações por Leptospirose hepática viral do tipo A, em Porto Alegre		internações/ano	56.00	2008	Relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre	A Unidade de Medida considera casos de internação com diagnostico confirmado. A meta EOP e uma redução de 20% em relação a linha de base.	P		35.00			0.00
							P(a)		35.00		35.00	35.00
							A		56.00			

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Qualidade da Água do Lago Guaíba melhorada
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2012	2016	2017	EOP
1.1 Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 50		mg O2/l	1.20	2008	Modelo matemático do Lago Guaíba e acompanhamento da qualidade das águas do DMAE	O Marco Lógico tem como meta valores igual ou superior a 5. No entanto, a concentração, na data base (2008) é de 8,7 (média das medições do exercício). Desta forma, a meta foi ajustada para "superior a 8,8"	P					5.00
	P(a)								5.00	5.00		
	A											
1.2 Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 50		NMP/100ml	3,400.00	2008	Informe oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) com resultado de acompanhamento da qualidade das águas do lago Guaíba	indicado	P	2,000.00	1,900.00			150.00
	r calculado em base a modelo matemático utilizado pelo DMAE. A meta é alcançar Coliformes Fecais inferior a 150 NMP/100 ml					P(a)	2,000.00	1,900.00		150.00	150.00	
	A						3,400.00					

1.3 Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 46		mg/l	7.46	2008	Modelo matemático do Lago Guaíba e acompanhamento da qualidade das águas do DMAE	O Marco Lógico tem como meta valores igual ou superior a 5. No entanto, a concentração, na data base (2008) é de 7,45 (média das medições do exercício). Desta forma, a meta foi ajustada para "superior a 8,8"	P	0.00	0.00			5.00
	P(a)						0.00	0.00		8.80	8.80	
	A											
1.4 Concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) no ponto de coleta Estação 46		mg O2/l	0.60	2008	Informe oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) com resultado de acompanhamento da qualidade das águas do lago Guaíba	indicador calculado em base a modelo matemático utilizado pelo DMAE. A meta é alcançar DBO igual ou superior a 5mg/l.	P					15.00
	P(a)									5.00	5.00	
	A											
1.5 Concentração de coliformes fecais no ponto de coleta Estação 46		NMP/100ml	20,000.00	2008	Informe oficial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) com resultado de acompanhamento da qualidade das águas do lago Guaíba	Indicador calculado em base a modelo matemático utilizado pelo DMAE. A meta é alcançar Coliformes Fecais inferior a 150 NMP/100 ml	P					
	P(a)									150.00	150.00	
	A											

1.6 Concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) no ponto de coleta Estação 50		mg/l	7.70	2008	Modelo matemático do Lago Guaíba e acompanhamento de qualidade das águas do DMAE	O Marco Lógico tem como meta valores igual ou superior a 5. No entanto, a concentração, na data base (2008) é de 7,46 (média das medições do exercício). Desta forma, a meta foi ajustada para "superior a 8,8"	P					
							P(a)				8.80	8.80
							A					

Outcome:

2 Risco de inundações reduzido

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2012	2016	2017	EOP
2.1 Áreas de inundação ao longo do Rio Cavalhada, para um evento de recorrência de 10 anos		km2	0.66	2008	Monitoramento e Avaliação dos Programas	O Marco Lógico contém, como linha de base o valor de 0,85 km2, com referência ao ano de 2006. Entretanto, a linha de base, para 2008, ajustada é de 0,66.	P	0.85	0.85		0.00
							P(a)	0.66	0.66	0.00	0.00
							A		0.66		
2.2 Famílias reassentadas fora de áreas de risco		famílias	195.00	2008	Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Programas	As 195 famílias fazem parte do contingente de 1680 famílias	P		0.00		1,680.00
							P(a)		0.00	1,065.00	1,065.00
							A				

Outcome:	3 Qualidade ambiental urbana melhorada										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2012	2016	2017	EOP
3.1 Áreas de proteção ambiental e de lazer		hectares	0.00	2008	Sistema de Monitoramento e de Avaliação do Programa		P				30.00
	P(a)								12.50	12.50	
	A										
3.2 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		domicilios	0.00	2013	Relatório do DMAE de Porto Alegre		P				
	P(a)								30,000.00	30,000.00	
	A										

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Qualidade de agua		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Coletores de redes secundárias construídos (Sistema Cavallhada)	metro	P		61,592.00	P		15,728,787.73
		P(a)		63,500.00	P(a)		18,887,789.73
		A	0.00	65,913.00	A	0.00	16,546,899.64
Emissários terrestres implantados	metro	P		5,215.00	P		15,653,802.01
		P(a)		9,500.00	P(a)		15,651,689.01
		A	0.00	9,500.00	A	0.00	20,764,803.86
Emissários subaquático implantados	metro	P		8,087.00	P		19,135,987.65
		P(a)		11,000.00	P(a)		39,044,304.21
		A	0.00	11,000.00	A	0.00	39,034,127.67
Estação de Bombeamento Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluídas	estação	P		1.00	P		6,212,989.61
		P(a)		1.00	P(a)		6,340,989.61
		A	0.00	1.00	A	0.00	6,212,989.61
Estações de Bombeamento - EBEs C2 e Cristal (Cristal com chaminés de equilíbrio) concluídas	estação	P		2.80	P		9,601,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		9,602,000.00
		A	0.00	3.00	A	0.00	8,942,000.00
Desenvolvimento Urbano		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Arroio Cavallhada parcialmente canalizado	metro	P		2.00	P		4,184,000.00
		P(a)	120.00	620.00	P(a)	1,500,000.00	7,258,962.88
		A	60.00	560.00	A	267,684.44	6,123,367.88
Diques contra inundações construídos	km	P		1.00	P		5,770,000.00
		P(a)			P(a)		0.00
		A			A		0.00
Estações de bombeamento de esgotos construídas	estação	P		2.00	P		3,500,000.00
		P(a)		2.00	P(a)	800,000.00	10,080,645.49
		A	0.00	0.00	A	2,530,466.49	2,530,466.49
Interceptores e coletores pluviais implantados	metro	P		4.00	P		5,770,000.00
		P(a)	492.00	492.00	P(a)	850,000.00	850,000.00
		A	377.07	377.07	A	679,988.23	679,988.23
Vias pavimentadas	metro	P		1.52	P		2,557,000.00
		P(a)	0.00	1,300.00	P(a)	0.00	3,431,937.68
		A	0.00	0.00	A	977,317.68	977,317.68
Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	bônus	P		579.00	P		19,277,215.59
		P(a)	40.00	755.00	P(a)	1,200,000.00	17,180,365.40
		A	30.00	675.00	A	531,813.58	16,052,160.40
Imóveis construídos em áreas urbanizadas para o reassentamento da população	Domicílios	P		1,037.00	P		18,140,000.00
		P(a)		223.00	P(a)	0.00	2,122,185.23
		A	0.00	223.00	A	38,488.15	2,160,673.38
Pessoas instruídas em formação profissional	pessoa	P		1,680.00	P		1,500,000.00
		P(a)	33.00	320.00	P(a)	40,000.00	100,000.00
		A	11.00	188.00	A	0.00	0.00
Indenização de comércio (atividades econômicas)		P		0.00	P		0.00
		P(a)		74.00	P(a)		173,475.61
		A	7.00	37.00	A	7,919.31	105,085.61
Gestão Urbana e Proteção Ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP



Áreas municipais com riscos ambientais (incluindo as nascentes) identificadas, mapeadas e avaliadas	ha	P		1.00	P		274.00
		P(a)		0.00	P(a)	106,000.00	186,379.06
		A	12.50	12.50	A	67,745.62	67,745.62
Parque linear implantado	parque	P		1.00	P		1,935,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	367,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Área de nascentes de cursos de água protegidas	área	P		4.00	P		54,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro - projetada	unidade de conservação	P		1.00	P		60,000.00
		P(a)		10.00	P(a)	0.00	110,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Morro São Pedro elaborado.	plano	P		1.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	200,000.00	464,351.26
		A	0.00	0.00	A	89,298.26	89,298.26
Unidade de Fiscalização e Administração Zonal extremo sul implantada	unidade de fiscalização	P		1.00	P		736,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	10,000.00	858,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Pessoas instruídas em temas de educação sanitária e ambiental	pessoa	P		1,500.00	P		110,000.00
		P(a)	50.00	700.00	P(a)	0.00	55,000.00
		A	241.00	542.00	A	0.00	0.00
Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Estudos para a sustentabilidade financeira do DMAE e DEP (reforma tarifária DMAE, recuperação de custos DEP e sistema contábil DMAE e DEP) elaborados	estudo	P		2.00	P		1,337,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	200,000.00	234,180.28
		A	0.00	0.00	A	43,834.28	43,834.28
Planos operacionais do DEP, DEMHAB, SMOV, SMAM, SMCPGL desenvolvidos	plano	P		5.00	P		341,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	7,380.00
		A			A		7,380.00
Estudo para a implementação de Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento	estudo	P		1.00	P		322,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		272,085.42
		A	0.00	1.00	A	0.00	237,221.49
Engenharia Administração e outros		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Engenharia e Administração e outros	na	P		0.00	P		21,634,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		0.00
Obras de Reembolso de Recursos do Financiamento (Qualidade da água)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Emissário Final - Sistema Ponta da Cadeia (trechos terrestre e subaquático)	metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)		4,823.00	P(a)		7,699,403.30
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estações de Bombeamento - EBEs C2 e Cristal (Cristal com chaminés de equilíbrio) concluídas (Ponta da Cadeia)	unidade	P		0.00	P		0.00
		P(a)		2.00	P(a)		5,708,786.48
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Redes de Esgoto - Sistema Sarandi	metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)		100,770.00	P(a)		9,987,037.70
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Interceptores - Sistema Restinga	metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)		5,568.00	P(a)		2,475,248.03
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Emissário - Sistema Restinga	metros	P		0.00	P		0.00
		P(a)		4,500.00	P(a)		1,031,303.75
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Elevatórias - Sistema Restinga, Ponta Grossa 1 e 2, e Chapéu do Sol	unidade	P		0.00	P		0.00
		P(a)		4.00	P(a)		1,236,641.15
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estação de Bombeamento - Sistema Cavalhada	unidade	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		304,701.59
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost			2015	Cost
Engenharia e Administração	P			\$0.00
	P(a)		\$1,200,000.00	\$11,694,399.01
	A		\$1,634,683.68	\$9,037,020.57
Auditoria e Avaliação	P			\$0.00
	P(a)		\$18,000.00	\$247,620.00
	A		\$13,999.10	\$84,517.82
Contingência	P			\$0.00
	P(a)			\$0.00
	A		\$0.00	\$0.00
Outros custos de fortalecimento institucional e comunitário	P			\$0.00
	P(a)			\$542,338.23
	A		\$3,005.81	\$23,378.61
Total Cost			2015	Total Cost
	P			\$153,560,056.59
	P(a)		\$6,124,000.00	\$176,013,860.78
	A		\$6,886,244.63	\$129,720,277.10

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output		Unidade de Fiscalização e Administração Zonal extremo sul implantada	Modify Output name	Para melhor mensuração, o nome do produto foi alterado por solicitação do executor e acordado em reunião com o Banco.	3/15/2016	3/15/2016
Output		Interceptores e coletores pluviais implantados	Modify Financial P(a) value	Com proposta de reprogramação das metas em função da insuficiência de unidades habitacionais para o reassentamento de cerca de 700 famílias, que ocupam porção da área destinada às obras do PISA	3/15/2016	3/15/2016
Output		Estudo para a implementação de Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento	Modify Financial P(a) value	Trabalhos concluídos e quitados. Valores apurados pelo valor do contrato de elaboração convertido pelo dólar quando das solicitações de restituição dos valores do Fundo Rotativo.	3/15/2016	3/15/2016
Output		Estudos para a sustentabilidade financeira do DMAE e DEP (reforma tarifária DMAE, recuperação de custos DEP e sistema contábil DMAE e DEP) elaborados	Modify Financial P(a) value	A desvalorização cambial implicou em alteração no valor da meta quando convertido para dólares.	3/15/2016	3/15/2016
Output		Pessoas instruídas em temas de educação sanitária e ambiental	Modify Financial P(a) value	Parcerias firmadas para aproveitamento das políticas públicas existentes e em operação em Porto Alegre, em cooperação com a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, sem ônus para o Programa. Recursos mantidos para a estruturação de cursos e eventos específicos para atendimento à demanda da comunidade Pisa, na região de abrangência do programa. Metas futuras foram reprogramadas	3/15/2016	3/15/2016
Output		Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Morro São Pedro elaborado.	Modify Financial P(a) value	Meta alterada de acordo com a necessidade do projeto.	3/15/2016	3/15/2016

Output	Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro - projetada	Modify Financial P(a) value	Meta alterada de acordo com a necessidade do projeto.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Áreas municipais com riscos ambientais (incluindo as nascentes) identificadas, mapeadas e avaliadas	Modify Financial P(a) value	Meta alterada em função da alta do dólar	3/15/2016	3/15/2016
Output	Indenização de comércio (atividades econômicas)	Modify Financial P(a) value	Produto não incluído no PMR até 2015. Passou a constar e foi programado para o próximo exercício	3/15/2016	3/15/2016
Output	Pessoas instruídas em formação profissional	Modify Financial P(a) value	Produto muito flutuante e dependente da demanda da população. Alteração da meta para compatibilização das necessidades do programa.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Imóveis construídos em áreas urbanizadas para o reassentamento da população	Modify Financial P(a) value	Meta alterada para compatibilização com a realidade do Projeto.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	Modify Financial P(a) value	Produto muito flutuante e dependente da demanda da população. Alteração da meta para compatibilização das necessidades do programa.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Vias pavimentadas	Modify Financial P(a) value	Com proposta de reprogramação das metas em função da insuficiência de unidades habitacionais para o reassentamento de cerca de 700 famílias, que ocupam porção da área destinada às obras do PISA	3/15/2016	3/15/2016
Output	Estações de bombeamento de esgotos construídas	Modify Financial P(a) value	A meta foi alterada em função da alta do dólar.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Arroio Cavallhada parcialmente canalizado	Modify Financial P(a) value	Com proposta de reprogramação das metas em função da insuficiência de unidades habitacionais para o reassentamento de cerca de 700 famílias, que ocupam porção da área destinada às obras do PISA	3/15/2016	3/15/2016
Output	Estações de Bombeamento - EBEs C2 e Cristal (Cristal com chaminés de equilíbrio) concluídas	Modify Financial P(a) value	A meta foi incluída e salva de forma incorreta, porém já foi corrigida no sistema.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Estação de Bombeamento Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluídas	Modify Financial P(a) value	A meta foi incluída e salva de forma incorreta, porém já foi corrigida no sistema.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Emissários subaquático implantados	Modify Financial P(a) value	A meta foi incluída e salva de forma incorreta, porém já foi corrigida no sistema.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Emissários terrestres implantados	Modify Financial P(a) value	A meta foi incluída e salva de forma incorreta, porém já foi corrigida no sistema.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Coletores de redes secundárias construídos (Sistema Cavallhada)	Modify Financial P(a) value	A meta foi incluída e salva de forma incorreta, porém já foi corrigida no sistema.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Obras de Reembolso de Recursos do Financiamento (Qualidade da água)	Create Component	Foi criado um novo componente e produtos como melhor forma de mensuração do programa já que na última reunião de revisão de carteira o projeto terá obras reconhecidas.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Estação de Bombeamento - Sistema Cavallhada	Create Output	Foi criado um novo componente e produtos como melhor forma de mensuração do programa já que na última reunião de revisão de carteira o projeto terá obras reconhecidas.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Elevatórias - Sistema Restinga, Ponta Grossa 1 e 2, e Chapéu do Sol	Create Output	Foi criado um novo componente e produtos como melhor forma de mensuração do programa já que na última reunião de revisão de carteira o projeto terá obras reconhecidas.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Emissário - Sistema Restinga	Create Output	Foi criado um novo componente e produtos como melhor forma de mensuração do programa já que na última reunião de revisão de carteira o projeto terá obras reconhecidas.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Interceptores - Sistema Restinga	Create Output	Foi criado um novo componente e produtos como melhor forma de mensuração do programa já que na última reunião de revisão de carteira o projeto terá obras reconhecidas.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Redes de Esgoto - Sistema Sarandi	Create Output	Foi criado um novo componente e produtos como melhor forma de mensuração do programa já que na última reunião de revisão de carteira o projeto terá obras reconhecidas.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Estações de Bombeamento - EBEs C2 e Cristal (Cristal com chaminés de equilíbrio) concluídas (Ponta da Cadeia)	Create Output	Foi criado um novo componente e produtos como melhor forma de mensuração do programa já que na última reunião de revisão de carteira o projeto terá obras reconhecidas.	3/15/2016	3/15/2016

Output	Emissário Final - Sistema Ponta da Cadeia (trechos terrestre e subaquático)	Create Output	Foi criado um novo componente e produtos como melhor forma de mensuração do programa já que na última reunião de revisão de carteira o projeto terá obras reconhecidas.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Engenharia Administração e outros	Modify Component Name	Componente já existente. Erro já arranjado.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Pessoas instruídas em temas de educação sanitária e ambiental	Modify Physical P(a) value	Parcerias firmadas para aproveitamento das políticas públicas existentes e em operação em Porto Alegre, em cooperação com a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, sem ônus para o Programa. Recursos mantidos para a estruturação de cursos e eventos específicos para atendimento à demanda da comunidade PISA, na região de abrangência do programa. Metas futuras foram reprogramadas	3/15/2016	3/15/2016
Output	Unidade de Conservação Ambiental Morro de São Pedro - projetada	Modify Physical P(a) value	Meta alterada de acordo com a necessidade do projeto.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Áreas municipais com riscos ambientais (incluindo as nascentes) identificadas, mapeadas e avaliadas	Modify Physical P(a) value	A meta foi alterada por erro, mas já está com a quantidade atualizada e cumprida de 12.5	3/15/2016	3/15/2016
Output	Indenização de comércio (atividades econômicas)	Modify Physical P(a) value	Produto não incluído no PMR até 2015. Passou a constar e foi programado para o próximo exercício	3/15/2016	3/15/2016
Output	Pessoas instruídas em formação profissional	Modify Physical P(a) value	Produto muito flutuante e dependente da demanda da população. Alteração da meta para compatibilização das necessidades do programa.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Bônus para compra de imóveis entregues às famílias atingidas	Modify Physical P(a) value	Produto muito flutuante e dependente da demanda da população. Alteração da meta para compatibilização das necessidades do programa.	3/15/2016	3/15/2016
Output	Vias pavimentadas	Modify Physical P(a) value	Com proposta de reprogramação das metas em função da insuficiência de unidades habitacionais para o reassentamento de cerca de 700 famílias, que ocupam porção da área destinada às obras do PISA	3/15/2016	3/15/2016
Output	Interceptores e coletores pluviais implantados	Modify Physical P(a) value	Com proposta de reprogramação das metas em função da insuficiência de unidades habitacionais para o reassentamento de cerca de 700 famílias, que ocupam porção da área destinada às obras do PISA	3/15/2016	3/15/2016
Output	Arroio Cavallhada parcialmente canalizado	Modify Physical P(a) value	Com proposta de reprogramação das metas em função da insuficiência de unidades habitacionais para o reassentamento de cerca de 700 famílias, que ocupam porção da área destinada às obras do PISA	3/15/2016	3/15/2016
Output	Coletores de redes secundárias construídos (Sistema Cavallhada)	Modify Physical P(a) value	A meta foi incluída e salva de forma incorreta, porém já foi corrigida no sistema.	3/15/2016	3/15/2016
Outcome	Áreas de proteção ambiental e de lazer	Modify EOP P(a)	As áreas de lazer e de proteção ambiental decorrentes do PISA foram reduzidas. O parque linear previsto para as margens do Arroio Cavallhada e a Unidade de Conservação do Morro São Pedro totalizam 12,5 ha.	3/14/2016	3/14/2016
Outcome	Famílias reassentadas fora de áreas de risco	Modify EOP P(a)	O número de famílias diminuiu de acordo com as necessidades do projeto	3/14/2016	3/14/2016
Impact	Internações por Leptospirose hepática viral do tipo A, em Porto Alegre	Modify EOP P(a)	A Unidade de Medida considera casos de internação com diagnóstico confirmado. A meta proposta em 2008 para o EOP era a redução de 20% em relação a linha de base. Como a meta foi superada em 2014, ajustou-se para uma redução de 35% em relação aos valores medidos na data base.	3/14/2016	3/14/2016
Impact	Índice de Desenvolvimento Socioeconômico da cidade de Porto Alegre	Modify EOP P(a)	A meta inicial era de 0,78 e foi atingida e superada em 2012. Adotou-se a manutenção da meta em 0,82.	3/14/2016	3/14/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
