
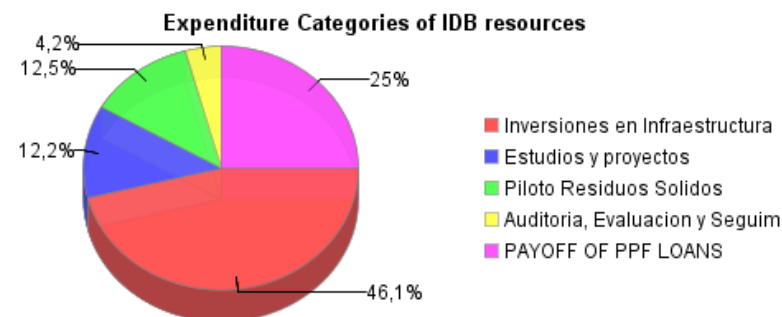
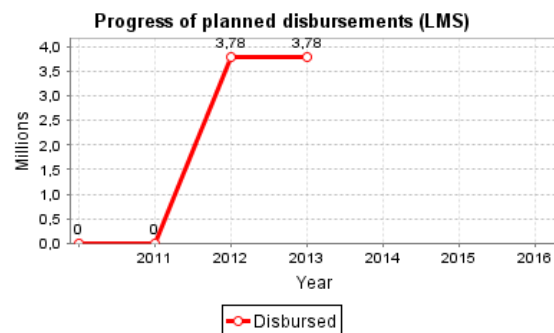



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SERVICIO NACIONAL SANEAMIENTO AMBIENTAL				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	2222/OC-PR	Current Approved Amount:	12.000.000,00	Original IDB:	12.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.778.195,11	Current IDB:	12.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	31,48	Pari-passu:	60,00
Related Operation(s):	PR-X1003	Balance:	8.221.804,89	Co-Financing/Country:	8.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	20.000.000,00
				Amortization Period (months):	215

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 17-sep-2013 Validated by Country Representative: 17-sep-2013

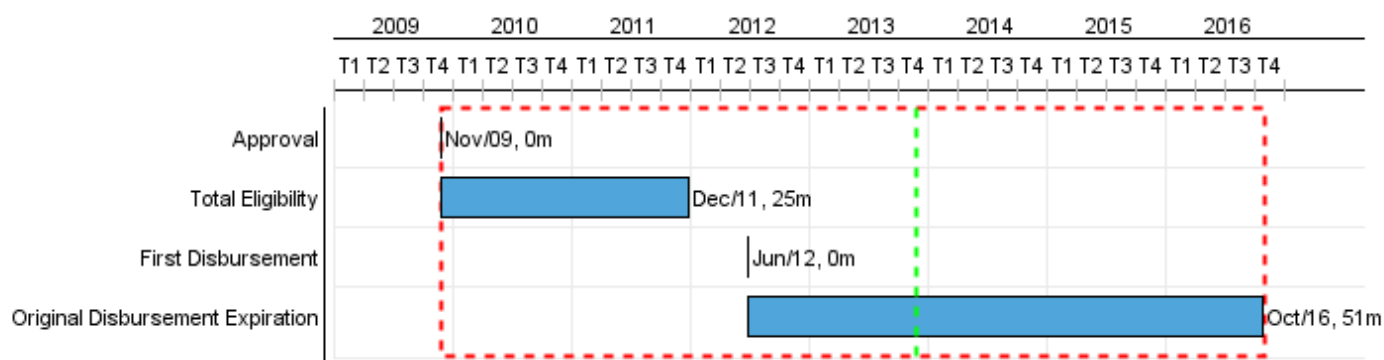

## Accumulated Progress as of 2013

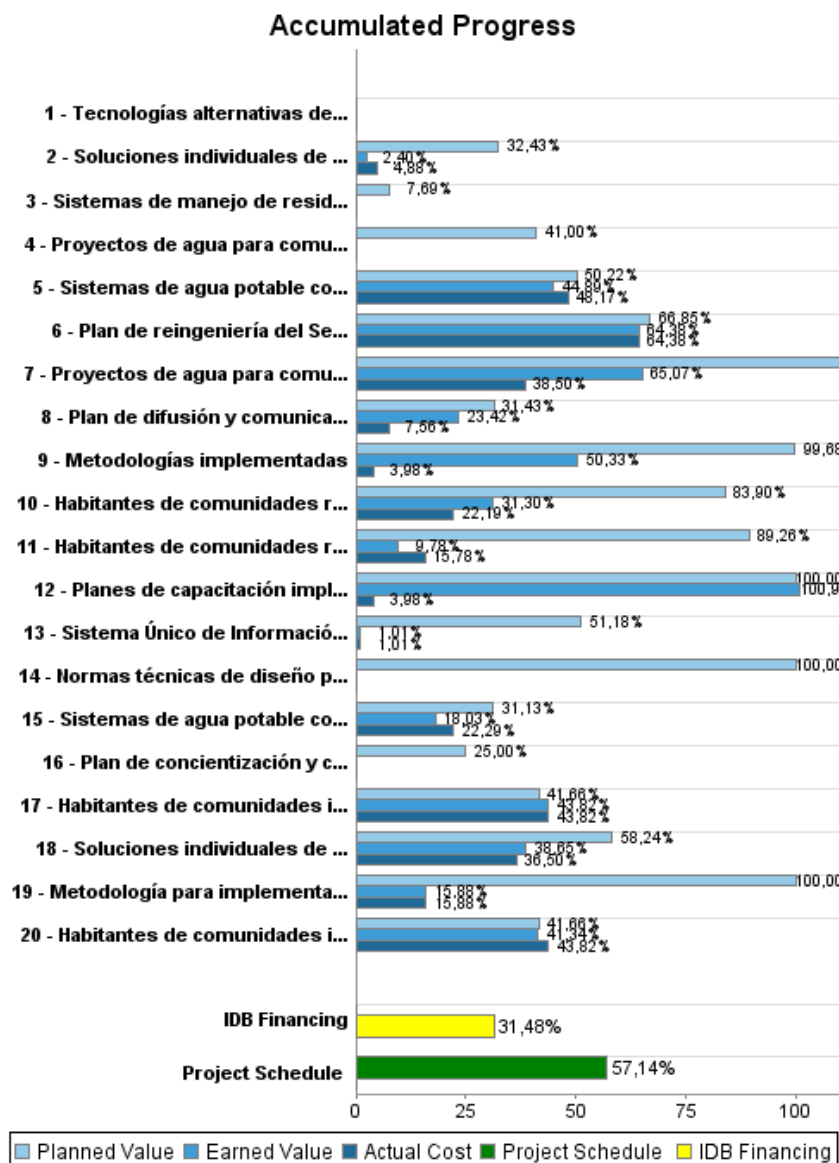

## Outcomes

**Outcome:** Cobertura de los servicios de agua potable en el área rural, incrementada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Cobertura de agua potable en el área rural (atribuible al programa)	porcentaje	49,20	2008	P						50,52	50,52
				A		49,64					
Habitantes con acceso a agua potable en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes (atribuible al programa)	habitantes		2009	P	3.710,00	31.595,00	6.885,00	43.788,00	34.022,00		120.000,00
				A	3.710,00	31.595,00	5.540,00				
Habitantes con acceso a agua mejorada en comunidades indígenas menores de 2.000 habitantes (atribuible al programa)	habitantes		2009	P	718,00	504,00	2.194,00		1.250,00	1.334,00	6.000,00
				A	718,00	504,00					
Hogares con acceso a agua potable en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes (atribuible al programa)	Hogares		2009	P	742,00	6.330,00	1.377,00	9.605,00	5.946,00		24.000,00
				A	742,00	6.330,00	1.108,00				
Hogares con acceso a agua mejorada en comunidades indígenas menores de 2.000 habitantes (atribuible al programa)	Hogares		2009	P	113,00	116,00	312,00		313,00	347,00	1.200,00
				A	113,00	116,00					

**Outcome:** Juntas de Saneamiento en comunidades rurales y Comisiones de Saneamiento u otras estructuras comunitarias similares en comunidades indígenas; operativas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Juntas de Saneamiento en comunidades rurales que operan los sistemas construidos por el programa	juntas		2009	P	8,00	60,00	11,00	72,00	75,00		226,00
				A	8,00	60,00	8,00				
Comisiones de saneamiento en comunidades indígenas que operan los sistemas construidos por el Programa.	comisiones		2009	P	2,00	1,00	6,00		15,00	16,00	40,00
				A	2,00	1,00					
Mujeres que participan como miembro de las Juntas de Saneamiento	mujeres		2009	P	9,00	101,00		162,00	169,00	67,00	508,00
				A	9,00	101,00					
Juntas y Comisiones de Saneamiento que piden apoyo para la operación y mantenimiento de los sistemas	porcentaje	60,00	2009	P						25,00	25,00
				A							

**Outcome:** Planes de manejo de residuos sólidos en comunidades rurales, implementados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Habitantes con acceso a sistemas de	habitantes			P					1.725,00	1.725,00	3.450,00

recolección y disposición final de residuos sólidos en comunidades rurales.				A							
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Outcome:</b>	Capacidad fiduciaria y de ejecución del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental fortalecida.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Juntas y Comisiones de Saneamiento creadas por año por cada 100 funcionarios del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental.	Juntas/comisiones	10,00	2009	P A						50,00	50,00
Juntas y Comisiones de Saneamiento asistidas por año por cada 100 funcionarios del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental.	juntas/comisiones	20,00	2009	P A						100,00	100,00
Proyectos que aplican las normas de diseño actualizadas	porcentaje		2009	P A				50,00	100,00	100,00	100,00
Proyectos en comunidades dispersas con tecnologías alternativas	proyectos		2009	P A				5,00	5,00		10,00

<b>Outcome:</b>	Cobertura de los servicios de saneamiento en el área rural, incrementada
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Cobertura de saneamiento básico en el área rural (atribuible al programa)	porcentaje	37,10	2008	P A		37,50	37,61			39,18	39,18
Habitantes con acceso a saneamiento básico en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes	habitantes		2009	P A	3.440,00 3.440,00	20.380,00 20.380,00	14.475,00 4.766,00	36.320,00	35.385,00		110.000,00
Habitantes con acceso a saneamiento básico en comunidades indígenas menores de 2.000 habitantes	habitantes		2009	P A			2.194,00		1.900,00	1.906,00	6.000,00
Hogares con acceso a saneamiento básico en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes	Hogares		2009	P A	688,00 688,00	4.076,00 4.076,00	2.895,00 966,00	7.264,00	7.077,00		22.000,00
Hogares con acceso a saneamiento básico en comunidades indígenas menores de 2.000 habitantes	Hogares		2009	P A			267,00		400,00	533,00	1.200,00
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	hogares		2012	P A			2.895,00 966,00	7.264,00	7.077,00		22.000,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Inversiones en infraestructura</b>									
Sistemas de agua potable construidos en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes en operación	sistemas	11,00	8,00		226,00	4.113.960,00	6.096.179,54		26.240.268,00
Sistemas de agua potable construidos en comunidades indígenas	sistemas	6,00			40,00	190.697,00	5.989,90		3.394.572,00
Soluciones individuales de saneamiento básico construidos en comunidades rurales menores de 2.000 habitantes.	soluciones individuales	2.895,00	966,00		22.000,00	3.393.879,00	2.482.959,16		14.245.369,00
Soluciones individuales de saneamiento básico construidos en comunidades indígenas	soluciones individuales	267,00			1.200,00	127.132,00	3.993,26		1.838.462,00
<b>Preparación de proyecto y desarrollo comunitario</b>									
Metodologías implementadas	metodologías				2,00		377,81		38.500,00
Planes de capacitación implementados	planes				4,00	35.000,00	686,93		70.000,00
Proyectos de agua para comunidades rurales, concluidos	proyectos	75,00			226,00	1.242.441,00	331.903,35		1.749.764,00
Proyectos de agua para comunidades indígenas concluidos	proyectos				40,00	86.408,00			210.751,00
Habitantes de comunidades rurales que integran las Juntas de Saneamiento capacitados en las áreas	habitantes	426,00	273,00		1.356,00	181.130,00	21.482,71		370.854,00
Habitantes de comunidades indígenas que integran las Comisiones de Saneamiento capacitados en las áreas legales, técnicas, contables y financieras	habitantes				240,00	3.296,00	4.120,83		38.175,00
Habitantes de comunidades rurales capacitados en aspectos de salud, higiene, uso racional de agua, equidad de género y protección de fuentes de agua.	habitantes	38.480,00	6.047,00		120.000,00	499.682,00	33.066,68		802.920,00
Habitantes de comunidades indígenas capacitados en aspectos de salud, higiene, uso racional de agua, equidad de género y protección de fuentes de agua.	habitantes	2.194,00	2.113,00		6.000,00	6.352,00	7.942,11		73.575,00
<b>Programa piloto de manejo de residuos sólidos</b>									
Metodología para implementar planes de manejo de residuos sólidos en comunidades rurales desarrollada	metodología				1,00	15.000,00	4.763,08		30.000,00

# PROGRESS MONITORING REPORT

PR-L1022 - Water and Sanitation Program for Rural and Indigenous Communities (PAYSRI)

2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 13/09/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Sistemas de manejo de residuos sólidos implementados comunidades rurales en operación	sistemas				10,00	150.000,00			1.950.000,00
Plan de concientización y capacitación dirigidos a las comunidades rurales sobre el manejo de los residuos sólidos implementado	plan				1,00	5.000,00			20.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental</b>									
Plan de reingeniería del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementado	plan				1,00	330.000,00	670.012,00		1.563.135,00
Sistema Único de Información para el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementado	sistema				1,00	190.000,00			1.342.312,00
Normas técnicas de diseño para sistemas de agua potable y saneamiento actualizadas	normas técnicas				1,00				150.000,00
Tecnologías alternativas de provisión de agua en comunidades dispersas desarrolladas	tecnologías alternativas				1,00				150.000,00
Plan de difusión y comunicación del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental implementado	plan	1,00	1,00		1,00	100.000,00	30.661,96		437.146,00
<b>Addministración, costos concurrentes y costos financieros</b>									
Administración	N/A					682.600,00	558.097,00		3.262.925,00
Auditoria, evaluación y seguimiento	N/A					91.000,00			521.275,00
Costos financieros	N/A					300.000,00	36.594,33		1.500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>11.743.577,00</b>	<b>10.288.830,65</b>		<b>60.000.003,00</b>
