



Operation Number: **GU-L1023**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/3/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/14/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	My School is Making Progress	Loan Number:	2018/OC-GU,2018/OC-GU-1,2018/OC-GU-2,2018/OC-GU-3
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION DE GUATEMALA ,MINISTERIO DE EDUCACION DE GUATEMALA ,MINISTERIO DE COMUNICACIONES TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS,MINISTERIO DE EDUCACION DE GUATEMALA		
Team Leader:	Morduchowicz,Alejandro	Sector/Subsector:	ED
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	GUATEMALA
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA ,REPUBLICA DE GUATEMALA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
GU-L1023	\$150,000,000.00	\$150,000,000.00	\$0.00		\$150,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
GU-L1023	\$150,000,000.00	\$111,956,252.41	74.64%	\$38,043,747.59


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

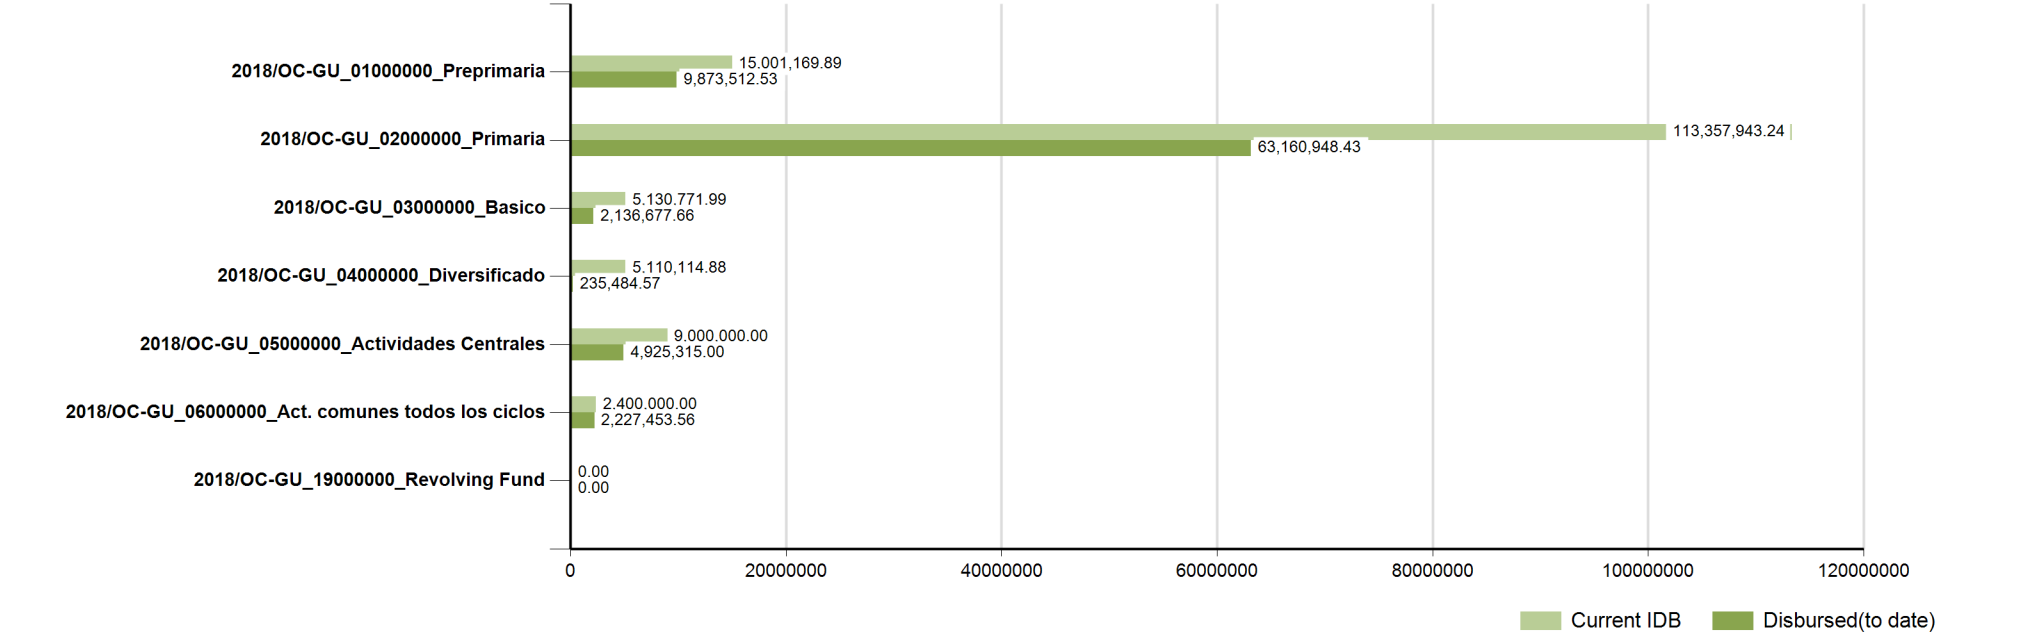


Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Calidad de la educación preprimaria y primaria en Guatemala mejorada.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Cobertura neta de preprimaria (5 y 6 años) en los 166 municipios focalizados		Tasa	0.39	2011	Construcción de nuevas escuelas		P	0.65
	P(a)						0.52	
	A							
1.2 Incorporación en edad apropiada (7 años o menor) a la primaria en los 166 municipios focalizados		Tasa	0.84	2011	Registros administrativos		P	0.89
	P(a)						0.88	
	A							
1.3 Promoción anual de 1º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados		Tasa	0.68	2011	Registros administrativos		P	0.80
	P(a)						0.75	
	A							
1.4 Promoción anual de 2º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados		Tasa	0.77	2011	Registros administrativos		P	0.80
	P(a)						0.80	
	A							
1.5 Promoción anual de 3º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados		Tasa	0.82	2011	Registros administrativos		P	0.80
	P(a)						0.84	
	A							
1.6 Deserción de 1º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados		Tasa	0.07	2011	Registros administrativos		P	0.05
	P(a)						0.05	
	A							
1.7 Deserción de 2º grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados		Tasa	0.04	2011	Registros administrativos		P	0.03
	P(a)						0.03	
	A							

1.8 Logro en las pruebas en competencias básicas de lectoescritura y matemática en 1º y 3º grado en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/12)		Porcentaje	0.00	2014	Registro de las pruebas evaluadas	Esta meta se levantará en el 2012	P	60.00
							P(a)	5.00
							A	
1.9 Docentes con dominio del idioma de la comunidad trabajando en los tres primeros grados de la primaria en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/13)		Porcentaje	0.00	2013	Registros administrativos	Esta meta se levantará en el 2013	P	45.00
							P(a)	50.00
							A	
1.10 Tiempo de clase efectivos en las escuelas de los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/2013)		Dias	132.00	2013	Reporte de maestros de días impartidos de clase	Esta meta se levantará en 2013	P	132.00
							P(a)	180.00
							A	
1.11 Niños y niñas beneficiados por la rehabilitación de escuelas	 RF-C	Students (#)	0.00	2011	Informes de matriculación		P	48,000.00
							P(a)	48,000.00
							A	
1.12 Deserción de 3er grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados		Tasa	0.04	2011	Registros administrativos		P	
							P(a)	0.03
							A	

 RF - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Mejoramiento de la infraestructura escolar		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Aulas construidas de preprimaria	Aulas	P	170.00	682.00	P	10,000,000.00	40,000,000.00
		P(a)	300.00	347.00	P(a)	5,400,000.00	12,910,865.31
		A	0.00	47.00	A	0.00	1,210,865.31
Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones menores - OPF)	Escuelas	P	250.00	1,028.00	P	11,250,000.00	45,000,000.00
		P(a)	0.00	28.00	P(a)	0.00	0.00
		A		28.00	A		
Construccion, reparación, ampliación y equipamiento de otros niveles educativos.	Escuelas	P		5.00	P		10,000,000.00
		P(a)	0.00	7.00	P(a)	0.00	2,155,591.72
		A	0.00	7.00	A	0.00	2,155,591.72
Aulas construidas de primaria	Aulas	P	60.00	302.00	P	3,000,000.00	10,000,000.00
		P(a)	0.00	62.00	P(a)	0.00	0.00
		A		62.00	A		
Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones intermedias)	Escuelas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	142.00	P(a)	0.00	1,763,220.59
		A	0.00	142.00	A	0.00	1,763,220.59
Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones mayores - Emergencia)	Escuelas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	35.00	100.00	P(a)	5,000,000.00	25,973,587.29
		A	0.00	35.00	A	0.00	6,170,705.74
Mobiliario escolar	Escuelas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	600.00	600.00	P(a)	1,000,000.00	6,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones menores - OPF)	Escuelas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	17.00	3,363.00	P(a)	170,000.00	20,576,982.00
		A	0.00	3,346.00	A	0.00	20,406,982.00
Aulas construidas de primaria	Aulas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	300.00	421.00	P(a)	5,400,000.00	26,734,168.32
		A	0.00	121.00	A	0.00	6,834,168.32
Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Docentes de primer ciclo de primaria recibiendo capacitacion y acompañamiento en lectoescritura y matematicas en los 166 municipios focalizados.	Teachers (#)	P	2,000.00	11,000.00	P	3,271,852.00	13,721,209.00
		P(a)	0.00	15,774.00	P(a)	0.00	898,512.03
		A	0.00	15,774.00	A	0.00	898,512.03
Escuelas monolingües y bilingües con bibliotecas escolaes en los 166 municipios focalizados.	Escuelas	P		41,600.00	P		18,298,862.00
		P(a)	10,000.00	27,800.00	P(a)	2,200,000.00	28,716,601.18
		A	0.00	27,800.00	A	0.00	26,516,601.18
Desarrollo e implementacion de evaluaciones didácticas en lengua y matemáticas en los tres primeros grados de las escuelas de los 166 municipios focalizados realizadas periódicamente.	Evaluaciones	P	1.00	4.00	P	250,000.00	1,620,233.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	739,866.33
		A	0.00	3.00	A	0.00	739,866.33
Sistema de caracterizacion sociolinguistica de 6000 escuelas rurales.	Escuelas	P		6,000.00	P		100,000.00
		P(a)	0.00	4,170.00	P(a)	0.00	190,412.24
		A	0.00	4,170.00	A	0.00	190,412.24
Diseño del sistema de seguimiento para la asistencia docente y el cumplimiento del calendario escolar.	Sistema	P		1.00	P		40,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Implementacion del piloto del sistema de seguimiento para la asistencia docente y el cumplimiento del calendario escolar, en 500 escuelas beneficiarias por el programa.	Escuelas	P		500.00	P	20,000.00	220,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Implementacion del Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar	Escuelas	P		27,800.00	P		2,000,000.00
		P(a)	0.00	22,240.00	P(a)	0.00	1,892,822.99
		A	0.00	22,240.00	A	0.00	1,892,822.99
Administración							

Other Cost			2016	Cost
Adminstración del Programa	P		\$1,774,000.00	\$9,000,000.00
	P(a)		\$1,500,000.00	\$9,000,000.00
	A		\$215,610.00	\$5,241,259.21
Gastos incurridos entre 2009 y 2012 que no pudieron asignarse en su momento debido a la naturaleza por resultados del programa	P			
	P(a)			\$0.00
	A			\$12,447,370.00
Total Cost			2016	Total Cost
	P		\$29,565,852.00	\$150,000,304.00
	P(a)		\$20,670,000.00	\$150,000,000.00
	A		\$215,610.00	\$86,468,377.66

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
