



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE		
Sector:	TRANSPORTATION-RURAL ROADS		
Número(s) de Préstamo:	2098/OC-CR	Monto Aprobado Actual: 60.000.000,00	BID Original: 60.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 60.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 80,00
Operación(es) Relacionada(s):	CR-L1022, CR-X1007	Saldo: 60.000.000,00	Co-financiamiento/País: 15.000.000,00
Subtipo de Operación:	CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Condicional Proyectos de Inversión)		Estimado Original: 75.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 23, 2011 Validado por Representante de País: Nov 7, 2011

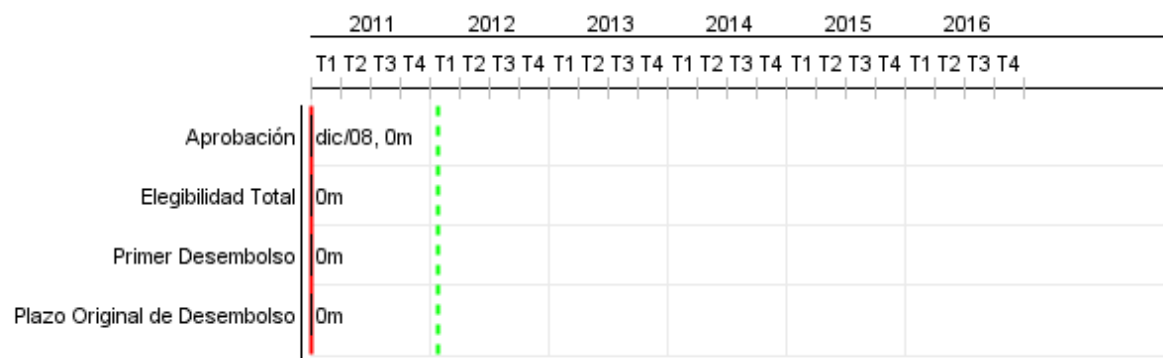

**Progreso Acumulado al 2011**

## Progreso Acumulado



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Tiempo de no transitabilidad en los caminos de la RVC intervenida disminuido
<b>Supuestos:</b>	Los gobiernos locales presentan propuestas de proyecto para la mejora de caminos cantonales

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Disminución promedio del tiempo de no transitabilidad en las vías de la RVC intervenidas	%		2010	P A	6,00	12,00	16,00	18,00	20,00	80,00

<b>Resultado:</b>	Tiempo de viaje en los caminos de la RVC intervenida reducido
<b>Supuestos:</b>	Las condiciones mejoradas de las vías inciden en un menor tiempo de viaje de los usuarios

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Tiempo de viaje medio en un recorrido de 15 km en una vía de la RVC intervenida	min	40,00	2010	P A					32,00	32,00

<b>Resultado:</b>	Tránsito en las vías de la RVC intervenida aumentado
<b>Supuestos:</b>	Las mejores condiciones de las vías generan mayor cantidad de viajes

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Aumento del volumen de tránsito en las vías intervenidas	%		2010	P A	6,00	12,00	16,00	18,00	20,00	20,00

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Ingeniería</b>									
Estudios de ingeniería para la Red Vial Cantonal (RVC) elaborados.	km				500,00				2.400.000,00
<b>Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión</b>									
Planes de inversión Vial Participativos realizados	Planes				90,00				
Profesionales de las Unidades Técnicas de Gestión Municipal capacitados en los temas técnicos, ambientales, sociales, financiero y de adquisición del Programa	Profesionales				180,00				7.850.000,00
Unidades de Gestión Ambiental y Social (UGAS) implementadas o fortalecidas	unidades				90,00				
Manuales de rehabilitación de caminos actualizados	Manuales				90,00				
<b>Obras civiles</b>									
Caminos rehabilitados	km				500,00				53.250.000,00
Caminos conservados	km				1.300,00				3.000.000,00
Piloto de mantenimiento ejecutado	km				150,00				750.000,00
<b>Otros (Administración)</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>67.250.000,00</b>
