
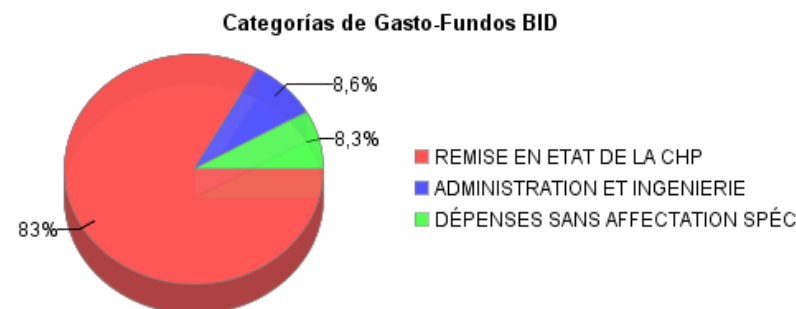
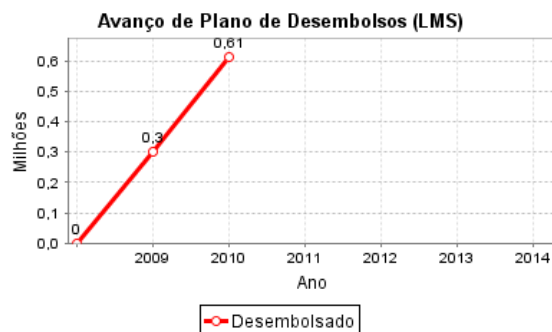



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	
Sector:	ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY	
Número da Operação:	2073/GR-HA	Atual: 12.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado: 614.683,28
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 4,92
Operação Relacionada:	HA-L1038	Saldo: 11.885.316,72
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation	Original BID: 12.500.000,00
		Corrente BID: 12.500.000,00
		Pari-passu: 100,00
		Cofinanciamento/País:
		Original Estimado: 12.500.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 18, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 27, 2011

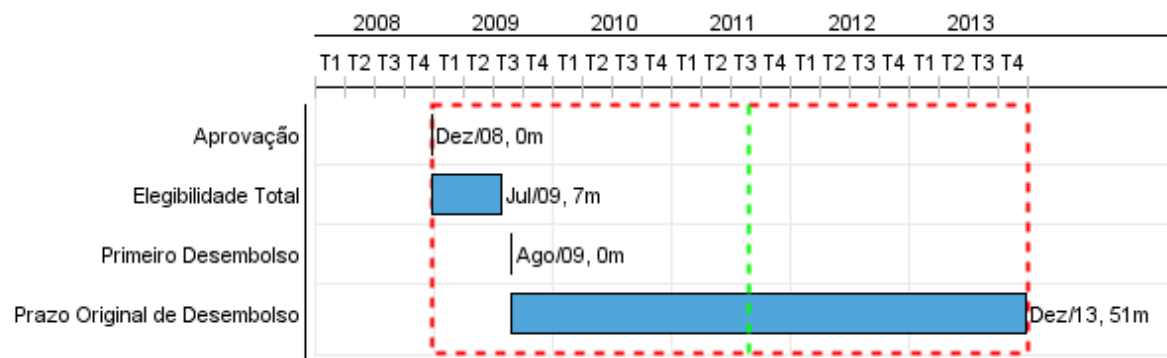

Progresso Acumulado até 2010

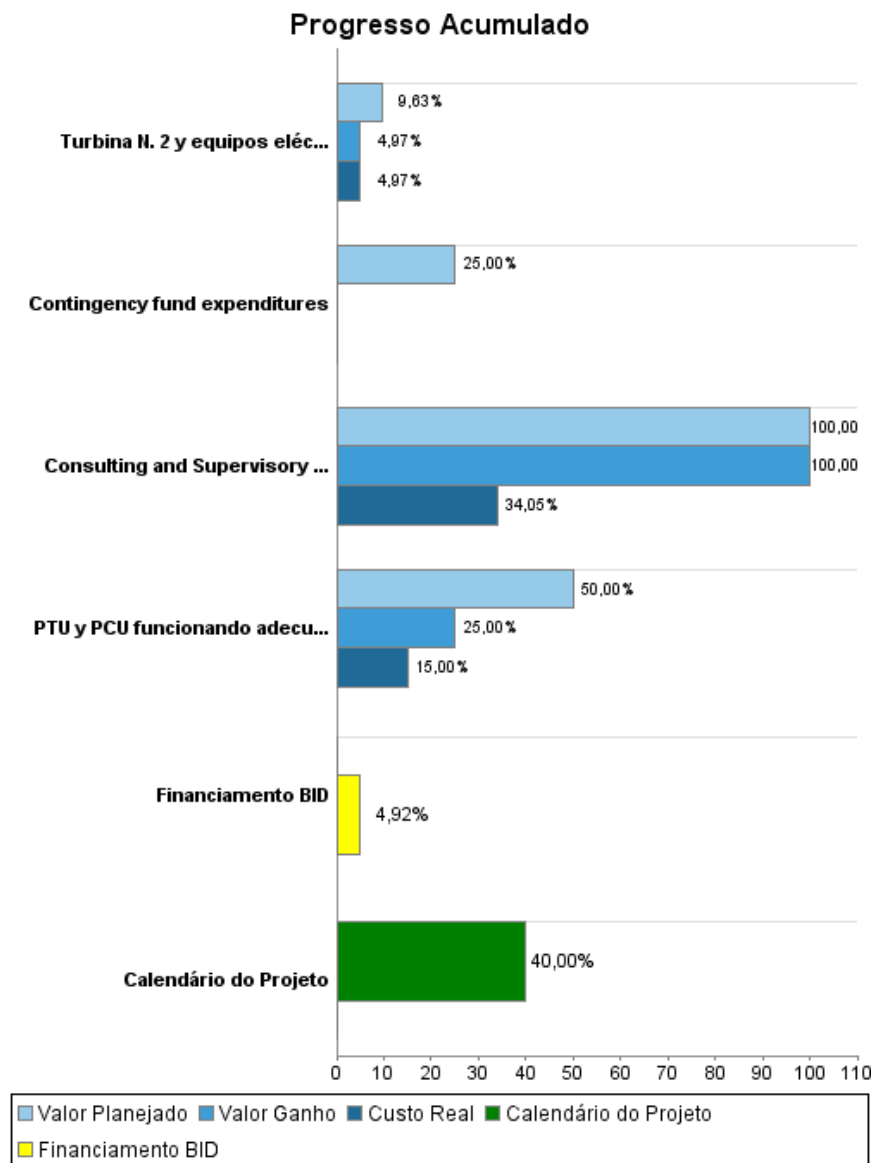

Resultados

Resultado:	Electrical generation capacity in Haiti recovered
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2014	Final do Projeto
Availability of the all three 18 MW generating units	number	2,00	2009	P A	2,00	3,00	3,00
Availability of the maximum plant generating capacity of 54 MW	MW	22,00	2009	P A	22,00	54,00	54,00
Increment the plants nominal energy generating capacity.	GWh	163,00	2009	P A	163,00	225,00	225,00
The amount of energy not delivered to the system due to lack of transmission capacity	GWh	62,00	2009	P A	62,00		0,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - Inversiones en la rehabilitación en los elementos electromecánicos y de transformación de energía de la CHP									
Turbina N. 2 y equipos eléctricos comunes de la CHP rehabilitados	MW				18,00	500.000,00	216.000,00		10.380.000,00
Componente III - Ingeniería y Administración									
PTU y PCU funcionando adecuadamente	unidad	1,00	1,00		1,00	50.000,00	45.000,00		300.000,00
Consulting and Supervisory Firm	Number	1,00	1,00		1,00	500.000,00	45.567,00		780.000,00
Unallocated Expenses									
Contingency fund expenditures	number	260.000,00			1.040.000,00	260.000,00			1.040.000,00
TOTAL						1.310.000,00	306.567,00		12.500.000,00
