
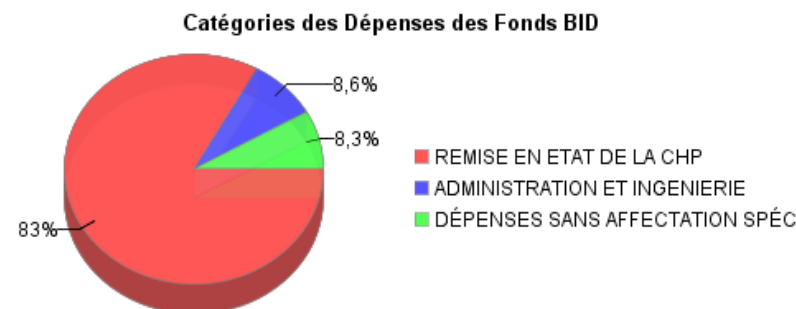
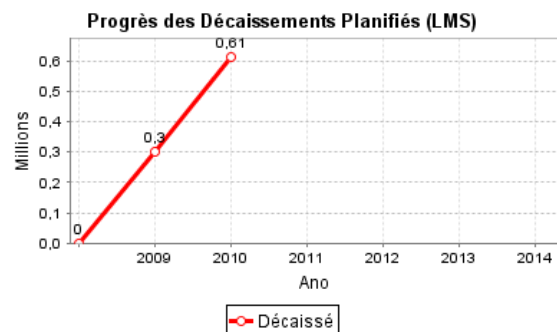



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS				
Secteur:	ENERGY-HYDROELECTRIC ENERGY				
Numéro(s) de Prêt(s):	2073/GR-HA	Montant Courant Approuvé:	12.500.000,00	Initial BID:	12.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	614.683,28	Courant BID:	12.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	4,92	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	HA-L1038	Solde:	11.885.316,72	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	12.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Apr 18, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 27, 2011

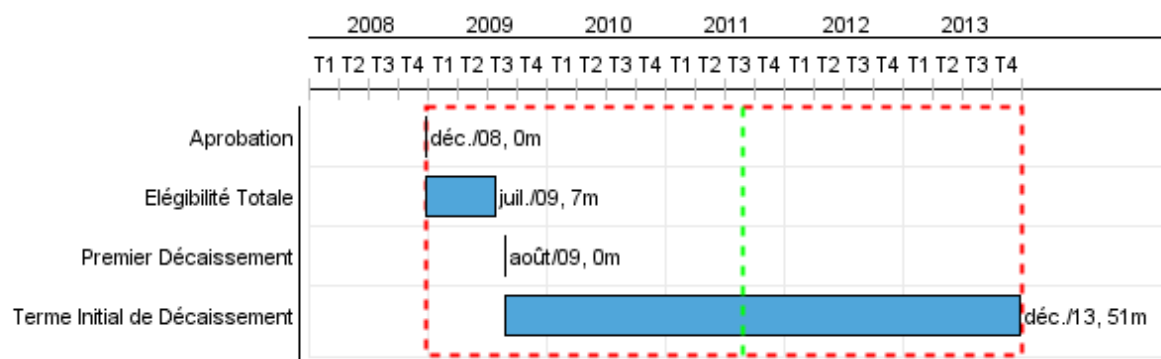

Progrès Cumulé à 2010

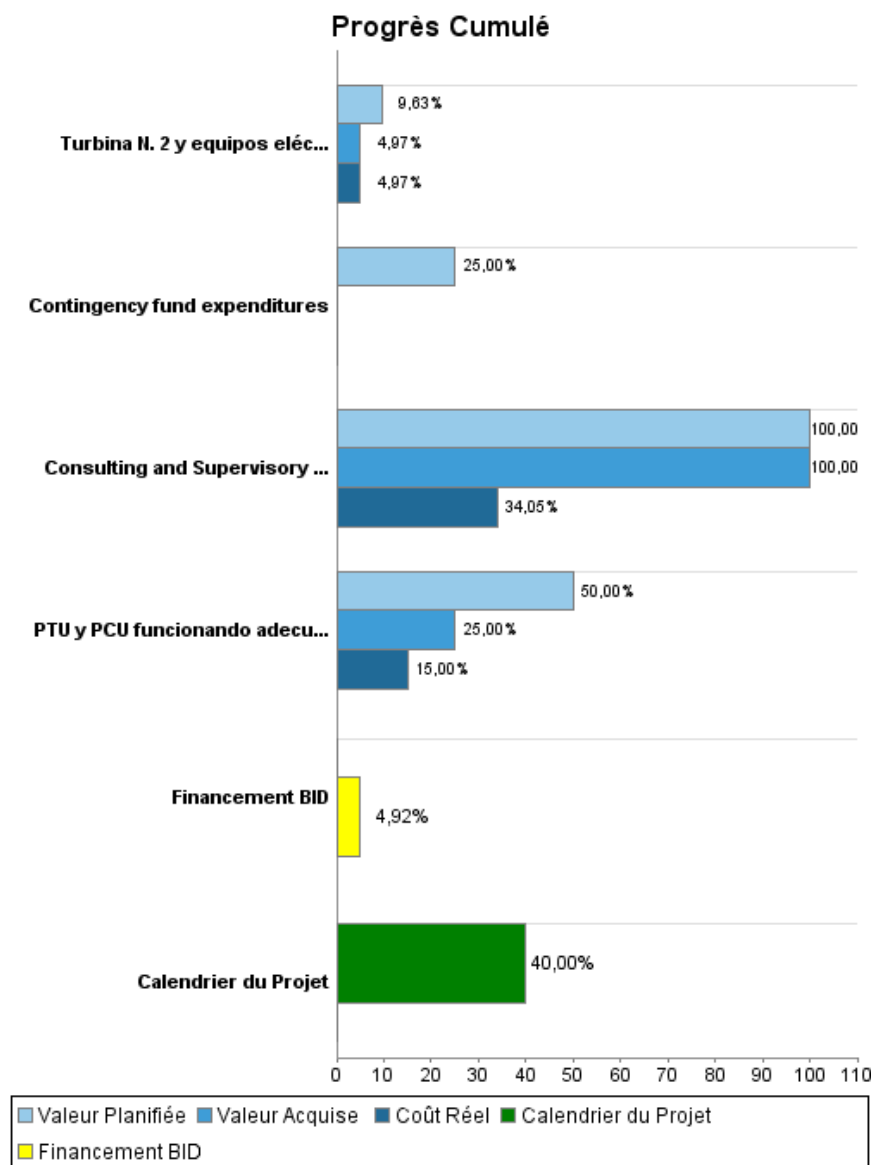

Résultats

Résultat:	Electrical generation capacity in Haiti recovered
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2014	Fin du Projet
Availability of the all three 18 MW generating units	number	2,00	2009	P A	2,00	3,00	3,00
Availability of the maximum plant generating capacity of 54 MW	MW	22,00	2009	P A	22,00	54,00	54,00
Increment the plants nominal energy generating capacity.	GWh	163,00	2009	P A	163,00	225,00	225,00
The amount of energy not delivered to the system due to lack of transmission capacity	GWh	62,00	2009	P A	62,00		0,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I - Inversiones en la rehabilitación en los elementos electromecánicos y de transformación de energía de la CHP									
Turbina N. 2 y equipos eléctricos comunes de la CHP rehabilitados	MW				18,00	500.000,00	216.000,00		10.380.000,00
Componente III - Ingeniería y Administración									
PTU y PCU funcionando adecuadamente	unidad	1,00	1,00		1,00	50.000,00	45.000,00		300.000,00
Consulting and Supervisory Firm	Number	1,00	1,00		1,00	500.000,00	45.567,00		780.000,00
Unallocated Expenses									
Contingency fund expenditures	number	260.000,00			1.040.000,00	260.000,00			1.040.000,00
TOTAL						1.310.000,00	306.567,00		12.500.000,00
