
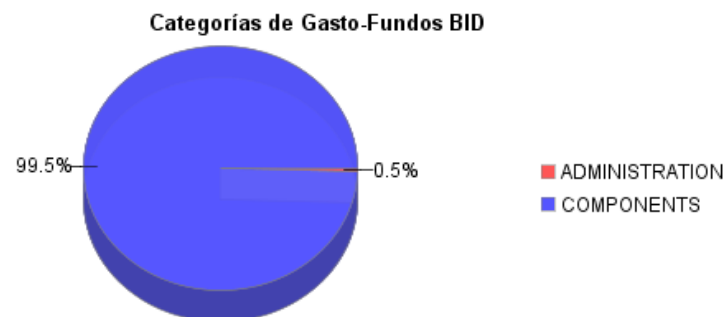
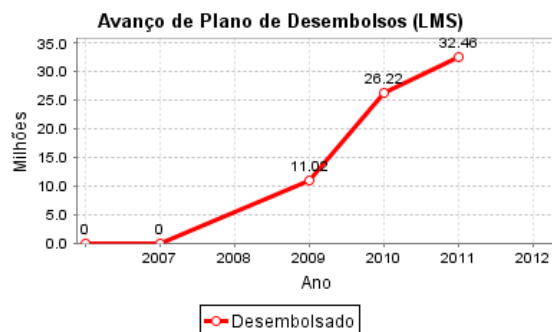



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	Prefeitura Municipal de Vitória				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Número da Operação:	1986/OC-BR	Atual:	39.100.000,00	Original BID:	39.100.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	32.455.645,87	Corrente BID:	39.100.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	83,01	Pari-passu:	60,00
Operação Relacionada:	BR-L1043	Saldo:	6.644.354,13	Cofinanciamento/País:	26.100.000,00
Subtipo de Operação:	GCR - Global Credit Operation			Original Estimado:	65.200.000,00
				Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012

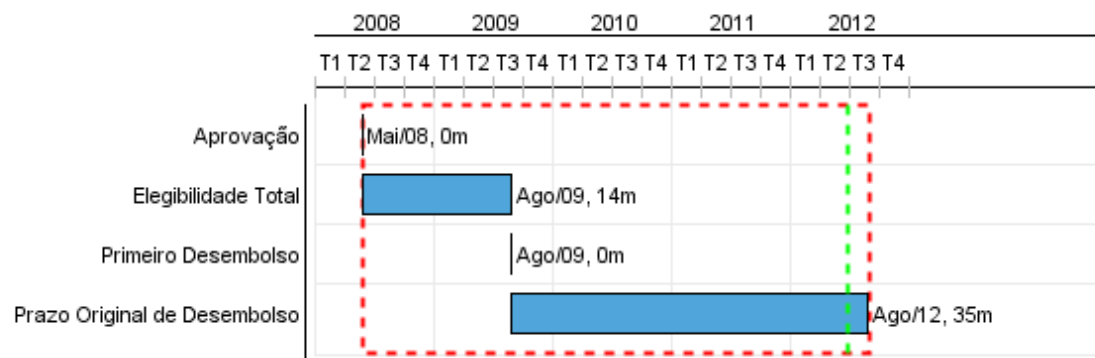

Progresso Acumulado até 2011

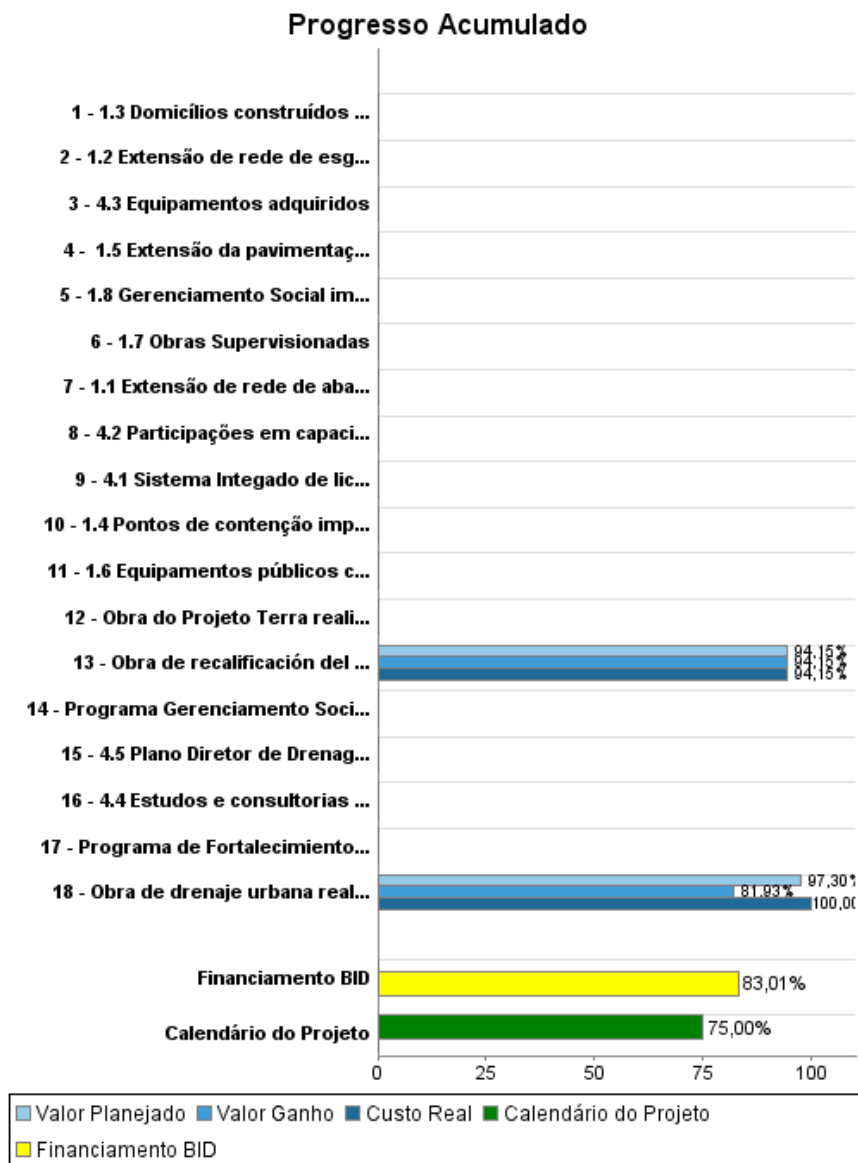

Resultados

Resultado: Infraestrutura urbana y las condiciones ambientales del municipio mejorada y el acceso de su población a servicios sociales básicos ampliados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) medio de las áreas intervenidas en el componente de Apoyo al Proyecto <i>¿Terra Mais Igual?</i> mejorado	índice	0.52	2000	P A				0.68		0,68
Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) medio de las áreas intervenidas en el componente de Revitalización del Centro mejorado	índice	0.73	2000	P A				0.80		0,80

Resultado: Infraestrutura urbana y las condiciones ambientales del municipio mejorada y el acceso de su población a servicios sociales básicos ampliados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Domicílios interligados ao sistema de abastecimento de água e com atendimento regular aumentado	domicílio	453.00	2006	P A	613.00	1,186.00	1,532.00	3,260.00	115.00	6.706,00
Domicílios interligados ao sistema de esgoto aumentado	domicílio	425.00	2006	P A	737.00	1,467.00	1,090.00	2,945.00	125.00	6.364,00
Área inundável na área de intervenção reduzida	metro	100.00	2006	P A	80.00	60.00	10.00			10,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Apoyo al proyecto ¿Terra Mais Igual¿									
Obra do Projeto Terra realizada	obra				1,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
Programa Gerenciamento Social Projeto Terra implementado	programa				1,00	800.000,00	1.234.360,56		
1.1 Extensão de rede de abastecimento de água implantada	metro				41.390,00				4.521.387,40
1.2 Extensão de rede de esgoto implantada	metro				44.050,00				6.753.835,88
1.3 Domicílios construídos ou recuperados	domicílio				392,00				8.730.261,53
1.4 Pontos de contenção implantados	ponto				18,00				2.306.492,72
1.5 Extensão da pavimentação / rede de drenagem implantada	metro				57.264,00				23.175.296,03
1.6 Equipamentos públicos construídos	equipamento				8,00				1.011.737,11
1.7 Obras Supervisionadas	obra				1,00				685.294,12
1.8 Gerenciamento Social implantado	gerenciamento				1,00				2.340.529,41
Recalificación del centro									
Obra de recalificación del centro realizada	obra	1,00	1,00		1,00		1,00		529.411,76
Drenaje Urbano									
Obra de drenaje urbana realizada	#				1,00	661.934,00	661.934,00		21.052.800,00
Fortalecimiento Institucional									
Programa de Fortalecimiento Institucional implementado	programa				1,00	1.500.000,00			
4.1 Sistema Integado de licenciamento Ambiental desenvolvido	sistema				1,00				400.000,00
4.2 Participações em capacitações em monitoramento e fiscalização ambiental	capacitação				1,00				150.000,00
4.3 Equipamentos adquiridos	equipamento				1,00				150.000,00
4.4 Estudos e consultorias realizados	estudos				1,00				2.747.058,82
4.5 Plano Diretor de Drenagem Urbana realizado	plano				1,00				1.352.941,18
Administracion del programa									
others									
TOTAL						7.961.934,00	6.896.295,56		75.907.045,96
