



Operation Number: **PE-X1004**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/15/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/15/2015**
Division Chief validation date: **04/20/2015**
Country Representative validation date: **04/21/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Water and Sanitation Improvement Program	Loan Number:	GRT/WS-12127-PE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		
Team Leader:	Orellana Arevalo, Edgar R.	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Investment Grants	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:		Country:	PERU
Borrower:	Convergence related Operation(s):		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-X1004	\$72,000,000.00	\$72,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$90,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-X1004	\$0.00	\$0.00		\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

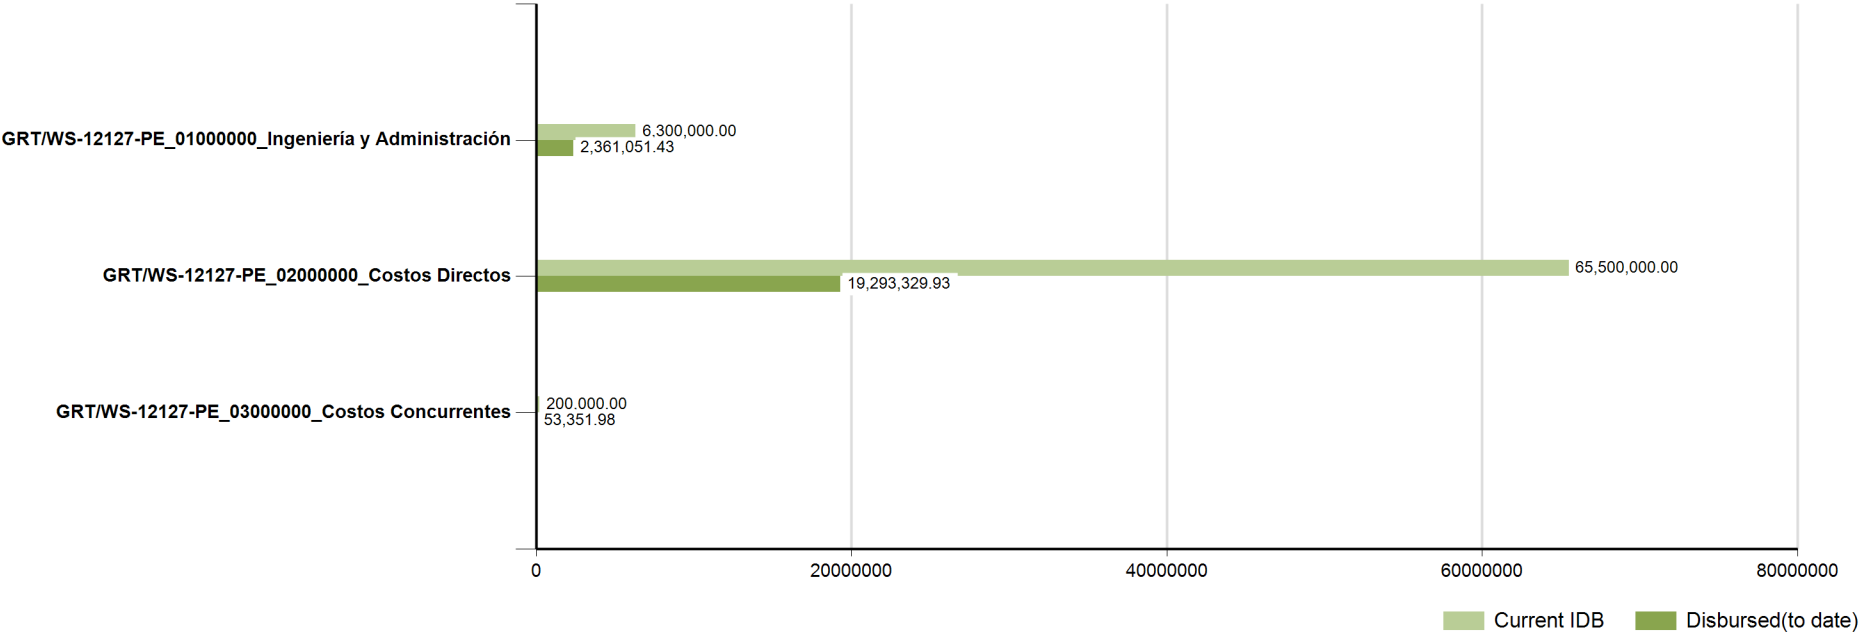

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y pequeñas ciudades del Perú incrementado												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Habitantes con servicios de agua funcionando adecuadamente		Habitante	0.00	2011	Evaluación ex post		P						201,000.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	21,502.00	64,009.00	153,000.00
							A			0.00			
1.2 Hogares con Unidades Básicas de Saneamiento operativas	RF	Hogares	5,448.00	2011	Evaluación ex post	5448 equivale al 10% consignado en la línea de base y 34872 al 64% de los hogares beneficiados de la matriz de resultados inicial	P						34,872.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	3,479.00	14,295.00	33,250.00
							A			0.00			
1.3 Hogares con servicios de agua potable operativos	RF	Hogares	6,483.00	2011	Evaluación ex post	6483 equivale al 12.2% consignado en la línea de base y 34872 al 64% de los hogares beneficiados en la matriz de resultados inicial	P						32,872.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	3,347.00	14,247.00	31,160.00
							A			0.00			
1.4 Habitantes con servicios de saneamiento funcionando adecuadamente		Habitante	0.00	2011	Evaluación ex post		P						201,000.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	21,502.00	64,009.00	153,000.00
							A			0.00			

1.5 Hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas residuales		hogares	0.00	2011	Reportes sistema comercial, gerencia centro. Informes semestrales		P							
							P(a)				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
							A			0.00				

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Inversiones en infraestructura.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistemas de agua potable instalados.	Sistema	P	262.00	362.00	P	33,551,600.00	43,160,900.00
		P(a)	25.00	344.00	P(a)	14,695,841.00	138,073,555.15
		A	0.00	0.00	A	13,241,290.41	14,680,099.15
Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Unidades Básicas de Saneamiento	P	27,236.00	38,444.00	P	10,007,300.00	14,125,600.00
		P(a)	4,023.00	35,000.00	P(a)	5,583,932.00	59,174,380.61
		A	2,442.00	2,442.00	A	5,674,838.61	6,291,470.61
Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Localidades	P	19.00	19.00	P	6,800,700.00	6,800,700.00
		P(a)	0.00	7.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Estudios de Pre Inversion viables	Estudio	P		362.00	P		4,161,500.00
		P(a)	40.00	348.00	P(a)	699,879.23	9,826,362.17
		A	7.00	327.00	A	530,921.91	8,523,351.17
Estudios de Inversión viables	Estudio	P		362.00	P		8,323,000.00
		P(a)	143.00	344.00	P(a)	1,274,445.38	4,660,030.39
		A	157.00	222.00	A	1,630,017.65	2,666,982.39
Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Municipalidades	P		18.00	P		225,200.00
		P(a)		7.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento pequeñas localidades	Usuarios	P	9,301.00	9,301.00	P	36,000.00	36,000.00
		P(a)	0.00	7,000.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Organizaciones comunales (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-JASS u otro), capacitadas para Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios de saneamiento	Organizaciones	P	143.00	343.00	P	840,000.00	3,090,600.00
		P(a)	28.00	337.00	P(a)	614,320.00	6,464,653.56
		A	0.00	0.00	A	677,095.56	677,095.56
Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento rural	Usuarios	P	17,000.00	17,000.00	P	2,376,300.00	2,376,300.00
		P(a)	3,800.00	17,000.00	P(a)	721,480.00	8,718,152.70
		A	0.00	0.00	A	1,167,613.70	1,167,613.70
Fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Planes regionales de saneamiento aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento.	Planes Regionales	P		3.00	P		465,700.00
		P(a)		2.00	P(a)		407,647.18
		A	0.00	2.00	A	0.00	407,647.18
Propuesta de Normas Sectoriales para el ámbito rural y pequeñas Ciudades aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento.	Propuesta de Normas	P		4.00	P		640,100.00
		P(a)	2.00	4.00	P(a)	461,196.00	1,162,168.54
		A	1.00	3.00	A	348,947.84	1,079,018.54
Funcionarios de las Oficinas de Proyectos de Inversión-OPIS de Gobiernos Regionales, competentes para realizar "Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - PIP en Agua y Saneamiento".	Funcionario	P		5.00	P		133,100.00
		P(a)		5.00	P(a)		108,743.04
		A		5.00	A	9,434.74	108,743.04

Funcionarios de las Direcciones Regionales del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (DRVCS) competentes en formulación y evaluación de proyectos en agua y saneamiento	Funcionario	P		5.00	P		65,000.00
		P(a)		5.00	P(a)		29,996.62
		A		5.00	A	0.00	29,996.62
Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento (SIAS) con implementación iniciada en las DRVCS	Sistema	P		3.00	P		432,100.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Adminsitración del Programa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Informes	P	3.00	10.00	P	635,000.00	5,332,729.00
		P(a)	2.00	16.00	P(a)	1,540,856.00	7,456,979.63
		A	2.00	9.00	A	1,598,426.16	4,081,463.63

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$54,246,900.00	\$89,368,529.00
	P(a)	\$25,591,949.61	\$178,823,404.32
	A	\$24,878,586.58	\$39,713,481.59

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento (SIAS) con implementación iniciada en las DRVCS	Inactivate Output	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al inactivar el producto.	4/13/2015	4/8/2015
Output	Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento (SIAS) con implementación iniciada en las DRVCS	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Funcionarios de las Direcciones Regionales del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (DRVCS) competentes en formulación y evaluación de proyectos en agua y saneamiento	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Funcionarios de las Oficinas de Proyectos de Inversión-OPIS de Gobiernos Regionales, competentes para realizar "Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - PIP en Agua y Saneamiento".	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Propuesta de Normas Sectoriales para el ámbito rural y pequeñas Ciudades aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento.	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Planes regionales de saneamiento aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento.	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento rural	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Organizaciones comunales (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-JASS u otro), capacitadas para Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios de saneamiento	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015

Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento pequeñas localidades	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Estudios de Inversión viables	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Estudios de Pre Inversion viables	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Output	Sistemas de agua potable instalados.	Modify Means of Verification	El sistema genera automáticamente los cambios en la matriz al incluir los medios de verificación de cada producto.	4/8/2015	4/8/2015
Outcome	Hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas residuales	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	Se incluye el indicador de base del año 0.	3/30/2015	3/26/2015
Output	Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento (SIAS) con implementación iniciada en las DRVCS	Modify Financial P(a) value	Se elimina el producto, dado que actualmente existe un sistema de información sectorial, aunque infrautilizado. El Ministerio, como Unidad Ejecutora, quiere reorganizar y centralizar todas los Organismos Ejecutores de los diferentes proyectos y crear un Sistema de Información Unificado, y ha deecidido esperar a iimplementar uno nuevo hasta realizar dicha modificacion.	3/26/2015	3/26/2015
Output	Funcionarios de las Oficinas de Proyectos de Inversión-OPIS de Gobiernos Regionales, competentes para realizar "Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - PIP en Agua y Saneamiento".	Modify Financial P(a) value	2015 - Se registra gasto en 2014 debido a saldos por pagar pendientes	3/26/2015	3/26/2015
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento rural	Modify Financial P(a) value	2015 – Se incluye el incremento presupuestario acordado con el GdP. En el 2016 y 2017 se invertirán estos recursos, aunque solo se ingresan los datos en el 2016. En cuanto se abra el 2017, se desglosarán para los dos años. Existe recursos (186 mill de USD) ya comprometidos por el Gobierno de Perú, que se encuentran en trámite de asignación presupuestal por parte del ministerio de Finanzas. Dichos recursos completarán la financiación de este producto para los años 2016 y 2017	3/26/2015	3/26/2015
Output	Organizaciones comunales (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-JASS u otro), capacitadas para Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios de saneamiento	Modify Financial P(a) value	2015 – Se incluye el incremento presupuestario acordado con el Gobierno de Perú. En el 2016 se incluye todo el financiamiento comprometido, aunque en la realidad se lo ejecutará en 2016 y 2017, pero en virtud de que no es factible increasar datos en el 2017, se agrupa en el 2016 hasta poder separarlo en los dos años. Existe recursos (186 mill de USD) ya comprometidos por el Gobierno de Perú, que se encuentran en trámite de asignación presupuestal por parte del ministerio de Finanzas. Dichos recursos completarán la financiación de este producto para los años 2016 y 2017	3/26/2015	3/26/2015
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento pequeñas localidades	Modify Financial P(a) value	2015 – Se incluye el incremento presupuestario acordado con el Gobierno de Perú. En el 2016 se incluye todo el financiamiento comprometido, aunque en la realidad se lo ejecutará en 2016 y 2017, pero en virtud de que no es factible increasar datos en el 2017, se agrupa en el 2016 hasta poder separarlo en los dos años. Existe recursos (186 mill de USD) ya comprometidos por el Gobierno de Perú, que se encuentran en trámite de asignación presupuestal por parte del ministerio de Finanzas. Dichos recursos completarán la financiación de este producto para los años 2016 y 2017	3/26/2015	3/26/2015
Output	Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Modify Financial P(a) value	2015 – Se incluye el incremento presupuestario acordado con el Gobierno de Perú. En el 2016 se incluye todo el financiamiento comprometido, aunque en la realidad se lo ejecutará en 2016 y 2017, pero en virtud de que no es factible increasar datos en el 2017, se agrupa en el 2016 hasta poder separarlo en los dos años. Existe recursos (186 mill de USD) ya comprometidos por el Gobierno de Perú, que se encuentran en trámite de asignación presupuestal por parte del ministerio de Finanzas. Dichos recursos completarán la financiación de este producto para los años 2016 y 2017	3/26/2015	3/26/2015

Output	Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Modify Financial P(a) value	2015 – Se incluye el incremento presupuestario acordado con el Gobierno de Perú. En el 2016 se incluye todo el financiamiento comprometido, aunque en la realidad se lo ejecutará en 2016 y 2017, pero en virtud de que no es factible incrementar datos en el 2017, se agrupa en el 2016 hasta poder separarlo en los dos años. Existe recursos (186 mill de USD) ya comprometidos por el Gobierno de Perú, que se encuentran en trámite de asignación presupuestal por parte del ministerio de Finanzas. Dichos recursos completarán la financiación de este producto para los años 2016 y 2017	3/26/2015	3/26/2015
Output	Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Modify Financial P(a) value	2014 - Tras la consolidación de resultados de la auditoría 2012 y datos del 2013, se ha detectado un error en los montos registrados en años anteriores: En 2012, Dice: \$616,632.00. Debe decir: \$ 616,632.32. Es necesario modificar los valores. 2015 – Se incluye el incremento presupuestario acordado con el Gobierno de Perú. En el 2016 se incluye todo el financiamiento comprometido, aunque en la realidad se lo ejecutará en 2016 y 2017, pero en virtud de que no es factible incrementar datos en el 2017, se agrupa en el 2016 hasta poder separarlo en los dos años. Existe recursos (186 mill de USD) ya comprometidos por el Gobierno de Perú, que se encuentran en trámite de asignación presupuestal por parte del ministerio de Finanzas. Dichos recursos completarán la financiación de este producto para los años 2016 y 2017	3/26/2015	3/26/2015
Output	Sistemas de agua potable instalados.	Modify Financial P(a) value	Antecedentes: Mediante nota N° 041-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, remitida al Viceministerio de Construcción y Saneamiento, el 1 de abril de 2014, se informó sobre la necesidad de recursos para completar el financiamiento con Aporte Local, requerido para lograr las metas físicas originalmente planteadas en el Convenio de Financiamiento No Reembolsable N°GRT/WS-12127-PE. El 16 de Octubre de 2014, se llevó a cabo el Octavo Comité Tripartito del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú – PROCOES, el cual contó con la participación del Sr. Francisco Dumler Cuya, Vice Ministro de Construcción y Saneamiento, representantes del BID y de AECID, así como del PNSR/PROCOES. En dicho Comité se acordó conservar las metas del Programa, y que los recursos adicionales requeridos de contrapartida nacional, se incorporasen como aportes del Gobierno, a través de fondos del propio Ministerio (58,8 millones de UDS en total) y del Fondo de Inclusión de zonas Rurales (FONIE), del Ministerio de Inclusión (248 millones de USD en total). El proyecto totalizará 422 millones de USD 2015 – Se incluye el incremento presupuestario acordado con el Gobierno de Perú. En el 2016 se incluye todo el financiamiento comprometido, aunque en la realidad se lo ejecutará en 2016 y 2017, pero en virtud de que no es factible incrementar datos en el 2017, se agrupa en el 2016 hasta poder separarlo en los dos años. Existe recursos (186 mill de USD) ya comprometidos por el Gobierno de Perú, que se encuentran en trámite de asignación presupuestal por parte del ministerio de Finanzas. Dichos recursos completarán la financiación de este producto para los años 2016 y 2017	3/26/2015	3/26/2015
Outcome	Habitantes con servicios de saneamiento funcionando adecuadamente	Modify EOP P(a)	Los 362 Estudios de Preinversión (343 de localidades rurales y 19 de pequeñas ciudades), inicialmente pre seleccionados por la Dirección Nacional de Saneamiento del VMCS en el año 2010, fueron reemplazados debido a que muchas de esas localidades, a la fecha de la intervención no cumplían con los criterios de elegibilidad del PROCOES indicado en el Manual Operativo del Programa - MOP (aprobado mediante R.M. N° 072 -2011-VIVIENDA), tomándose en cuenta el “Listado de Centros Poblados Rurales focalizados donde intervendrá el PNSR” (aprobado mediante la R.M. N° 161-2012-VIVIENDA de fecha 6 de agosto del 2012). A partir de ello, se identificó 7 pequeñas ciudades, con población entre 2001 y 15,000 habitantes, que cumplen los criterios de elegibilidad, además de 434 localidades rurales, que totalizan un conjunto de 344 proyectos, beneficiando a 153.000 habitantes. La reducción de beneficiarios se basa en la reducción del número de ciudades más pobladas.	3/26/2015	3/26/2015
Outcome	Hogares con servicios de agua potable operativos	Modify EOP P(a)	En el proceso de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el cambio de localidades inicialmente identificadas, se realizan los censos definitivos de beneficiarios, ajustando el alcance.	3/26/2015	3/26/2015
Outcome	Hogares con Unidades Básicas de Saneamiento operativas	Modify EOP P(a)	En el proceso de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el cambio de localidades inicialmente identificadas, se realizan los censos definitivos de beneficiarios, ajustando el alcance.	3/26/2015	3/26/2015
Outcome	Habitantes con servicios agua funcionando adecuadamente	Modify EOP P(a)	Los 362 Estudios de Preinversión (343 de localidades rurales y 19 de pequeñas ciudades), inicialmente pre seleccionados por la Dirección Nacional de Saneamiento del VMCS en el año 2010, fueron reemplazados debido a que muchas de esas localidades, a la fecha de la intervención no cumplían con los criterios de elegibilidad del PROCOES indicado en el Manual Operativo del Programa - MOP (aprobado mediante R.M. N° 072 -2011-VIVIENDA), tomándose en cuenta el “Listado de Centros Poblados Rurales focalizados donde intervendrá el PNSR” (aprobado mediante la R.M. N° 161-2012-VIVIENDA de fecha 6 de agosto del 2012). A partir de ello, se identificó 7 pequeñas ciudades, con población entre 2001 y 15,000 habitantes, que cumplen los criterios de elegibilidad, además de 434 localidades rurales, que totalizan un conjunto de 344 proyectos, beneficiando a 153.000 habitantes. La reducción de beneficiarios se basa en la reducción del número de ciudades más pobladas.	3/26/2015	3/26/2015

Output	Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Modify Physical P(a) value	2015 – Se encuentra en tramite la extensión de plazo del programa hasta Diciembre de 2017. Mientras se oficializa documentalmente, el sistema no permite registrar la programación del 2017, por lo cual se incluye esta en el 2016, tanto de avances físicos, como financieros. Una vez se registre la extensión, se desglosaran adecuadamente los años 2016 y 2017.	3/26/2015	3/26/2015
Output	Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento (SIAS) con implementación iniciada en las DRVCS	Modify Physical P(a) value	Se elimina el producto, dado que actualmente existe un sistema de información sectorial, aunque infrautilizado.	3/26/2015	3/26/2015
Output	Organizaciones comunales (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-JASS u otro), capacitadas para Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios de saneamiento	Modify Physical P(a) value	Se replanifica la capacitación de las JASS hasta la entrega de la infraestructura y el inicio de operación y mantenimiento. 2015 – Se encuentra en tramite la extensión de plazo del programa hasta Diciembre de 2017. Mientras se oficializa documentalmente, el sistema no permite registrar la programación del 2017, por lo cual se incluye esta en el 2016, tanto de avances físicos, como financieros. Una vez se registre la extensión, se desglosaran adecuadamente los años 2016 y 2017.	3/26/2015	3/26/2015
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento pequeñas localidades	Modify Physical P(a) value	Se replanifica la capacitacion de los usuarios, considerando que no estan capacitados hasta la finalización total de las fases de pre inversión, inversión y Post-inversión del componente de desarrollo social, programado hasta finales de 2017.	3/26/2015	3/26/2015
Output	Estudios de Inversión viables	Modify Physical P(a) value	Se logro un avance en el numero de estudios de inversión programados.	3/26/2015	3/26/2015
Output	Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Modify Physical P(a) value	De acuerdo a lo descrito en anteriores items, se reprograma el alcance, pasando de 19 iniciales a 7, dado que , se constató la existencia de inversiones en infraestructura de agua y saneamiento en las pequeñas ciudades identificadas inicialmente, 2015 – Se encuentra en tramite la extensión de plazo del programa hasta Diciembre de 2017. Mientras se oficializa documentalmente, el sistema no permite registrar la programación del 2017, por lo cual se incluye esta en el 2016, tanto de avances físicos, como financieros. Una vez se registre la extensión, se desglosaran adecuadamente los años 2016 y 2017.	3/26/2015	3/26/2015
Output	Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Modify Physical P(a) value	En 2014 se inició la ejecución de 65 obras, las cuales han sufridos retrasos debido a: 1) retraso en el inicio de obras por la falta de contratos de supervisión de obra, e intervención social, que deben ir paralelos y, 2) por demoras en la toma de decisión de superviories, falta de cumplimiento de las empresas contratistas, y motivos de imposibilidad de acceso por razones climarologicas. Se han tomado las medidas adecuadas para solventar los problemas y se espera poder entregar las obras en el primer trimestre 2015. 2015 – Se encuentra en tramite la extensión de plazo del programa hasta Diciembre de 2017. Mientras se oficializa documentalmente, el sistema no permite registrar la programación del 2017, por lo cual se incluye esta en el 2016, tanto de avances físicos, como financieros. Una vez se registre la extensión, se desglosaran adecuadamente los años 2016 y 2017.	3/26/2015	3/26/2015
Output	Sistemas de agua potable instalados.	Modify Physical P(a) value	Los 362 Estudios (343 de localidades rurales y 19 de pequeñas ciudades), inicialmente pre seleccionados por la Dirección Nacional de Saneamiento del VMCS en el año 2010, fueron reemplazados debido a que muchas de esas localidades, a la fecha de la intervención no cumplian con los criterios de elegibilidad del PROCOES indicado en el Manual Operativo del Programa - MOP (aprobado mediante R.M. Nº 072 -2011-VIVIENDA), tomandose en cuenta el "Listado de Centros Poblados Rurales focalizados donde intervendrá el PNSR" (aprobado mediante la R.M. Nº 161-2012-VIVIENDA de fecha 6 de agosto del 2012). A partir de ello, se identificó 7 pequeñas ciudades, con población entre 2001 y 15,000 habitantes, que cumplen los criterios de elegibilidad. En la actualidad la meta se ha incrementado a 434 localidades (427 comunidades rurales y 7 pequeñas ciudades), totalizando 344 proyectos. El aumento de comunidades rurales beneficiarias es resultado de la inclusión de nuevas localidades y economías de escala generadas a partir de una intervención conjunta en dos o más localidades contiguas. Por otro lado, se constató la existencia de inversiones en infraestructura de agua y saneamiento en las pequeñas ciudades identificadas inicialmente, lo que resultó en su reemplazo por localidades más pequeñas. Cabe indicar que la reducción de pequeñas localidades tiene un impacto directo sobre el número de pobladores o beneficiarios directos, de 201 mil habitantes a 153 mil. En 2014 se inició la ejecución de 65 obras, las cuales han sufridos retrasos debido a: 1) retraso en el inicio de obras por la falta de contratos de supervisión de obra, e intervención social, que deben ir paralelos y, 2) por demoras en la toma de decisión de superviories, falta de cumplimiento de las empresas contratistas, y motivos de imposibilidad de acceso por razones climarologicas. Se han tomado las medidas adecuadas para solventar los problemas y se espera poder entregar las obras en el primer trimestre 2015. 2015 – Se encuentra en trámite la extensión de plazo del programa hasta Diciembre de 2017. Mientras se oficializa documentalmente, el sistema no permite registrar la programación del 2017, por lo cual se incluye esta en el 2016, tanto de avances físicos, como financieros. Una vez se registre la extensión, se desglosarán adecuadamente los años 2016 y 2017.	3/26/2015	3/26/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
