



Operation Number: **HA-X1014**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**  
Last Update: **3/23/2016**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/30/2016**  
Division Chief validation date: **03/30/2016**  
Country Representative validation date: **03/30/2016**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Rural Water and Sanitation Program (II)	Loan Number:	GRT/WS-12147-HA
Executing Agency (EA):	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement		
Team Leader:	Gravel,Denis	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Investment Grants	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:		Country:	HAITI
Borrower:	Convergence related Operation(s):		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HA-X1014	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HA-X1014	\$0.00	\$0.00		\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

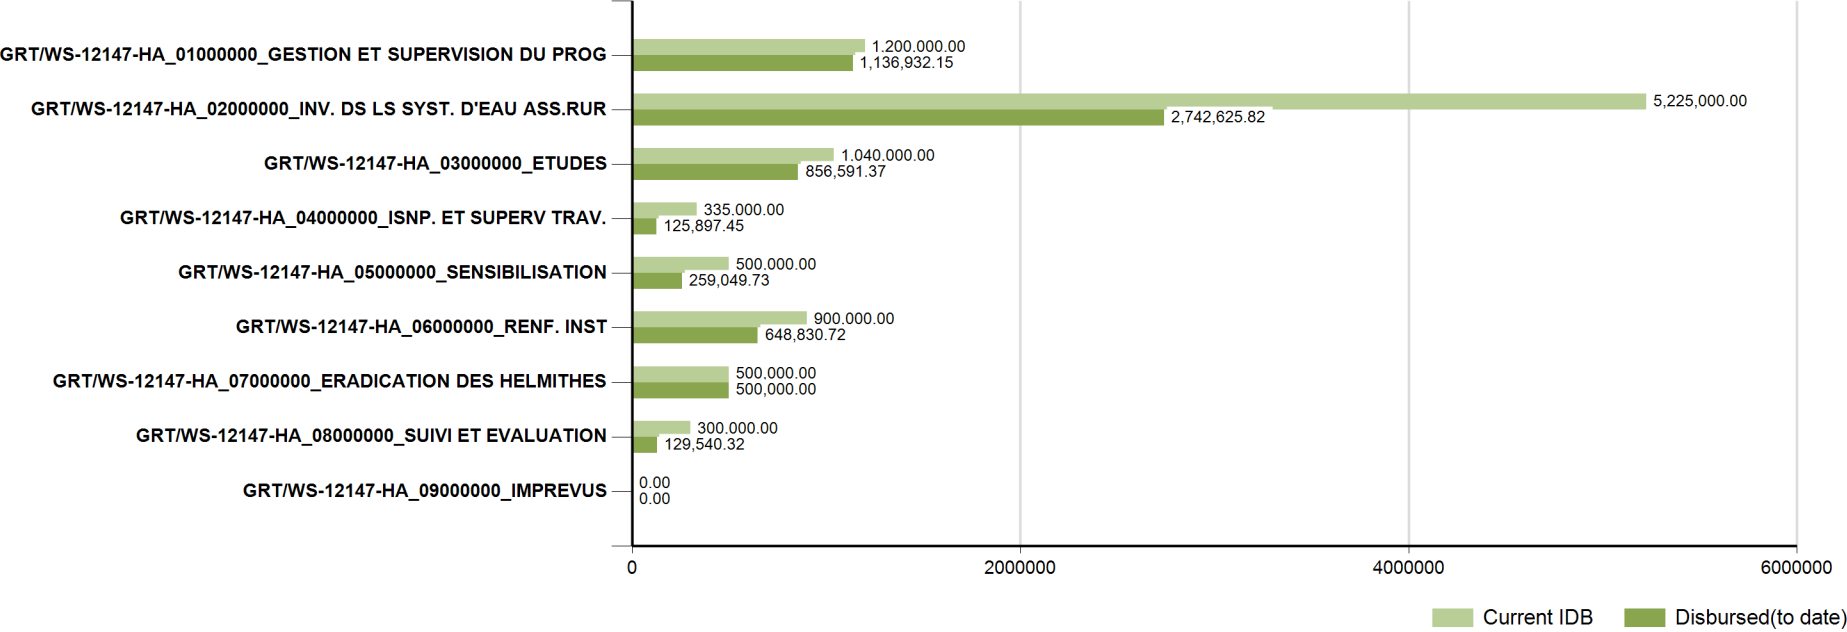

## Results Matrix

## Impacts

No information related to this operation.

## Outcomes

Outcome:	1 Nuevos consumidores que reciben servicios de agua potable a través de sistemas nuevos o rehabilitados												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
1.1 3.2.1 Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	RF	Hogares	0.00	2010	Recepcion obras civiles		P		5,000.00	10,000.00		10,000.00	
							P(a)	3,400.00	4,200.00	2,000.00	1,800.00	600.00	12,000.00
							A	3,350.00	4,500.00	666.00	2,735.00		
1.2 Establecimiento Educativo y/o Mercado Publico beneficiado con nuevo acceso o acceso mejorado a agua potable		Establecimiento	0.00	2010	Informes Semestrales, informes de seguimiento		P						
							P(a)			5.00	4.00	0.00	9.00
							A		0.00	1.00	6.00		
Outcome:	2 Nuevos consumidores que reciben servicios de saneamiento a través de sistemas nuevos o rehabilitados												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
2.0 Personas Beneficiadas en los centros educativos y centros de salud		Personas	0.00	2010	Informes de la Unidad Ejecutora		P						
							P(a)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00
							A			1,874.00	200.00		
2.1 Establecimientos educativos y/o mercados publicos beneficiados con acceso nuevo o mejorado a saneamiento por redes o con nueva solución individual de saneamiento adecuada		Establecimiento Educativo	0.00	2010	Informes Semestrales e informes de seguimiento		P						
							P(a)			5.00	4.00	2.00	11.00
							A			6.00	1.00		
Outcome:	3 Metodologia para la realizacion de Proyectos rurales (diseño, construcción, operación y mantenimiento).												
Observation:													

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
3.1 Metodología publicada			Metodologi a	0.00	2010	Publicacion del manual.		P	1.00				1.00	
								P(a)	1.00		0.00	1.00	0.00	1.00
								A	0.00	0.00	0.00	0.00		
Outco me:	4 Sistemas en Operacion													
Observ ation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
4.1 Sistemas financierament e sostenibles (ingresos > costos de administración, operación y mantenimiento)			Sistema	0.00	2010	Informes semestrale s. Seguimient o de los indices de funcionami ento del sistema. Evaluacion final		P						
								P(a)			28.00	15.00	5.00	48.00
								A		0.00	36.00	23.00		
4.1 Sistemas operando y en mantenimiento según especificacione s técnicas de diseño (Poblaciones entre 1.000 y 10.000 hab)			Sistema	0.00	2010	Informes semestrale s, Seguimient o de indices de operacion, Evaluacion final.		P						
								P(a)	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	5.00
								A	1.00	1.00	4.00	0.00		
4.2 Sistemas operando y en mantenimiento según especificacione s técnicas de diseño (Poblaciones menores de 1.000 hab)			Sistema	0.00	2010	Informes semestrale s, seguimient o de los indices de operacion, evaluacion final		P						
								P(a)	30.00	22.00	2.00	0.00	0.00	55.00
								A	30.00	23.00	3.00	0.00		
Outco me:	5 Refuerzo Institucional													
Observ ation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
5.1 Entidades Rurales Departamental es siguiendo las directrices de la metodologia elaborada (URD)			Entidad	0.00	2010	Informes del DMR (Departam ento Medio Rural) DINEPA		P						
								P(a)			0.00	1.00	0.00	1.00
								A		0.00	1.00	1.00		
Outco me:	6 Poblacion afectada por geohelminthos.													

Observation:	Durante el año 2013, el MSPP ha realizado una sola campaña de desparasitado (#38797863) que se realizó en Junio. Esta campaña se reporta en los outputs. En el documento « Evaluation de la prévalence des helminthiases intestinales chez les enfants de 6 à 15 ans scolarisés en Haïti, Octobre 2013 » (#38797769). Se indica que la prevalencia de parásitos en el Departamento del Artibonite es del 4.3%. La población seleccionada ha sido los niños entre 5 a 15 años.
--------------	---

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
6.1 Población de las comunidades beneficiarias del programa infectada por geohelminths en Artibonite		Porcentaje	33.00	2003	Informe anual del Ministerio deSalud Pública / Estudio especial suministrado por la división de helmintos transmitidos por el contacto con el suelo		P	25.00	20.00	15.00	10.00	10.00
							P(a)	25.00	20.00	15.00	10.00	10.00
							A	29.00	4.30	4.30	4.30	

Outcome:	7 Rentabilidad Interna del Proyecto
----------	-------------------------------------

Observation:	
--------------	--

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
7.1 Tasa Interna de rentabilidad Economica		Porcentaje	12.00	2010	Antes/Des pues de la evaluacion. Base de referencia en funcion de la evaluacion economica.		P			12.00		12.00
							P(a)			12.00	12.00	12.00
							A			0.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Inversiones en Sistemas de agua y saneamiento en el medio rural		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Sistemas comunales de agua potable construidos o rehabilitados (poblaciones entre 1.000 y 10.000 personas)	Sistema	P	7.00	12.00	P	48,000.00	5,263,000.00
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	1,749,531.92	4,273,845.74
		A	0.00	6.00	A	1,285,801.47	2,413,845.74
Sistema nuevos de saneamiento se han construido y operan según especificaciones de diseño	Sistema	P	7.00	12.00	P	9,600.00	1,072,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Bloques sanitarios construidos y operativos en escuelas públicas y mercados publicos	Bloques Sanitarios	P	5.00	10.00	P	2,400.00	268,000.00
		P(a)	5.00	9.00	P(a)	200,000.00	426,465.71
		A	2.00	8.00	A	195,014.88	326,465.71
Entrega de los datos del Inventario para el Departamento (del Artibonite)	Inventario	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	198,250.50
		A	0.00	1.00	A	11,623.03	198,250.50
Sistemas Comunitarios de agua potable construidos o rehabilitados (Poblaciones inferiores a 1.000 perones)	Sistemas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	56.00	P(a)	30,000.00	969,360.27
		A	0.00	56.00	A	42,355.25	919,360.27
Sistema nuevos de saneamiento se han construido y operan según especificaciones de diseño	Sistema	P			P		
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Promoción, extensión comunitaria e iniciación y seguimiento de proyectos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Campañas de sensibilización e información	Campaña	P	0.00	15.00	P	10,000.00	165,000.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	85,000.00	246,109.39
		A	1.00	3.00	A	75,195.55	166,109.39
Manual de procesos para orientar las intervenciones de agua y saneamiento en el sector rural	Manual	P	0.00	1.00	P	0.00	20,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento (Poblaciones entre 1.000 y 10.0000 personas)	Organizacion	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	10.00	P(a)	10,000.00	32,000.00
		A	0.00	9.00	A	13,000.00	22,000.00
CAEPA (comités de suministro de agua potable y saneamiento) formadas de acuerdo metodologia	CAEPA	P	0.00	15.00	P	7,500.00	120,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	2,696.09
		A		2.00	A		2,696.09
Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento (Poblaciones inferiores a 1.000 personas)	Organizacion	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	56.00	P(a)	10,000.00	32,000.00
		A	0.00	56.00	A	13,000.00	22,000.00
Operadores formados de acuerdo metodologia	Operador	P	0.00	15.00	P	2,500.00	40,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	898.70
		A		0.00	A		898.70
Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento reconocidas (Poblaciones entre 1.000 y 10.0000 personas)	Organizacion	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	10.00	P(a)	10,000.00	32,000.00
		A	2.00	9.00	A	13,000.00	22,000.00
CAEPAs capacitadas de acuerdo a la metodologia	CAEPA	P	0.00	15.00	P	7,500.00	120,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	2,696.09
		A		0.00	A		2,696.09

Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento reconocidas (Poblaciones inferiores a 1.000 personas)	Organizacion	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	56.00	P(a)	10,000.00	32,000.00
		A	0.00	56.00	A	13,000.00	22,000.00
Operadores capacitados de acuerdo a la metodologia	Operador	P	0.00	15.00	P	2,500.00	40,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	898.70
		A		0.00	A		898.70
Talleres de Formacion	Taller	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	20,000.00	63,589.35
		A	2.00	6.00	A	28,782.35	43,589.35
Fortalecimiento institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Entidad Gubernamental sub-nacional equipadas	Entidad	P		0.00	P		11,837.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	50,000.00	222,215.45
		A	1.00	2.00	A	35,486.25	192,215.45
Ingenieros de OREPA Centre capacitados	ingeniero Capacitado	P	0.00	3.00	P	77,300.00	912,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	166,769.58
		A		0.00	A		166,769.58
Entidades gubernamentales sub-nacionales en operacion y haciendo el seguimiento de las actividades programadas y de los Consultores de apoyo	Entidad	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	100,000.00	438,434.44
		A	1.00	4.00	A	97,853.26	388,434.44
Manual de Gestion de sistemas rurales elaborado	Manual	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	30,000.00	26,297.79
		A	0.00	0.00	A	22,428.44	26,297.79
Manual de Reglamento de tarifas de sistemas rurales elaborado	Reglamento	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	20,000.00	10,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Ingenieros de OREPA Centre capacitados	Ingeniero capacitado	P			P		
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Erradicacion de helmintos transmitidos por el contacto con el suelo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Campaña anual de deparasitación (de geohelmintos) realizada.	Campaña	P	1.00	6.00	P	100,000.00	560,000.00
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	13,584.44	500,000.00
		A	1.00	6.00	A	13,584.44	500,000.00
Administración, auditorias e imprevistos.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Administración	Anualidad	P	1.00	6.00	P	117,000.00	961,000.00
		P(a)	0.00	1.50	P(a)	0.00	114,904.49
		A		1.50	A		114,904.49
Auditorias	Unidad	P	1.00	2.00	P	150,000.00	300,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Imprevistos	Anualidad	P	1.00	4.00	P	30,000.00	300,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00

Other Cost		2015	Cost
Imprevistos	P		
	P(a)	\$0.00	\$200,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Auditorias	P		
	P(a)	\$60,000.00	\$311,050.93
	A	\$62,050.93	\$171,050.93
Administracion	P		\$60,760.00
	P(a)	\$200,000.00	\$1,238,065.21
	A	\$216,488.94	\$1,088,065.21
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$564,300.00	\$10,213,597.00
	P(a)	\$2,598,116.36	\$9,540,548.43
	A	\$2,138,664.79	\$6,810,548.43

## Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento reconocidas (Poblaciones inferiores a 1.000 personas)	Modify Physical P(a) value	En razón de inestabilidad social durante el segundo semestre 2015 (campana política), ha sido imposible viajar como de costumbre para ejecutar las actividades del programa. Por esa razón hubo atrasos que explican el atraso en el logro de las metas. Consecuentemente también, el plazo de ejecución del programa tendrá que ser ampliado hacia el final 2016.	3/11/2016	3/11/2016
Output	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento (Poblaciones inferiores a 1.000 personas)	Modify Physical P(a) value	En razón de inestabilidad social durante el segundo semestre 2015 (campana política), ha sido imposible viajar como de costumbre para ejecutar las actividades del programa. Por esa razón hubo atrasos que explican el atraso en el logro de las metas. Consecuentemente también, el plazo de ejecución del programa tendrá que ser ampliado hacia el final 2016.	3/11/2016	3/11/2016
Output	Manual de Reglamento de tarifas de sistemas rurales elaborado	Modify Physical P(a) value	El marco tarifario de cada proyecto se establece ad hoc con la población en función de su disponibilidad a pagar y de su nivel de pobreza. En el 2016, la DINEPA entregará un conjunto de esta documentación para dar cumplimiento al mencionado indicador.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Manual de Gestion de sistemas rurales elaborado	Modify Physical P(a) value	El cambio de director de la Unidad Ejecutora y los meses perdidos hasta reemplazarle en la DINEPA, resultaron en el atraso de las actividades previstas. Se prevé entregar este manual en el transcurso del 2016.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Talleres de Formacion	Modify Physical P(a) value	en el 2015 se ha alcanzado la meta EOP para este producto.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento reconocidas (Poblaciones entre 1.000 y 10.0000 personas)	Modify Physical P(a) value	En razón de problemas sociales o de sequía de la fuente de abastecimiento de agua (resultado de la desertificación progresiva de Haïti), varios proyectos han sido afectados, imposibilitando la prestación de los servicios. Esto explica porque existen bajas respecto a lo reportado en el PMR 1S 2015. Cabe mencionar que medidas están ejecutándose para rehabilitar los proyectos afectados, sea mediante obras adicionales o acciones adicionales de ingeniería social.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento (Poblaciones entre 1.000 y 10.0000 personas)	Modify Physical P(a) value	En razón de inestabilidad social durante el segundo semestre 2015 (campana política), ha sido imposible viajar como de costumbre para ejecutar las actividades del programa. Por esa razón hubo atrasos que explican el atraso en el logro de las metas. Consecuentemente también, el plazo de ejecución del programa tendrá que ser ampliado hacia el final 2016.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Sistemas Comunitarios de agua potable construidos o rehabilitados (Poblaciones inferiores a 1.000 perones)	Modify Physical P(a) value	No se ha ejecutado obras en el 2015 y tampoco están previstas para 2016. Cabe notar que se alcanzó la meta final del programa antes del tiempo previsto. (consistente con Output 1.4; 56 sistemas y por lo tanto, 56 organizaciones comunitarias).	3/10/2016	3/11/2016
Output	Bloques sanitarios construidos y operativos en escuelas públicas y mercados publicos	Modify Physical P(a) value	Un bloque sanitario escolar ha sido abandonado a Source Chaude en razón de la refaccion y reubicación de la escuela al centro del pueblo. Eso explica porque hubo baja respecto a lo reportado en el PMR 1S 2015	3/10/2016	3/11/2016



Output	Sistemas comunales de agua potable construidos o rehabilitados (poblaciones entre 1.000 y 10.000 personas)	Modify Physical P(a) value	Unos proyectos han sido atrasados en el 2015 debido a la inestabilidad social en el país. Si bien afectaron el logro anual, se prevé recuperar el atraso en 2016 con la finalización de Ka Philippe y Perodin, lo que permitirá cumplir con la meta EOP.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Entidades gubernamentales sub-nacionales en operacion y haciendo el seguimiento de las actividades programadas y de los Consultores de apoyo	Modify Financial P(a) value	La OREPA centre sigue funcionando conforme a lo planificado.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Campañas de sensibilización e información	Modify Financial P(a) value	sin comentario particular.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Sistemas Comunitarios de agua potable construidos o rehabilitados (Poblaciones inferiores a 1.000 perones)	Modify Financial P(a) value	No se ha ejecutado obras en el 2015 y tampoco están previstas para 2016. Cabe notar que se alcanzó la meta final del programa antes del tiempo previsto. (consistente con Output 1.4; 56 sistemas y por lo tanto, 56 organizaciones comunitarias).	3/10/2016	3/11/2016
Output	Entrega de los datos del Inventario para el Departamento (del Artibonite)	Modify Financial P(a) value	sin comentario particular por tratarse de las actividades normales de la DINEPA	3/10/2016	3/11/2016
Output	Bloques sanitarios construidos y operativos en escuelas públicas y mercados publicos	Modify Financial P(a) value	sin comentario particular	3/10/2016	3/11/2016
Output	Sistemas comunales de agua potable construidos o rehabilitados (poblaciones entre 1.000 y 10.000 personas)	Modify Financial P(a) value	En razón de la inestabilidad social y la perdida de seguridad durante el segundo semestre 2015 (Campaña política), la ejecución se vio afectada. La imposibilidad de completar la ejecución de los proyectos por fuerza mayor, se tradujo por atrasos, y ejecución presupuestaria por debajo de lo esperado. También explica porque el programa tendrá que ser ampliado hasta el final del 2016.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Talleres de Formacion	Modify Financial P(a) value	sin comentario particular. Se puso esfuerzo al respecto, entre otros mediante eventos publicos en el sector.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Manual de Gestion de sistemas rurales elaborado	Modify Financial P(a) value	El cambio de director de la Unidad Ejecutora y los meses perdidos hasta reemplazarle en la DINEPA, resultaron en el atraso de las actividades previstas. Se prevé entregar este manual en el transcurso del 2016.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Entidad Gubernamental sub-nacional equipadas	Modify Financial P(a) value	En razón de la inestabilidad social y la perdida de seguridad durante el segundo semestre 2015 (Campaña política), la ejecución se vio afectada. La imposibilidad de completar la ejecución de los proyectos por fuerza mayor, se tradujo por atrasos, y ejecución presupuestaria por debajo de lo esperado. También explica porque el programa tendrá que ser ampliado hasta el final del 2016.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento reconocidas (Poblaciones inferiores a 1.000 personas)	Modify Financial P(a) value	En razón de inestabilidad social durante el segundo semestre 2015 (campaña política), ha sido imposible viajar como de costumbre para ejecutar las actividades del programa. Por esa razón hubo atrasos que explican el atraso en el logro de las metas. Consecuentemente también, el plazo de ejecución del programa tendrá que ser ampliado hacia el final 2016.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento reconocidas (Poblaciones entre 1.000 y 10.0000 personas)	Modify Financial P(a) value	En razón de problemas sociales o de sequía de la fuente de abastecimiento de agua (resultado de la desertificación progresiva de Haïti), varios proyectos han sido afectados, imposibilitando la prestación de los servicios. Esto explica porque existen bajas respecto a lo reportado en el PMR 1S 2015. Cabe mencionar que medidas están ejecutándose para rehabilitar los proyectos afectados, sea mediante obras adicionales o acciones adicionales de ingeniería social.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento (Poblaciones inferiores a 1.000 personas)	Modify Financial P(a) value	En razón de inestabilidad social durante el segundo semestre 2015 (campaña política), ha sido imposible viajar como de costumbre para ejecutar las actividades del programa. Por esa razón hubo atrasos que explican el atraso en el logro de las metas. Consecuentemente también, el plazo de ejecución del programa tendrá que ser ampliado hacia el final 2016.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Organizaciones Comunitarias para la prestacion de servicios de agua y saneamiento (Poblaciones entre 1.000 y 10.0000 personas)	Modify Financial P(a) value	En razón de inestabilidad social durante el segundo semestre 2015 (campaña política), ha sido imposible viajar como de costumbre para ejecutar las actividades del programa. Por esa razón hubo atrasos que explican el atraso en el logro de las metas. Consecuentemente también, el plazo de ejecución del programa tendrá que ser ampliado hacia el final 2016.	3/10/2016	3/11/2016
Output	Manual de Reglamento de tarifas de sistemas rurales elaborado	Modify Financial P(a) value	El marco tarifario de cada proyecto se establece ad hoc con la población en función de su disponibilidad a pagar y de su nivel de pobreza. En el 2016, la DINEPA entregará un conjunto de esta documentación para dar cumplimiento al mencionado indicador.	3/10/2016	3/11/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
