
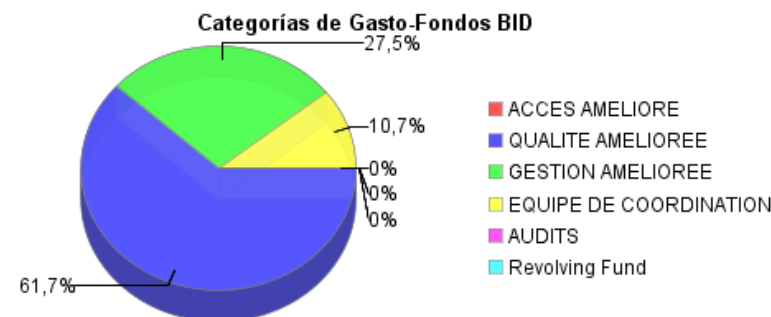
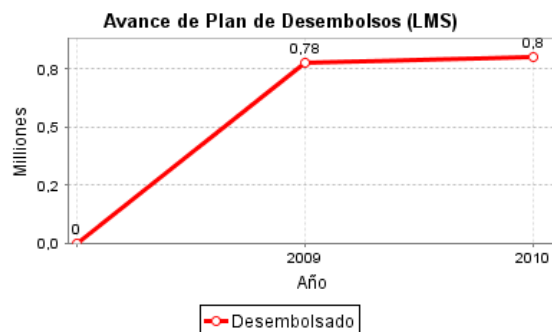


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DU SPORT		
Sector:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Número(s) de Préstamo:	2382/GR-HA;1016/SF-HA	Monto Aprobado Actual: 19.386.091,93	BID Original: 19.490.848,58
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 19.305.423,16	Actual BID: 19.386.091,93
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 99,58	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):	HA-T1063	Saldo: 80.668,77	Co-financiamiento/País: 5.130.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 24.620.848,58
			Período de Amortización (meses): 354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 15, 2011 Validado por Representante de País: Apr 27, 2011

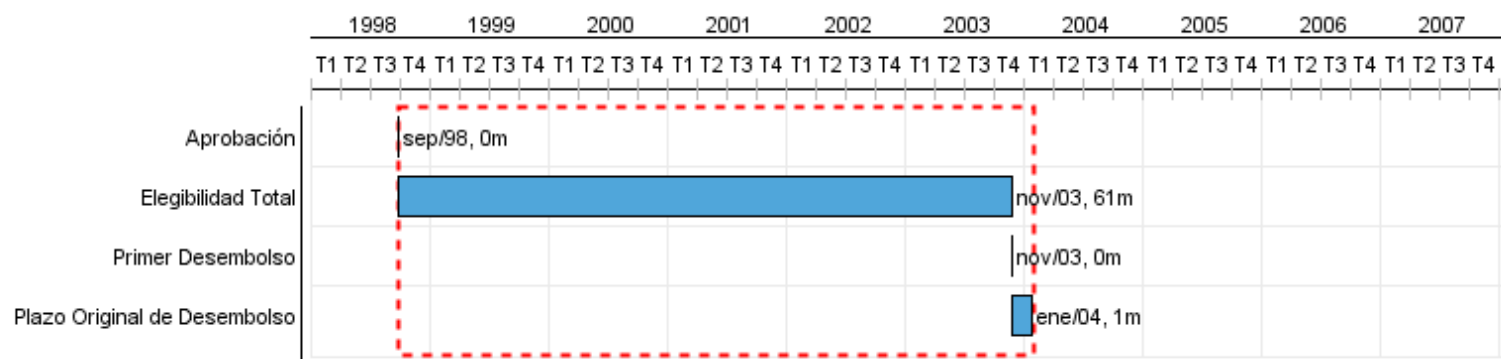

Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado:	Rendre les deux premiers cycle de l'école fondamentale plus équitables, efficaces et efficients, en (i) maintenant et améliorant l'accès aux installations scolaires du primaire dans des zones ciblées; (ii) améliorant la qualité de l'éducation primai
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2006	2009	Fin de Proyecto
Le nombre d'inscription dans les écoles. Il n'y a pas de système de suivi malgré l'insistance de la Banque. Il est donc pas possible d'avoir les données de cet indicateur. Il avait été décidé en septembre 2006, d'inclure cette tâche dans les terme	Taux d'inscription net aux 2 premiers cycles de l'École fondamentale			P A			0,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Description	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ									
EFACAP construites, équipées et fonctionnelles à la fin de l'exécution du projet	EFACAP				10,00				
Directeurs des écoles associées et des 10 EFACAP ayant suivis les formations relatives au fonctionnement des EFACAP	Diirecteurs				200,00				
Enseignants ayant suivi l'ensemble des formations offert dans le cadre du Projet	Enseignants				1.200,00				
Les écoles ont reçu des kits didactiques dont le contenu a été accepté par le ministère	Ecoles				200,00				
Les écoles ont reçu au moins un contrat pédagogique qui a été exécuté et évalué	Ecoles				300,00				
Les élèves ont reçu des kits pédagogiques dont le contenu a été accepté par le ministère	Elèves				2.000,00				
AMÉLIORATION DE L'ACCÈS									
Un plan d'entretien conçu selon la stratégie du MENJS approuvé et mise en vigueur	Plan d'entretien				1,00				
Salles de classes avec infrastructures améliorées et équipées selon les normes du MENJS	Salles de classe				304,00				
AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ DE GESTION									
Les bureaux de districts scolaires sont construits et équipés selon les normes du MENJS	Bureaux District Scolaire				25,00				
50 inspecteurs principaux et 240 inspecteurs de zone ont acquis les compétences établies dans le plan de formation des inspecteurs du ministère	Inspecteurs				290,00				
Des comités d'écoles sont mis en place et fonctionnent suivant les normes étalbies par le ministère	Comités d'écoles				150,00				
Le ministère dispose au niveau central, départemental et local d'un système d'information permettant d'enregistrer les données de base du système éducatif haïtien.	Système d'information				1,00				
TOTAL									
