

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Sector: MULTISECTOR CREDIT & PREINVESTMENT-MULTISECTOR CREDIT PROGRAMS
Número(s) de Préstamo: 1493/SF-HA;2384/GR-HA
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): HA-T1060, HA-X1008
Subtipo de Operación: GOM - Operación Global de Obras Múltiples

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 72.999.999,30
Monto Desembolsado a la fecha: 57.026.275,57
% Desembolsado: 78,12
Saldo: 15.973.723,73

Costo total y Fuente

BID Original: 94.526.657,29
Actual BID: 72.999.999,30
Pari-passu: 98,82
Co-financiamiento/País: 7.800.000,00
Estimado Original: 102.326.657,29
Período de Amortización (meses): 354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: Apr 6, 2011
Validado por Representante de País: Apr 27, 2011

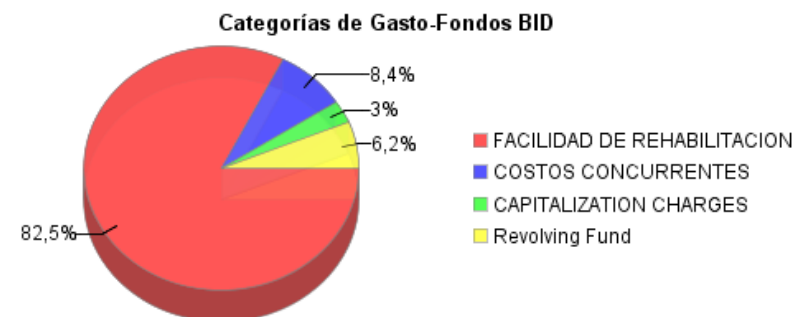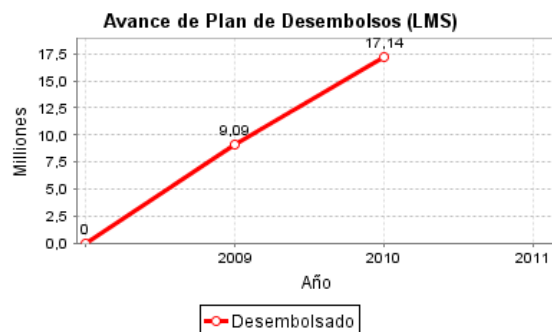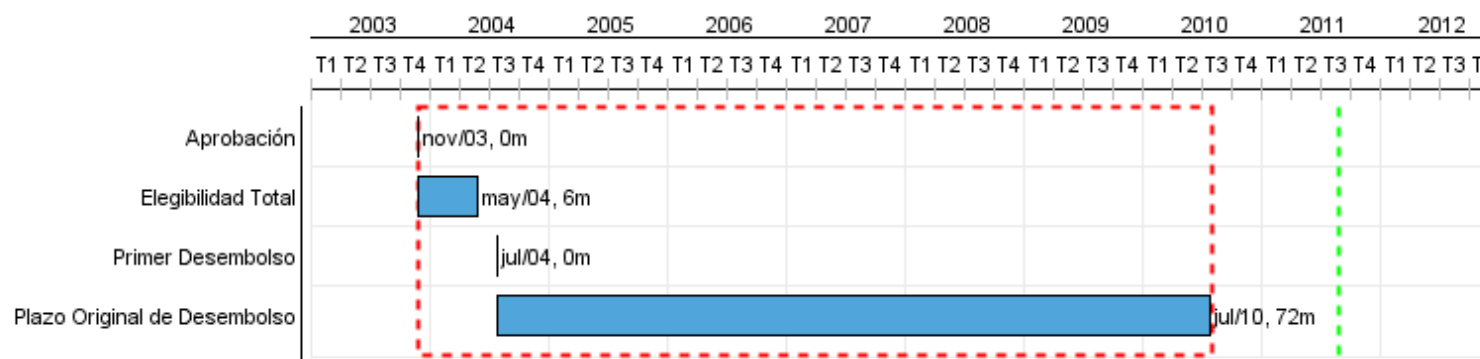

Progreso Acumulado al 2010

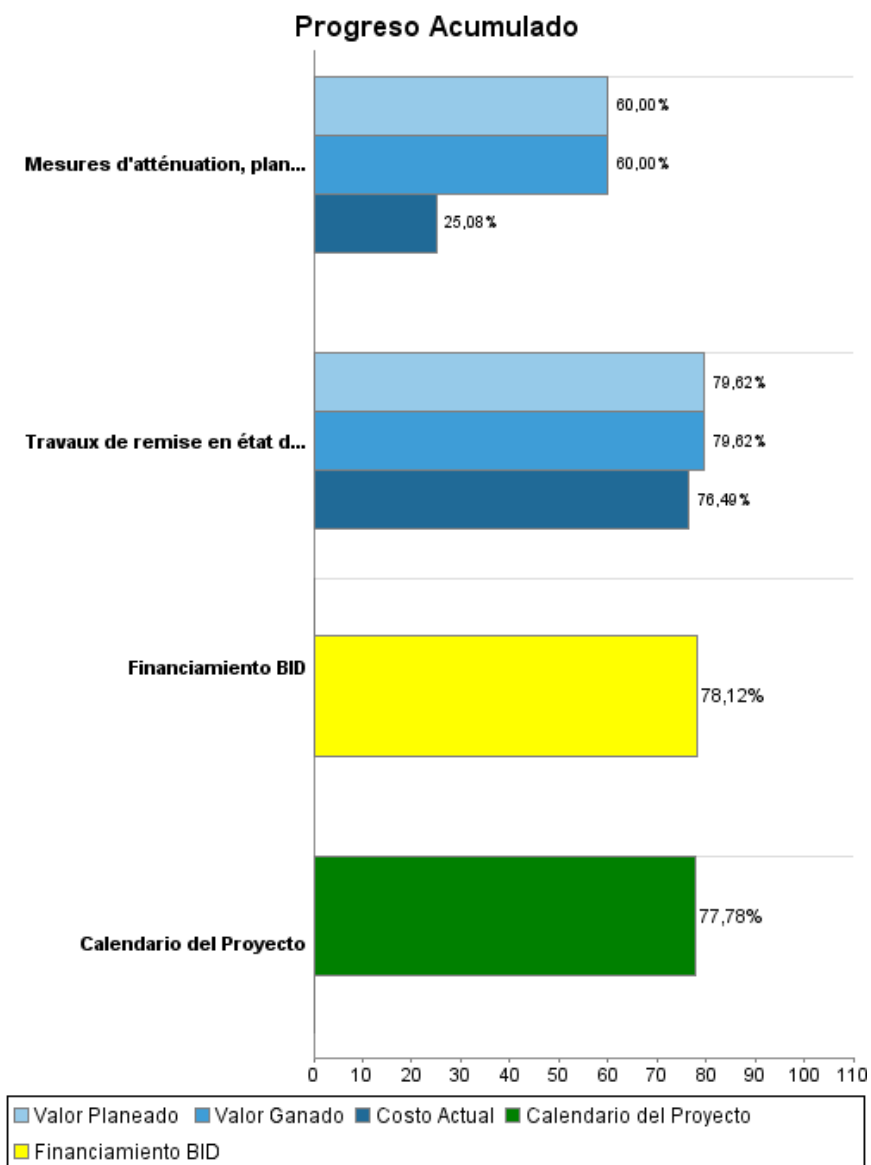

Resultados

Resultado:	Les infrastructures économiques de base sont réhabilitées, gérées et entretenues de manière efficiente et durable
Supuestos:	Le pays dispose de ressources nationales et internationales pour l'investissement et l'entretien de l'infrastructure économique de base

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	Fin de Proyecto
Les projets sont entretenus convenablement après leur réception finale	Nombre de projets terminés et entretenus		2005	P	15,00	20,00	44,00
				A	10,00	25,00	
Les usagers, les résidents et les bénéficiaires sont impliqués dans la gestion et l'entretien des projets par des mécanismes de participation	Nombre de projets dotés de mécanismes participatifs		2005	P		10,00	15,00
				A		10,00	
Les bénéficiaires, les résidents et les usagers sont satisfaits des ouvrages réhabilités	% de personnes satisfaites		2005	P	80,00	80,00	80,00
				A	60,00	80,00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Mécanisme de remise en état de l'infrastructure économique de base									
Travaux de remise en état de routes, de ponts, de drainage, de bâtiments, de ports et d'environnement	Nombre de projets réalisés	15,00	15,00		45,00	21.404.000,00	6.536.872,00		54.000.000,00
Mesures d'atténuation, plans d'entretien et études de préinvestissement	Études réalisées	10,00	10,00		60,00	600.000,00	491.500,00		5.500.000,00
Administration, finances et imprévus									
TOTAL						22.004.000,00	7.028.372,00		59.500.000,00
