

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo: 1928/OC-ME
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: PFM - Proyecto de Fases Múltiples

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 150.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 150.000.000,00
% Desembolsado: 100,00
Saldo:

Costo total y Fuente

BID Original: 150.000.000,00
Actual BID: 150.000.000,00
Pari-passu: 49,75
Co-financiamiento/País: 150.000.000,00
Estimado Original: 300.000.000,00
Período de Amortización (meses): 258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto



Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación


Validado por el Jefe de División: Apr 28, 2011
Validado por Representante de País: Apr 28, 2011

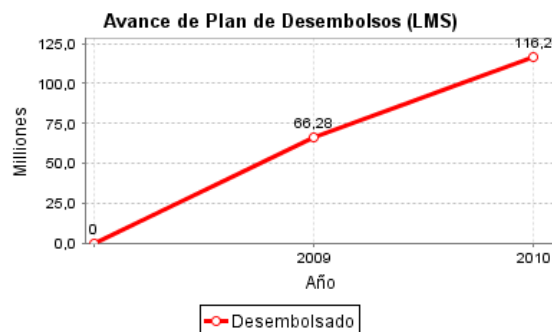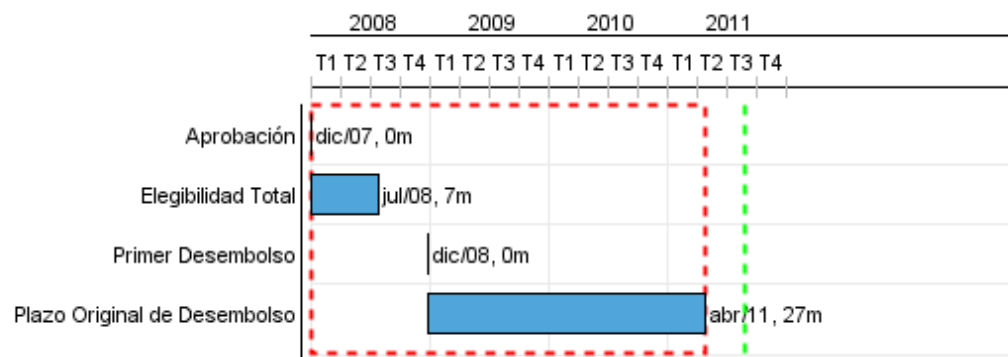

Categorías de Gasto-Fondos BID

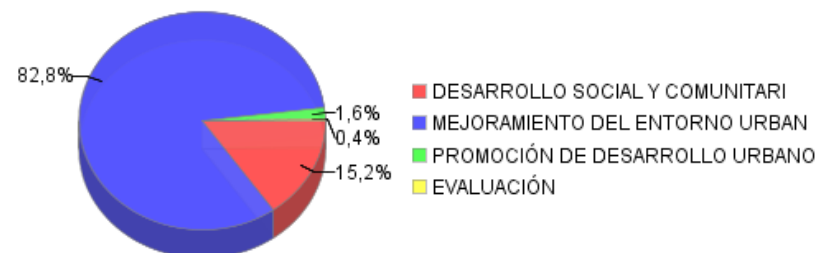

Progreso Acumulado al 2010

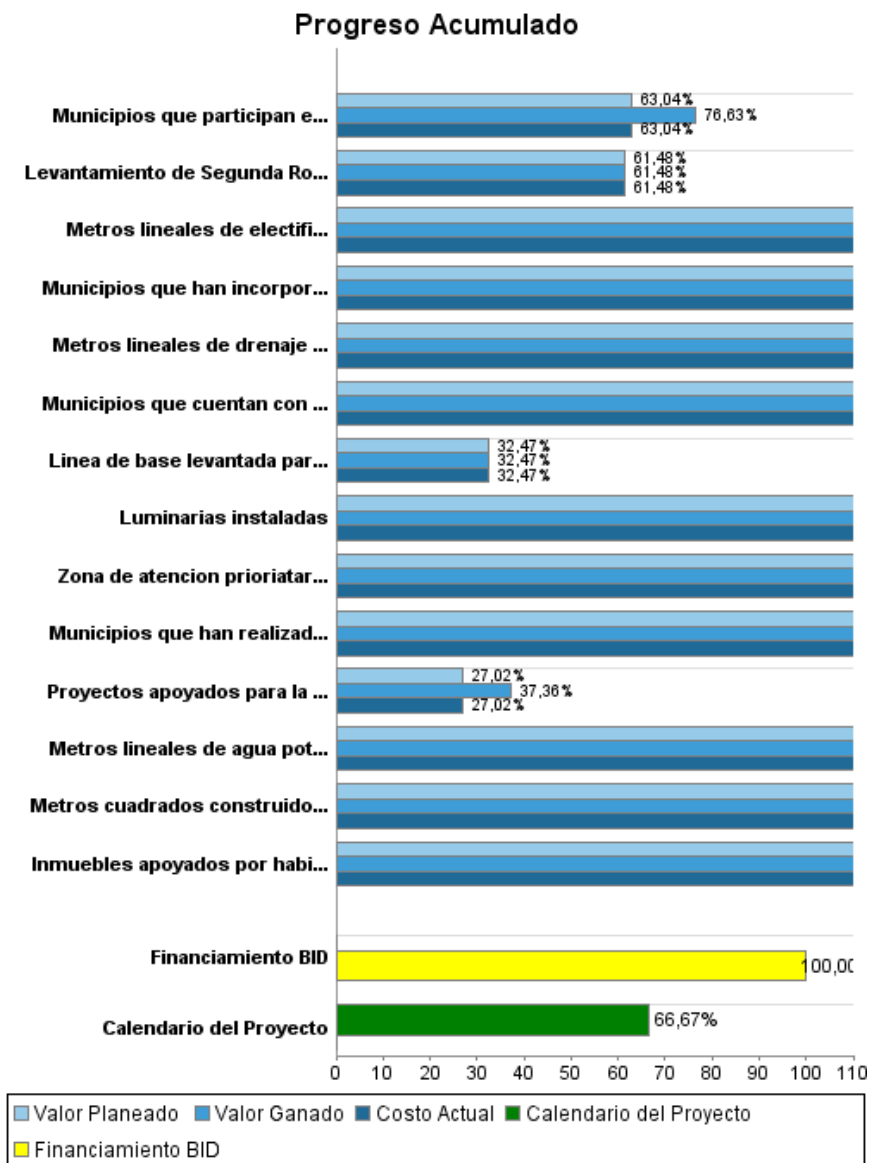

Resultados

Resultado:	Cobertura de los servicios básicos de las zonas urbano marginadas aumentado y vulnerabilidad de residentes en áreas urbano-marginadas reducida
Supuestos:	Los supuestos para la evaluación de impacto se basaban en un nivel de inversiones en los polígonos de tratamiento que no se dio en el 2009. Por tanto, para no echar a perder todo el esfuerzo de evaluación se determinó hacer una medición de seguimiento un año después, en el 2012, para así permitir una acumulación de inversiones como la planeada originalmente. Cabe aclarar que el nivel de inversiones no depende del aporte del programa (sus desembolsos) sino en la asignación presupuestaria de México
Observaciones:	A nivel de resultados, no hay mediciones debido a que la línea de base de la evaluación de impacto--experimental--fue relevada en el 2009, y solo en el 2012 se realizaría el segundo levantamiento. Por tanto es probable que el proyecto se termine de desembolsar y que haya que esperar un tiempo para verificar el impacto de los 3 indicadores que aquí se listan.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Valor inmobiliario por m2 de los predios beneficiados en los polígonos, con relación al grupo de control definido para ese polígono.	valor inmobiliario del m2	917,00	2009	P A				0,00
Índice de capital social en grupo tratamiento	índice de capital social	0,49	2009	P A				0,00
Índice de disponibilidad equipamiento urbano básico (pavimento, alumbrado, banquetas y electricidad) en los polígonos de tratamiento	índice de disponibilidad calculado a partir de la encuesta multitemática de hogares	0,35	2009	P A				0,00
Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua entubada, drenaje y electricidad) en grupo de tratamiento	índice de disponibilidad	0,73	2009	P A				0,00
Índice de capital social en grupo de control	índice de capital social	0,50	2009	P A				0,00
Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua entubada, drenaje y electricidad) en grupo de control	Índice de disponibilidad de servicios básicos	0,79	2009	P A				0,00
Índice de disponibilidad de equipamiento urbano básico (pavimento, alumbrado, banquetas y electricidad) en los polígonos de control	Índice de disponibilidad de equipamiento urbano básico	0,42	2009	P A				0,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1: Desarrollo Social y Comunitario									
Inmuebles apoyados por habitat para la prestación de servicios sociales	inmuebles	306,00	306,00		951,00		3.933.000,00		19.000.000,00
Zona de atención prioritaria (ZAPU) atendidos por el Programa Habitat que cuentan al menos con una contraloría social	zonas de atención	596,00	596,00		690,00		491.000,00		1.200.000,00
Municipios que cuentan con un diagnóstico comunitario	Gobiernos	37,00	37,00		102,00		492.000,00		1.200.000,00
Componente 2: Mejoramiento del Entorno Urbano									
Metros cuadrados construidos o rehabilitados de pavimentación (concreto hidráulico, asfalto, mixto, reconstrucción)	M2 de pavimentación	4.778.000,00	4.778.000,00		12.000.000,00		21.513.000,00		30.000.000,00
Metros lineales de agua potable construida o rehabilitada	metros lineales	315.650,00	315.650,00		540.000,00		16.134.000,00		20.000.000,00
Metros lineales de drenaje y alcantarillado, construidos o rehabilitados	metros lineales	440.431,00	440.431,00		540.000,00		10.756.000,00		20.000.000,00
Metros lineales de electrificación construida o rehabilitada	metros lineales	29.969,00	29.969,00		80.000,00		16.134.000,00		15.000.000,00
Luminarias instaladas	luminarias	12.848,00	12.848,00		48.000,00		16.134.000,00		10.000.000,00
Municipios que han incorporado o realizado acciones de mejoramiento del entorno	Gobiernos	20,00	20,00		200,00		16.134.000,00		10.000.000,00
Municipios que han realizado acciones para la gestión integral de riesgo de riesgo de desastres	Gobiernos	65,00	65,00		240,00		10.756.000,00		10.000.000,00
Componente 3: Promoción del Desarrollo Urbano									
Proyectos apoyados para la instalación o fortalecimiento de instancias locales de planificación	instalaciones	25,00	25,00		60,00				5.000.000,00
Municipios que participan en Habitat con planes o programas de desarrollo	Gobiernos	40,00	40,00		150,00				5.000.000,00
Componente 4: Apoyo a la Gestión									
Municipios que participan en Hábitat que han elaborado perfiles ejecutivos para todas las ZAPU intervenidas, con estimación de las brechas en términos de infraestructura, mobiliario urbano, necesidades de mejora del entorno y servicios sociales	Gobiernos	1.136,00	1.136,00		4.086,00				700.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ME-L1019 - Programa Multifase de Atención a la Pobreza Urbana. Fase II
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 28/04/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Municipios que participan en Hábitat que solicitaron apoyo para proyectos de asistencia técnica	Gobiernos	6,00	3,00		120,00				700.000,00
Componente 5: Evaluacion del Programa									
Linea de base levantada para los indicadores de Marco Logico	linea de base				1,00				1.100.000,00
Levantamiento de Segunda Ronda del Programa realizado	levantamiento				1,00				1.100.000,00
TOTAL							112.477.000,00		150.000.000,00
