
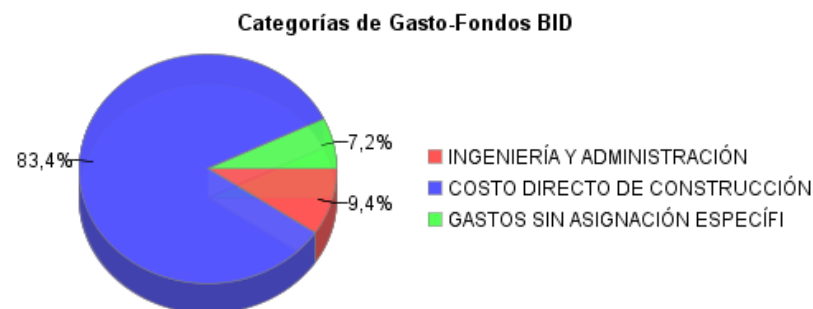
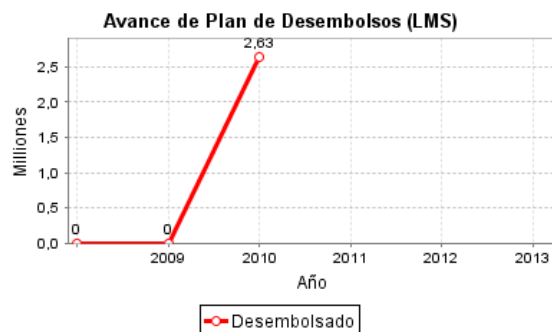



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.		
Sector:	ENERGY-POWER LINES		
Número(s) de Préstamo:	2024/OC-PN	Monto Aprobado Actual:	12.500.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	2.632.551,58
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	21,06
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	9.867.448,42
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	12.500.000,00
		Actual BID:	12.500.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	12.500.000,00
		Estimado Original:	25.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 14, 2011 Validado por Representante de País: Apr 15, 2011

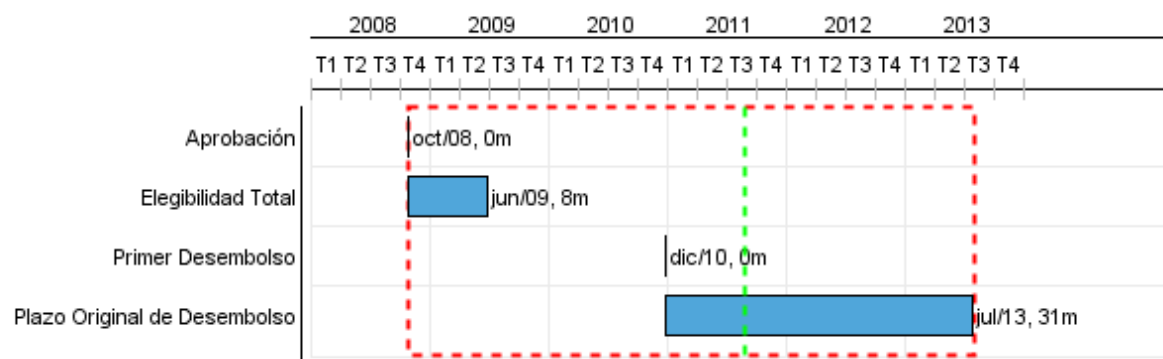

Progreso Acumulado al 2010

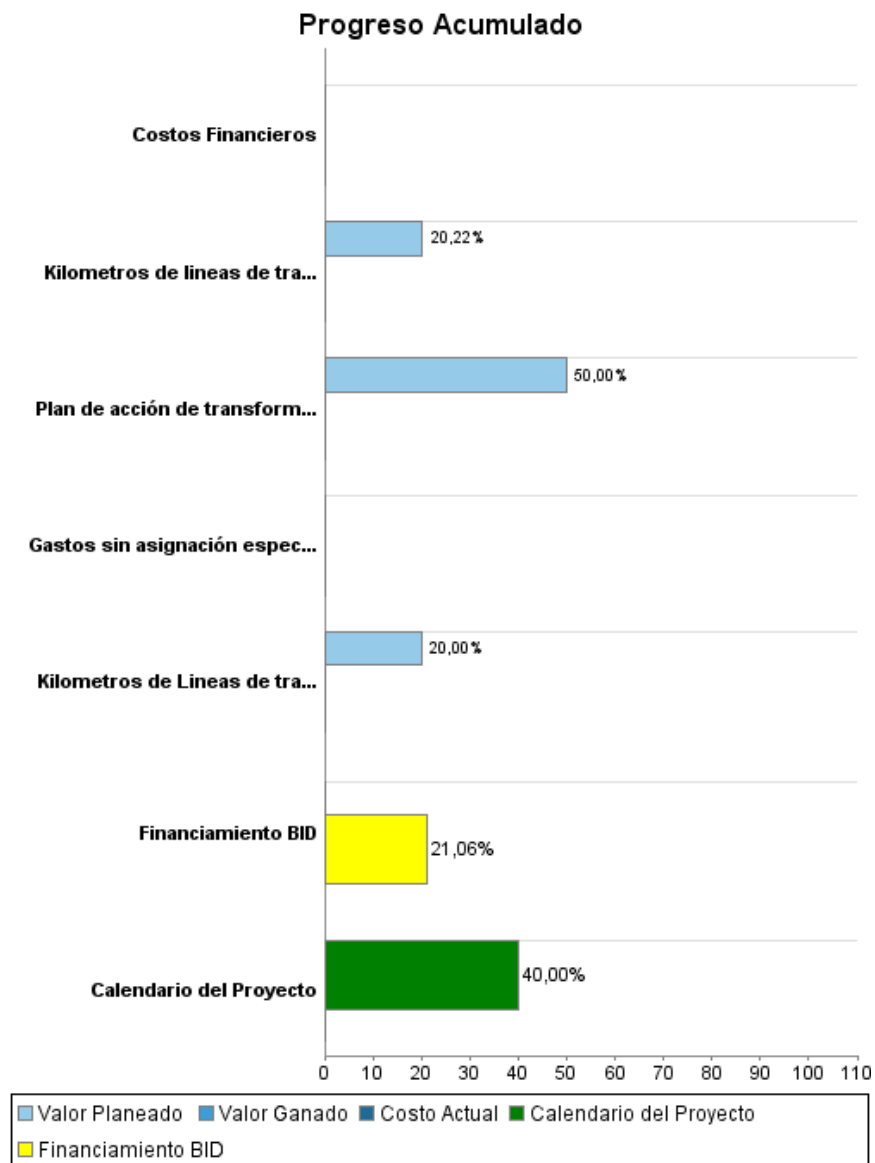

Resultados

Resultado:	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
Supuestos:	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional incrementada.	Gwh	8.412,90	2008	P	8.881,90
				A	
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional incrementada.	MW	1.356,50	2008	P	1.431,20
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II									
Kilometros de Lineas de transmisión construidas (Proyecto Colón Fase II)	Kilometers				48,00	2.510.000,00			12.550.000,00
Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers				121,00	1.826.000,00			9.030.000,00
Componente 2 - Actividades de transformación corporativa									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan				1,00	50.000,00			100.000,00
Gastos sin asignación específica	Global								1.810.000,00
Costos Financieros	Global								1.510.000,00
TOTAL						4.386.000,00			25.000.000,00
