
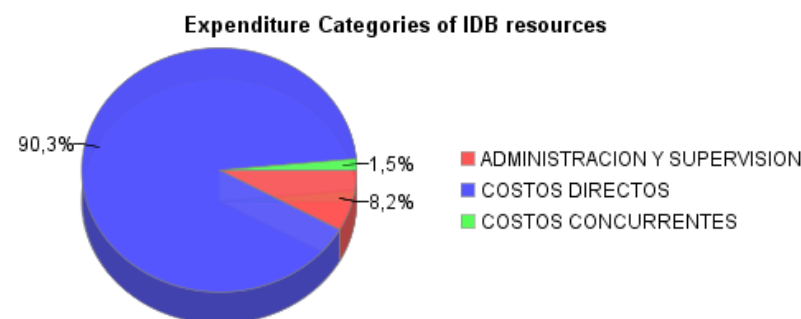
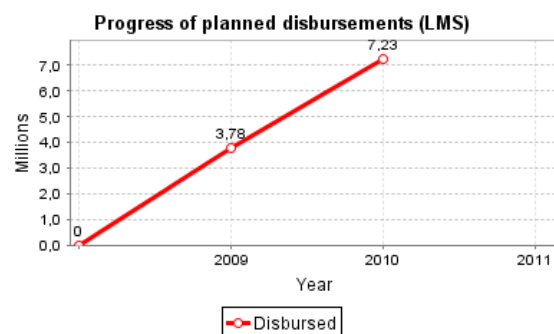



Summary Report

| Basic Data | | Available Funds (US\$) | | Total Cost and Source | |
|------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION ARGENTINA | | | | |
| Sector: | TOURISM-DEVELOPMENT & MNGMT TOURISM DESTIN | | | | |
| Loan Number(s): | 1648/OC-AR | Current Approved Amount: | 33.000.000,00 | Original IDB: | 33.000.000,00 |
| Stage: | Approved | Disbursed Amount to Date: | 14.659.039,61 | Current IDB: | 33.000.000,00 |
| Operation Type: | INV - Investment | % Disbursed: | 44,42 | Pari-passu: | 64,63 |
| Related Operation(s): | | Balance: | 18.340.960,39 | Co-Financing/Country: | 23.000.000,00 |
| Operation Subtype: | ESP - Specific Investment Operation | | | Original Estimate: | 56.000.000,00 |
| | | | | Amortization Period (months): | 162 |


| Project Environmental and Social Impact Category | Reformulation | Validation |
|---|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B | () Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: Mar 22, 2011 Validated by Country Representative: Apr 26, 2011 |

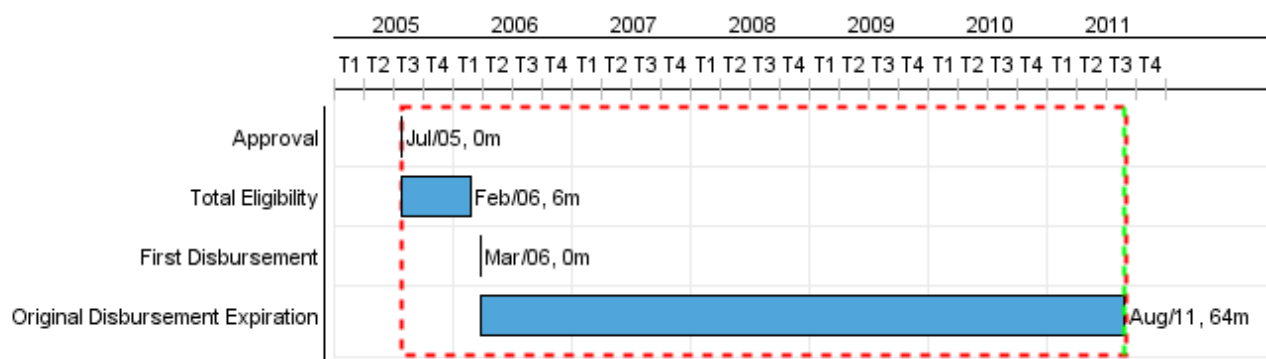

Accumulated Progress as of 2010

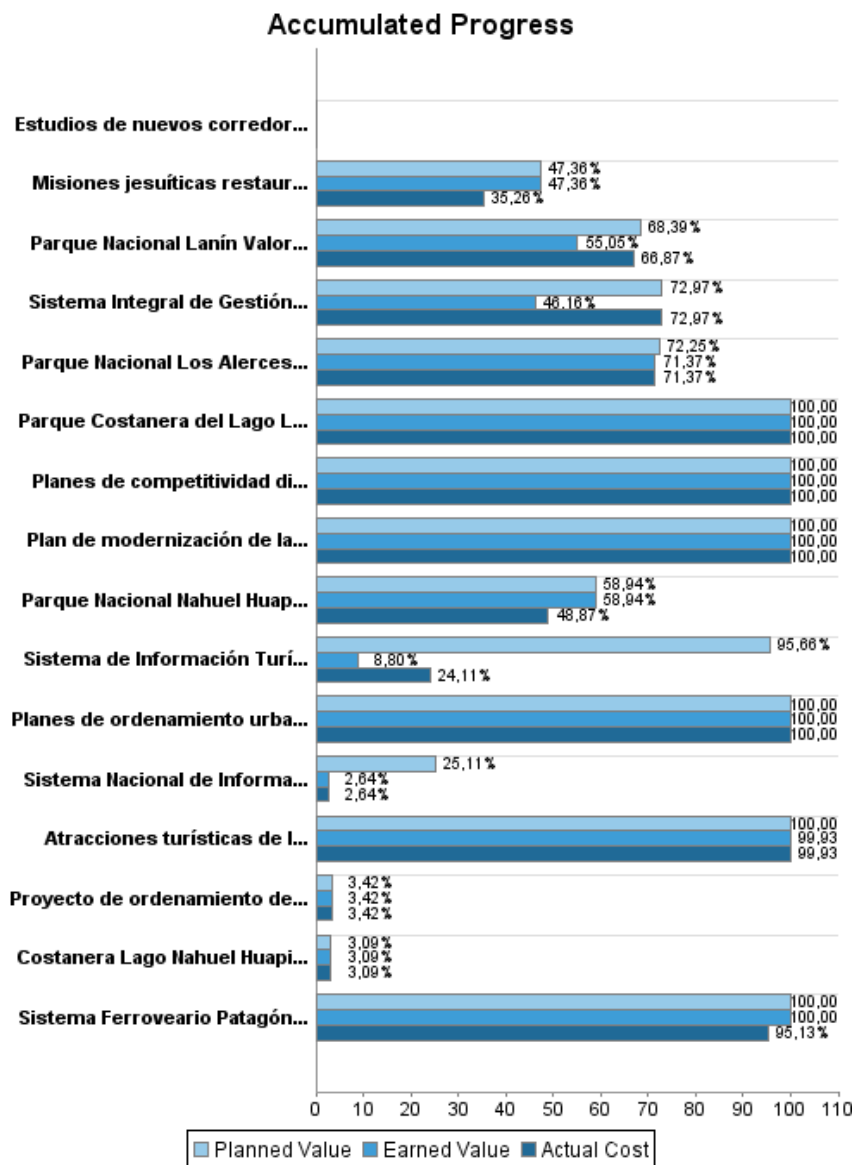

Accumulated Progress

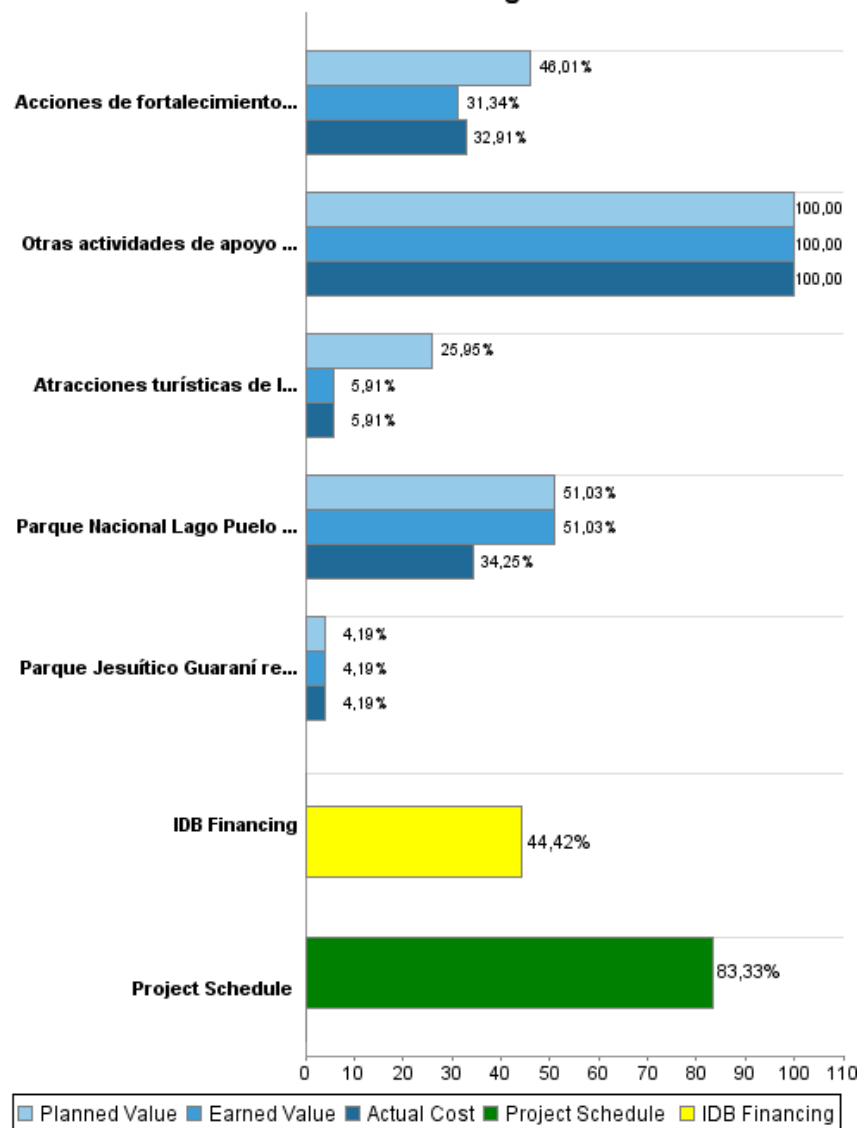

Outcomes

Outcome: Generación de divisas provenientes de la actividad turística en los Corredores de los Lagos e Iguazú-Misiones incrementada.

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2010 | End of project |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|--------------------------|----------------|
| Visitantes a Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Esquel | visitantes | 990.250,00 | 2004 | P A | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| Ingresos generados por los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi-Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. | US\$ | 1.130.000,00 | 2004 | P A | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| Visitantes a San Ignacio Miní, en el área de las Misiones Jesuíticas Guaraníes. | visitantes | 202.831,00 | 2004 | P A | 368.400,00 113.120,00 | 368.400,00 |
| Tarifa de entrada para visitante extranjero a las Misiones Jesuíticas. | US\$ | 4,00 | 2004 | P A | 5,30 7,50 | 5,30 |
| Ingresos totales provenientes de recaudación de uso (pasajeros), servicios especiales y concesiones del Viejo Expreso Patagónico. | US\$ | 224.160,00 | 2004 | P A | 991.600,00 | 991.600,00 |

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|--|--------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Valorización y gestión de atracciones turísticas públicas | | | | | | | | | |
| Parque Nacional Lanín Valorizado | Obras | 7,00 | 2,00 | | 13,00 | 650.000,00 | 596.998,00 | | 3.480.273,00 |
| Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Arrayanes valorizados | Obras | 10,00 | 10,00 | | 22,00 | 1.000.000,00 | 460.674,00 | | 5.358.083,00 |
| Parque Nacional Los Alerces valorizado | Obras | | | | 11,00 | 72.000,00 | 52.586,00 | | 2.216.055,00 |
| Parque Nacional Lago Puelo valorizado | Obras | 1,00 | 1,00 | | 5,00 | 460.000,00 | 117.262,00 | | 2.042.226,00 |
| Atracciones turísticas de la provincia de Misiones valorizadas | Obras | | | | 4,00 | 289.222,00 | 45.667,00 | | 1.215.407,00 |
| Atracciones turísticas de la provincia del Neuquén valorizadas | Obras | | | | 5,00 | 25.000,00 | 24.319,00 | | 1.007.731,00 |
| Atracciones turísticas de la provincia de Río Negro valorizadas | Obras | | | | 2,00 | | | | 200.000,00 |
| Atracciones turísticas de la provincia del Chubut valorizadas | Obras | | | | 11,00 | | | | 801.801,00 |
| Sistema Ferrovieario Patagónico La Trochita restaurado | Expresos recondicionados | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 170.000,00 | 72.478,00 | | 2.004.404,00 |
| Parque Costanera del Lago Lácar construido | Parques costeros | | | | 1,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 1.559.517,00 |
| Acceso a Cerro Catedral mejorado | Accesos | | | | 1,00 | | | | 1.351.674,00 |
| Misiones jesuíticas restauradas (San Ignacio Mini y Santa Ana) | Misiones | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | 600.000,00 | 232.018,00 | | 3.039.676,00 |
| Parque Jesuítico Guaraní rehabilitado y ampliado | Parques | | | | 1,00 | 43.686,00 | 43.686,00 | | 1.043.686,00 |
| Costanera Lago Nahuel Huapi construida | Costaneras | | | | 1,00 | 27.692,00 | 27.692,00 | | 2.063.721,00 |
| Parque lineal Pocahullo construido | Parques | | | | 1,00 | | | | 2.017.676,00 |
| Proyecto de ordenamiento del entorno de las ruinas de San Ignacio implementado | Reordenamientos | | | | 1,00 | 70.757,00 | 70.757,00 | | 2.070.757,00 |
| Apoyo a la estructuración y promoción de los corredores | | | | | | | | | |
| Planes de competitividad diseñados (Corredor Los Lagos y Corredor Iguazú-Misiones) | Planes | | | | 2,00 | | | | 278.164,00 |
| Acciones de fortalecimiento, capacitación y sensibilización realizadas | Proyectos | 1,00 | | | 5,00 | 125.000,00 | 13.376,00 | | 852.081,00 |
| Sistema de Información Turística (SITU) implementado | Sistemas | 1,00 | | | 1,00 | 300.000,00 | 52.896,00 | | 345.386,00 |
| Planes de ordenamiento urbano elaborados | Planes | | | | 15,00 | | | | 167.659,00 |
| Estudios de nuevos corredores completados | Estudios | | | | 5,00 | | | | |
| Otras actividades de apoyo a la estructuración y promoción de los corredores | Actividades | 1,00 | 1,00 | | 7,00 | | | | 796.600,00 |

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|---|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Fortalecimiento de la administración turística nacional | | | | | | | | | |
| Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGINA) implementado | Sistemas | 1,00 | | | 2,00 | 297.462,00 | 297.462,00 | | 1.109.694,00 |
| Plan de modernización de la gestión de los Recursos Humanos de la SECTUR implementado | Planes | | | | 4,00 | 60.201,00 | 60.201,00 | | 321.361,00 |
| Sistema Nacional de Información Turística (SITA) desarrollado | Sistemas | | | | 1,00 | 300.000,00 | | | 1.335.242,00 |
| Administración, auditoría y costos financieros | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.641.020,00 | 2.318.072,00 | | 36.678.874,00 |
