
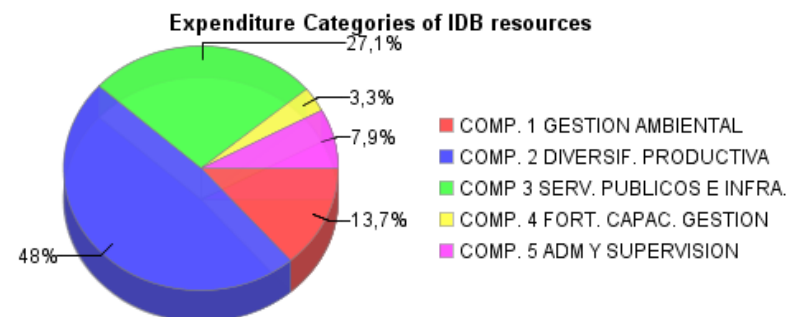
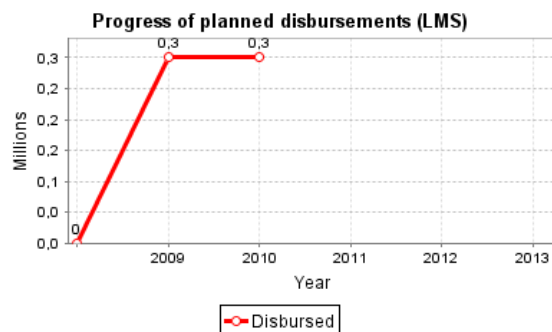



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	1566/OC-CR	Current Approved Amount:	9.220.000,00	Original IDB:	9.220.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	300.000,00	Current IDB:	9.220.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	3,25	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):		Balance:	8.920.000,00	Co-Financing/Country:	2.780.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	12.000.000,00
				Amortization Period (months):	150

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 14, 2011 Validated by Country Representative: Apr 20, 2011

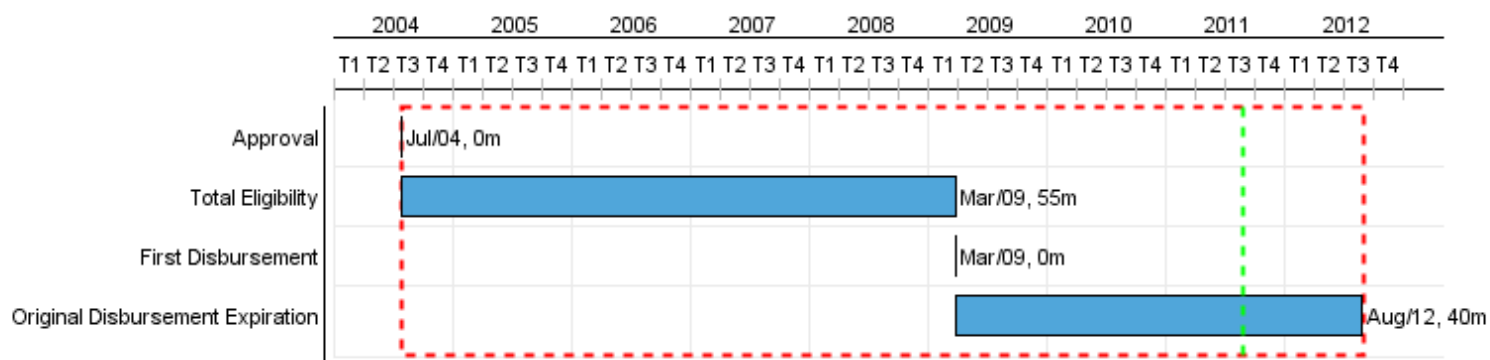

Accumulated Progress as of 2010

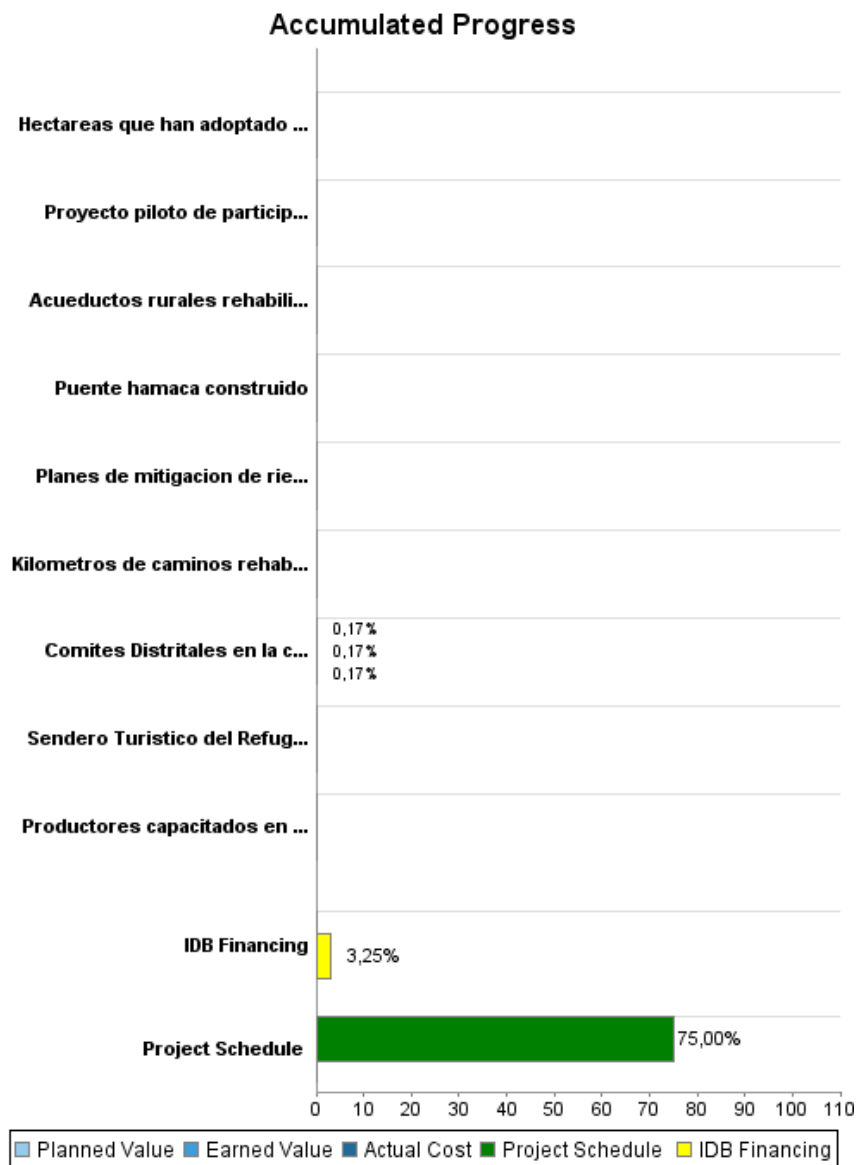

Outcomes

Outcome: Estructura productiva diversificada garantizando la sostenibilidad y el aumento del ingreso.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2013	End of project
Porcentaje poblacion ocupada en agricultura.	%	81,00	2004	P	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
				A	81,00	81,00			
Tasa de cobertura forestal	%	75,00	2004	P	75,00	75,00	73,00	73,00	73,00
				A	75,00	75,00			
Produccion de platano	cajas por hectarea por año	588,00	2004	P	588,00	588,00	588,00	700,00	700,00
				A	588,00	588,00			

Outcome: Niveles de cobertura de servicios basicos y accesabilidad a transporte mejorados.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2013	End of project
Porcentaje poblacion sin acceso a agua potable en la cuenca alta	%	83,00	2004	P	83,00	83,00	83,00	45,00	45,00
				A	83,00	83,00			
Porcentaje poblacion sin acceso a agua potable en la cuenca media	%	47,00	2004	P	47,00	47,00	47,00	35,00	35,00
				A	47,00	47,00			
Porcentaje poblacion sin acceso a agua potable en la cuenca baja	%	13,00	2004	P	13,00	13,00	13,00	11,00	11,00
				A	13,00	13,00			

Outcome: Acceso a transporte mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2013	End of project
Cambio porcentual en tiempos de transporte.	%		2004	P			10,00	20,00	20,00
				A					

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1. Gestión Ambiental, Manejo de los Recursos Naturales y Reducción de la Vulnerabilidad									
Sendero Turístico del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo completado.	sendero				1,00				680.000,00
Proyecto piloto de participación comunitaria en protección Parque Internacional La Amistad completado.	proyecto piloto				1,00				210.000,00
Planes de mitigación de riesgos implementados	planes				3,00				550.000,00
2. Diversificación Productiva.									
Hectareas que han adoptado sistemas agroforestales o cultivos no tradicionales	hectareas				500,00				4.200.000,00
Productores capacitados en diversificación productiva y ambientalmente sostenible.	productores				300,00				630.000,00
3- Servicios públicos e infraestructura básica.									
Puente hamaca construido	puente hamaca				1,00				100.000,00
Kilometros de caminos rehabilitados.	km				30,00				1.350.000,00
Acueductos rurales rehabilitados o construidos	acueductos rurales				10,00				1.360.000,00
4- Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión.									
Comites Distritales en la cuenca del rio sixaola creados y operativos.	comites distritales	3,00	3,00		3,00		795,00		460.000,00
Otros costos adicionales									
Costos financieros									
TOTAL							795,00		9.540.000,00
