
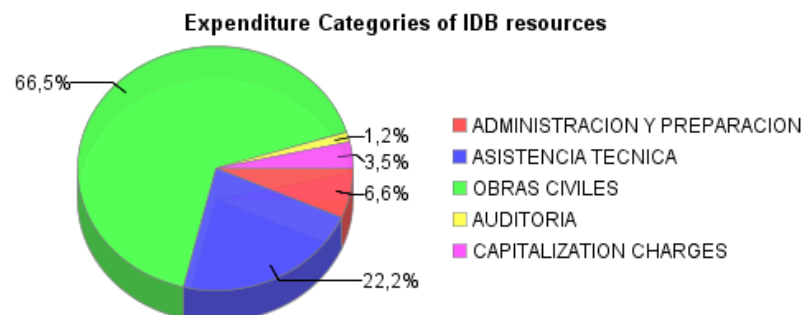
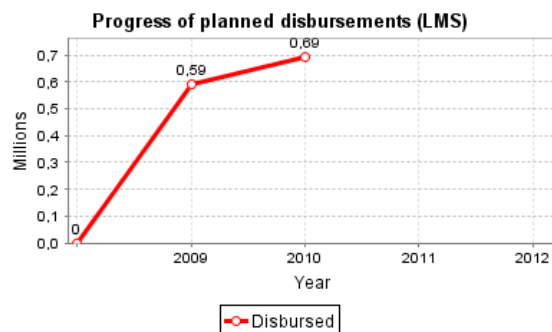



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL				
Sector:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY				
Loan Number(s):	1793/SF-HO	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	812.827,35	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	2,71	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	TC0203009	Balance:	29.187.172,65	Co-Financing/Country:	2.540.000,00
Operation Subtype:	SUP - Supplementary Financing			Original Estimate:	32.540.000,00
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 20, 2011 Validated by Country Representative: Apr 25, 2011

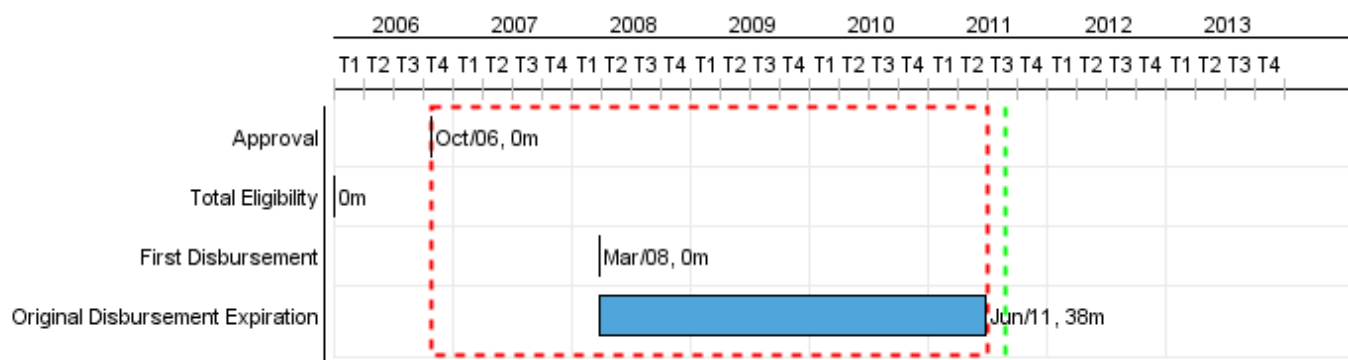

Accumulated Progress as of 2010

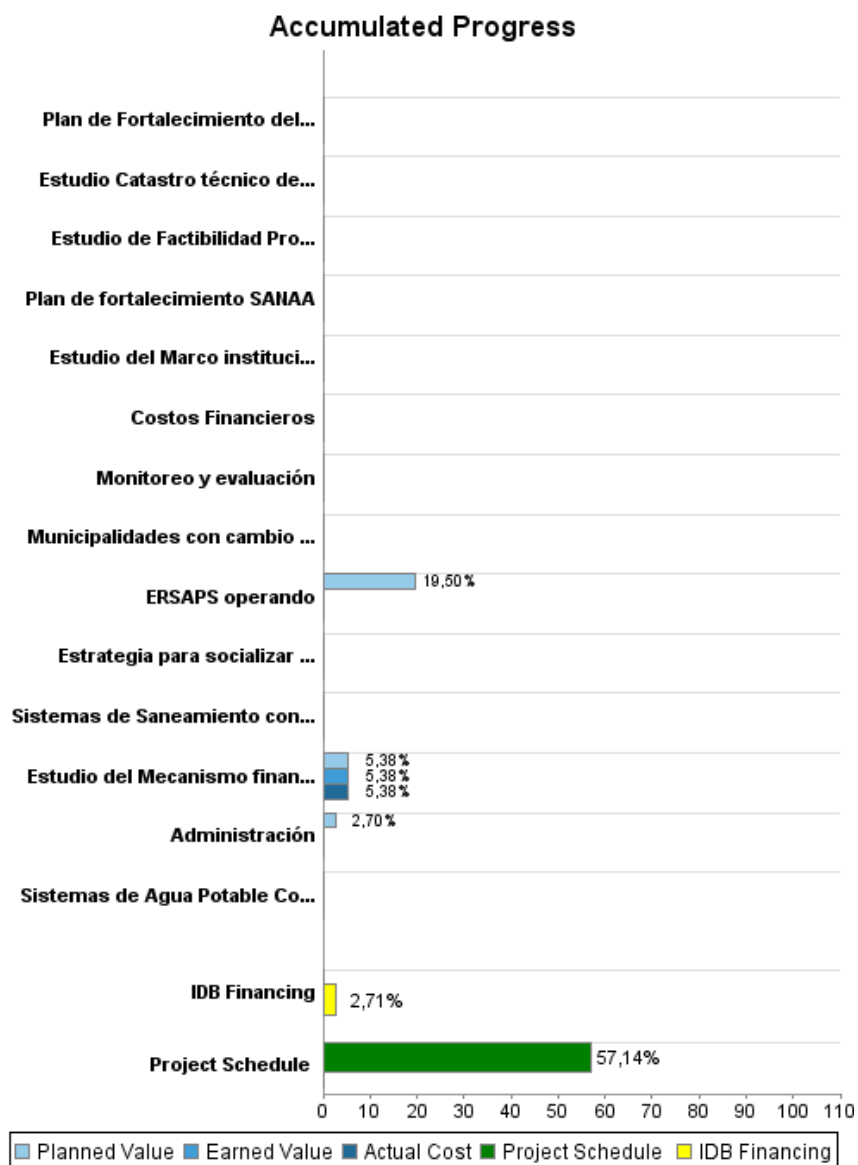

Outcomes

Outcome:	Cobertura de agua potable incrementada o mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos
Suppositions:	1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	2012	2013	2014	End of project
Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable	hogares		2009	P A					11.470,00	11.470,00

Outcome:	Cobertura de saneamiento incrementada o mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos
Suppositions:	1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	2012	2013	2014	End of project
Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado	hogares		2011	P A			1.315,00		7.379,00	8.694,00

Outcome:	Operadores de servicios de agua potable y saneamiento operando de acuerdo a normativas locales
Suppositions:	1. Las municipalidades están dispuestas a asumir las responsabilidades de la administración de los servicios de acuerdo a la Ley Marco. 2. El gobierno mantiene su propósito de reformar el sector.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	2012	2013	2014	End of project
Operadores de Sevicios de Agua Potable y Saneamiento opererando de acuerdo a normativa de Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento	Operadores		2010	P A			9,00		21,00	21,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I: Asistencia Tecnica para el cambio Institucional									
Municipalidades con cambio institucional implementado	Municipios				21,00				2.925.000,00
Plan de Fortalecimiento del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento implementado	Plan				1,00				200.000,00
Estudio del Mecanismo financiero institucional para el pago de prestaciones elaborado	Estudio				1,00	28.000,00	28.000,00		520.000,00
Estudio Catastro técnico de Red de Alcantarillado y Obras elaborado	Estudio				1,00				500.000,00
Estrategia para socializar y concertar nueva institucionalidad para los servicios de agua potable y saneamiento en el Distrito Central elaborada	Documento				1,00				240.000,00
Estudio del Marco institucional para el manejo de represas y venta en bloque de agua elaborado	Estudio				1,00				240.000,00
Estudio de Factibilidad Proyecto Río del Hombre	Estudio				1,00				500.000,00
Plan de fortalecimiento SANAA	Plan				1,00				75.000,00
Componente II. Obras Civiles construidas									
Sistemas de Saneamiento construidos	Sistemas				20,00				19.502.293,00
Sistemas de Agua Potable Construidos	Sistema				4,00				5.287.747,00
Gestión del Programa									
Monitoreo y evaluación	evaluación				2,00				150.000,00
TOTAL						28.000,00	28.000,00		30.140.040,00
