
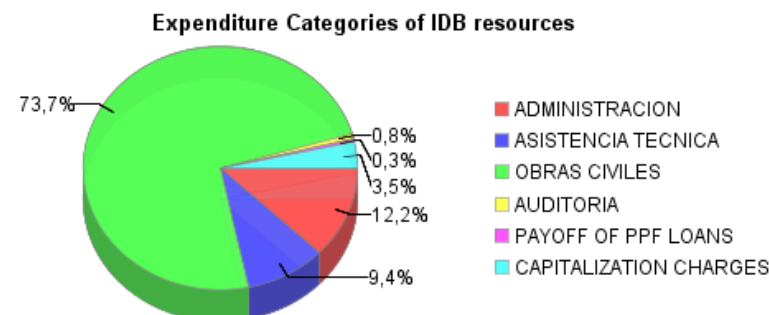
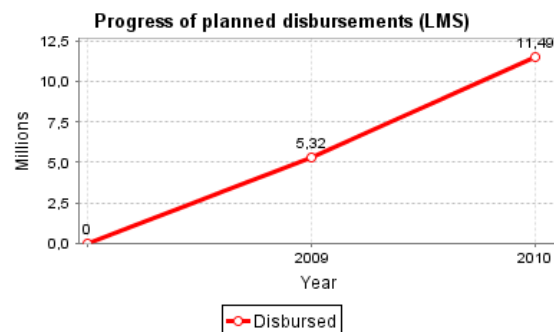


## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE FINANZAS				
Sector:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY				
Loan Number(s):	1048/SF-HO	Current Approved Amount:	26.000.000,00	Original IDB:	26.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	20.867.528,30	Current IDB:	26.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	80,26	Pari-passu:	97,56
Related Operation(s):	HO0142, HO-X1004	Balance:	5.132.471,70	Co-Financing/Country:	3.000.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	29.000.000,00
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 20, 2011 Validated by Country Representative: Apr 25, 2011

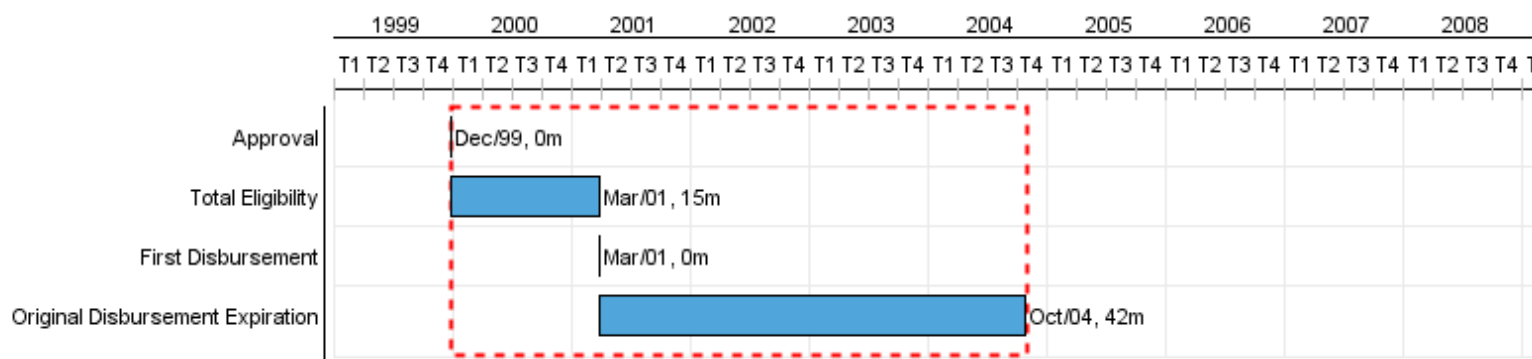

## Accumulated Progress as of 2010



## Outcomes

**Outcome:** Operadores de sistemas de agua potable y saneamiento que trabajan de manera desconcentrada de la Municipalidad incrementados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2010	2011	End of project
personas beneficiadas con servicios de agua potable	Operadores	3,00	2004	P		1,00	1,00	1,00	6,00
				A	100.000,00		6,00		

**Outcome:** Cobertura de agua potable incrementada o mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2010	2011	End of project
Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable	Hogares		2001	P			53.300,00		53.300,00
				A			53.300,00		

**Outcome:** Cobertura de saneamiento incrementada o mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2010	2011	End of project
Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado	Hogares		2001	P			18.224,00		18.224,00
				A			18.224,00		

**Outcome:** Gestión del Servicio de agua potable y saneamiento mejorado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2010	2011	End of project
Incremento de las horas de servicio diario de agua potable	%		2006	P			138,00		138,00
				A			138,00		
Incremento de la cobertura de micro medición	%		2006	P			13,08		13,08
				A			13,08		
Promedio de Mora mensual	%		2006	P			28,11		22,69
				A			22,69		
Ampliación de Cobertura de sistemas de agua potable	%		2006	P			13,52		13,52
				A			13,52		

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Asistencia Técnica</b>									
Políticas Municipales del Sector Agua y saneamiento formuladas	Modelos de Gestion				27,00	56.650,00	56.650,00		623.470,00
Operadores creados	Operadores	1,00	1,00		3,00	81.330,00	81.330,00		240.240,00
Obras diseñada	Diseños				6,00	36.010,00	36.010,00		594.070,00
<b>Obras de infraestructura</b>									
Sistemas de agua potable y/o saneamiento construidos, ampliados o rehabilitados	Obras				11,00	4.662.680,68	4.662.680,68		22.196.850,00
<b>Administración, Consultas y Preparación de Proyectos</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>4.836.670,68</b>	<b>4.836.670,68</b>		<b>23.654.630,00</b>
