
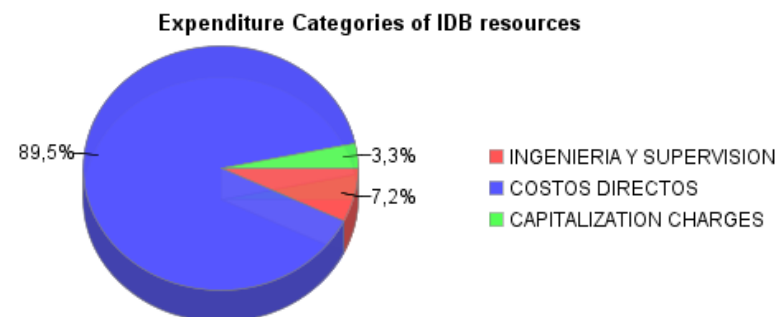
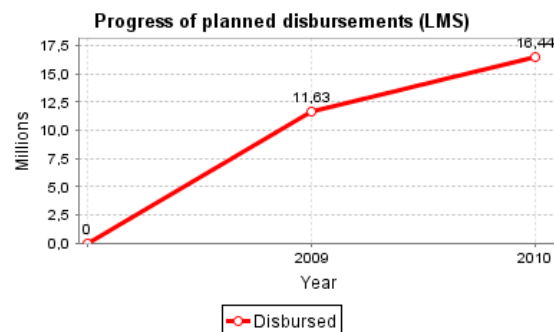



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE				
Sector:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS				
Loan Number(s):	1599/SF-NI	Current Approved Amount:	25.945.459,23	Original IDB:	40.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	25.105.368,28	Current IDB:	25.945.459,23
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	96,76	Pari-passu:	94,18
Related Operation(s):	NI-L1035	Balance:	840.090,95	Co-Financing/Country:	10.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	50.000.000,00
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 21, 2011 Validated by Country Representative: Apr 26, 2011

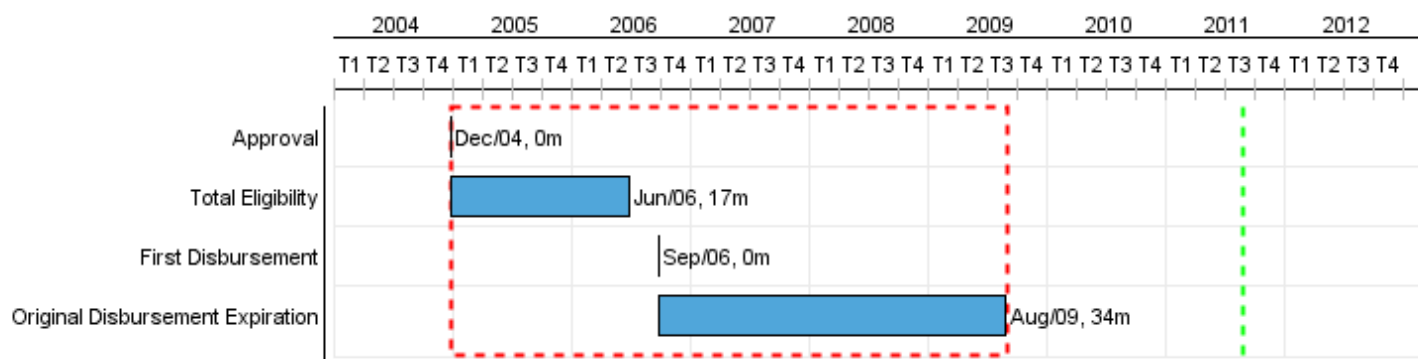

## Accumulated Progress as of 2010

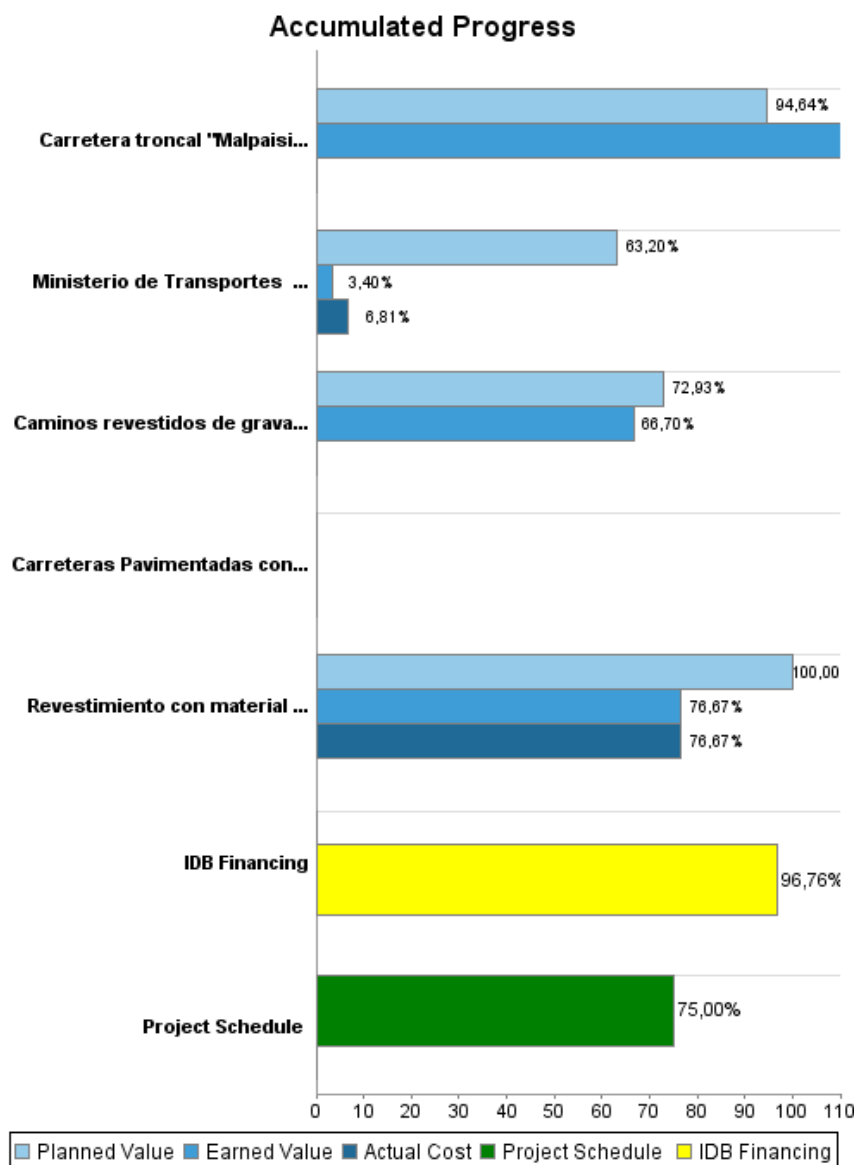

## Outcomes

**Outcome:** Usuarios de la zona del proyecto con mejores condiciones de acceso, conexión y transporte.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	End of project
Costos de operación vehicular (automóviles) en el tramo Malpasillo ¿ San Isidro, reducido	US\$/veh.km	0,30	2009	P A		0,16
Costos de operación vehicular (autobuses) en el tramo Malpasillo ¿ San Isidro, reducido	US\$/veh.km	1,90	2009	P A		0,90
Costos de operación vehicular (camiones pesados) en el tramo Malpasillo ¿ San Isidro, reducido	US\$/veh.km	1,35	2009	P A		0,70
Velocidad para los usuarios del tramo Malpasillos ¿ San Isidro (automóviles), incrementado	Km/h	30,00	2009	P A		65,00
Velocidad para los usuarios del tramo Malpasillos ¿ San Isidro (autobuses), incrementado	Km/h	28,00	2009	P A		60,00
Velocidad para los usuarios del tramo Malpasillos ¿ San Isidro (camiones pesados), incrementado	Km/h	26,00	2009	P A		60,00
Costos de operación vehicular (automóviles) en los caminos grava (Grupos I, II y III), reducido	US\$/veh.km	0,30	2009	P A		0,28
Costos de operación vehicular (autobuses) en los caminos grava (Grupos I, II y III), reducido	US\$/veh.km	2,10	2009	P A		1,90
Costos de operación vehicular (camiones pesados) en los caminos grava (Grupos I, II y III), reducido	US\$/veh.km	1,40	2009	P A		1,30

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Rehabilitación de carretera troncal pavimentada</b>									
Carretera troncal "Malpaisillo - San Isidro" con microcarpeta (ETAPA I)	Kilómetros				72,00	2.258.935,81			8.922.876,95
Carretera troncal "Malpaisillo - San Isidro", reforzada con carpeta alfáltica (ETAPA II)	Kilómetros				72,00	1.969.511,00			12.700.422,00
<b>Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas</b>									
Carreteras Pavimentadas con mantenimiento rutinario	Kilómetros		200,00		286,00				3.200.000,00
<b>Mantenimiento periódico de caminos revestidos de grava</b>									
Caminos revestidos de grava con mantenimiento periódico.	Kilómetros	58,00	20,00		225,00	521.820,57			5.484.465,12
<b>Fortalecimiento Institucional</b>									
Ministerio de Transportes e Infraestructura, fortalecido	Unidad	1,00			1,00	1.625.000,00	92.480,00		2.717.480,00
<b>Revestimiento mejorativo de caminos de grava</b>									
Revestimiento con material selecto a caminos de grava	Kilómetros				88,30	5.484.086,41	1.376.461,11		17.609.078,77
<b>TOTAL</b>						<b>11.859.353,79</b>	<b>1.468.941,11</b>		<b>50.634.322,84</b>
