
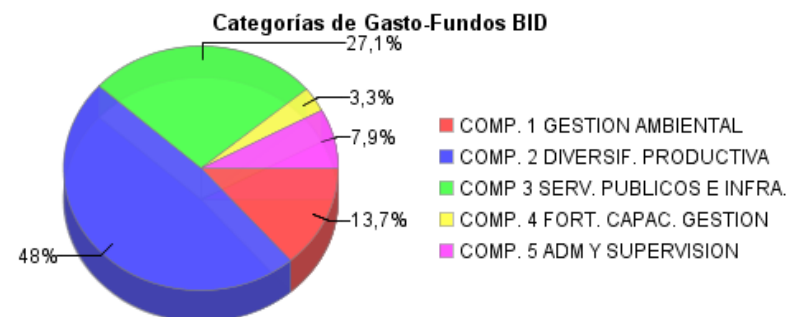
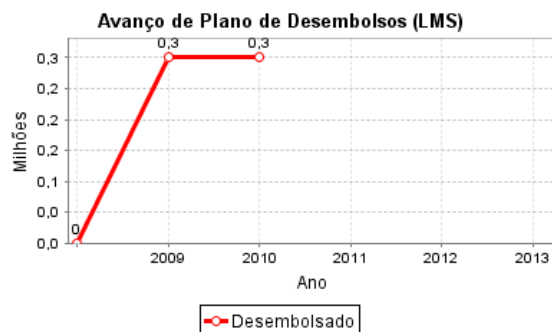



## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLÍTICA ECONOMICA				
Setor:	WATER AND SANITATION				
Número da Operação:	1566/OC-CR	Atual:	9.220.000,00	Original BID:	9.220.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	300.000,00	Corrente BID:	9.220.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	3,25	Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:		Saldo:	8.920.000,00	Cofinanciamento/País:	2.780.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	12.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	150

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 20, 2011

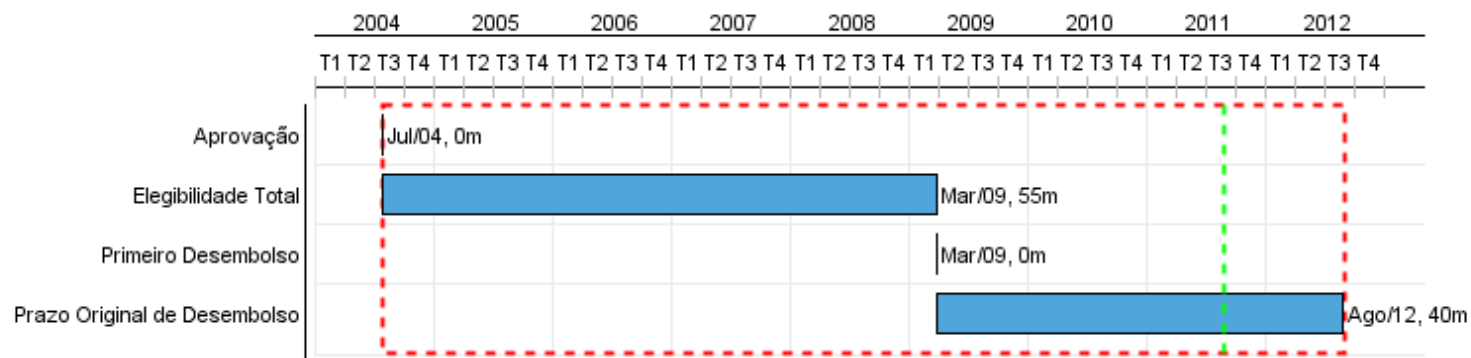

## Progresso Acumulado até 2010

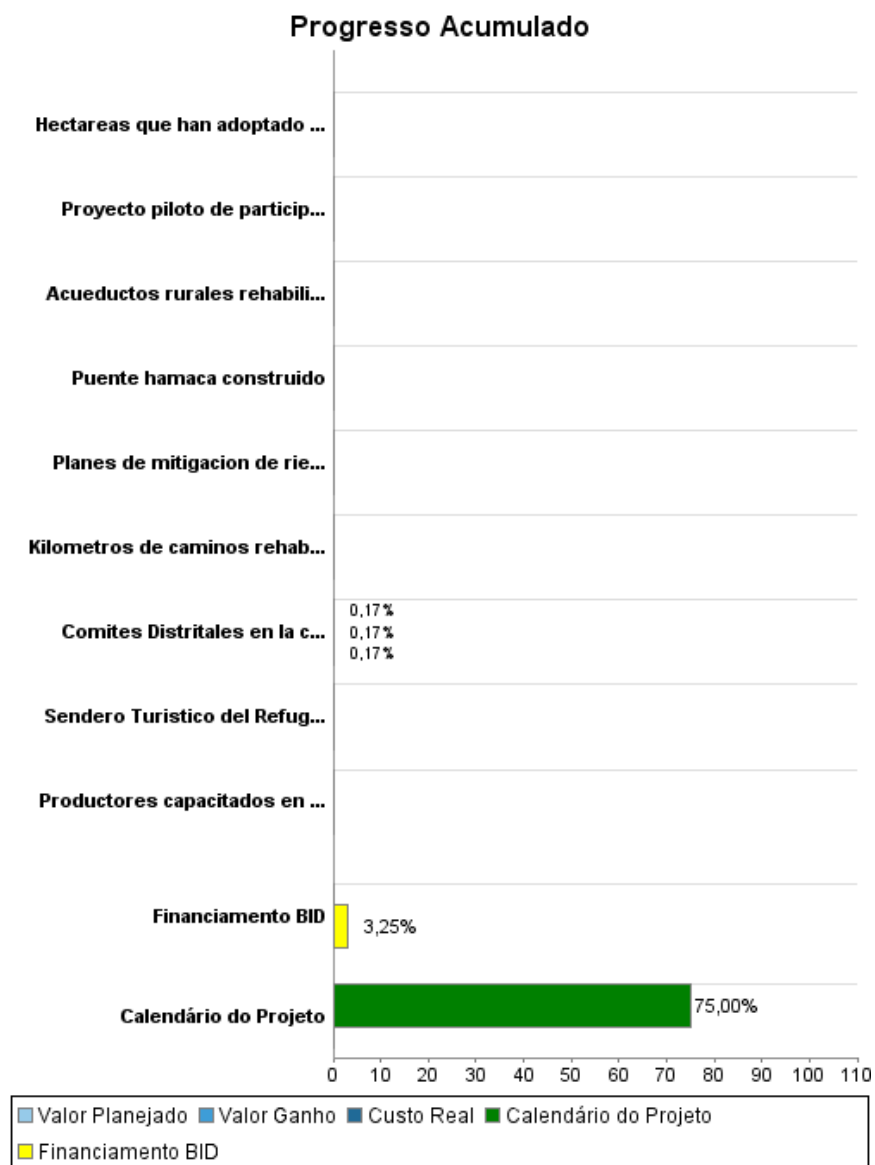

## Resultados

**Resultado:** Estructura productiva diversificada garantizando la sostenibilidad y el aumento del ingreso.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2013	Final do Projeto
Porcentaje poblacion ocupada en agricultura.	%	81,00	2004	P	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
				A	81,00	81,00			
Tasa de cobertura forestal	%	75,00	2004	P	75,00	75,00	73,00	73,00	73,00
				A	75,00	75,00			
Produccion de platano	cajas por hectarea por año	588,00	2004	P	588,00	588,00	588,00	700,00	700,00
				A	588,00	588,00			

**Resultado:** Niveles de cobertura de servicios basicos y accesabilidad a transporte mejorados.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2013	Final do Projeto
Porcentaje poblacion sin acceso a agua potable en la cuenca alta	%	83,00	2004	P	83,00	83,00	83,00	45,00	45,00
				A	83,00	83,00			
Porcentaje poblacion sin acceso a agua potable en la cuenca media	%	47,00	2004	P	47,00	47,00	47,00	35,00	35,00
				A	47,00	47,00			
Porcentaje poblacion sin acceso a agua potable en la cuenca baja	%	13,00	2004	P	13,00	13,00	13,00	11,00	11,00
				A	13,00	13,00			

**Resultado:** Acceso a transporte mejorado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2013	Final do Projeto
Cambio porcentual en tiempos de transporte.	%		2004	P			10,00	20,00	20,00
				A					

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>1. Gestión Ambiental, Manejo de los Recursos Naturales y Reducción de la Vulnerabilidad</b>									
Sendero Turístico del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo completado.	sendero				1,00				680.000,00
Proyecto piloto de participación comunitaria en protección Parque Internacional La Amistad completado.	proyecto piloto				1,00				210.000,00
Planes de mitigación de riesgos implementados	planes				3,00				550.000,00
<b>2. Diversificación Productiva.</b>									
Hectareas que han adoptado sistemas agroforestales o cultivos no tradicionales	hectareas				500,00				4.200.000,00
Productores capacitados en diversificación productiva y ambientalmente sostenible.	productores				300,00				630.000,00
<b>3- Servicios públicos e infraestrutura básica.</b>									
Puente hamaca construido	puente hamaca				1,00				100.000,00
Kilometros de caminos rehabilitados.	km				30,00				1.350.000,00
Acueductos rurales rehabilitados o construidos	acueductos rurales				10,00				1.360.000,00
<b>4- Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión.</b>									
Comites Distritales en la cuenca del rio sixaola creados y operativos.	comites distritales	3,00	3,00		3,00		795,00		460.000,00
<b>Otros costos adicionales</b>									
<b>Costos financieros</b>									
<b>TOTAL</b>							<b>795,00</b>		<b>9.540.000,00</b>
