
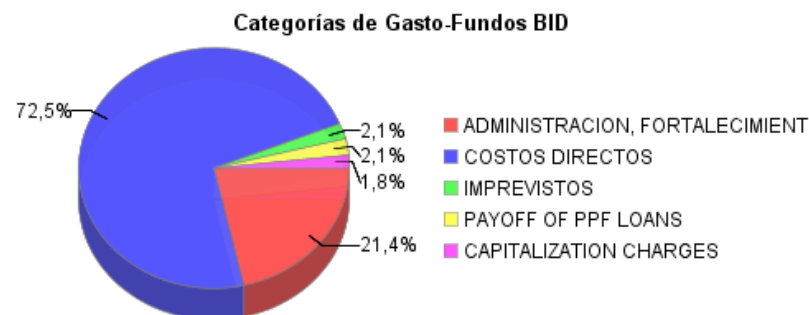
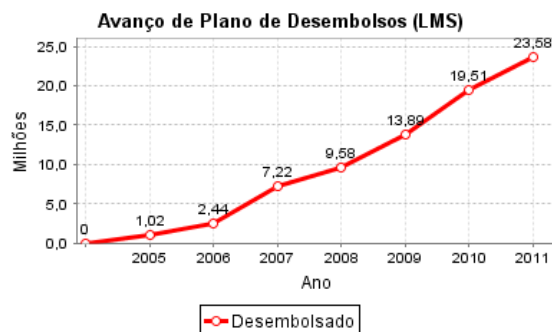



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Secretaria de Turismo - SECTUR		
Sector: TOURISM		
Número da Operação: 1623/SF-HO	Atual: 35.000.000,00	Original BID: 35.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 20.526.151,57	Corrente BID: 35.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 58,65	Pari-passu: 86,00
Operação Relacionada: TC0301053	Saldo: 14.473.848,43	Cofinanciamento/País: 5.850.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 40.850.000,00
		Período de Amortização (meses): 354


Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 1, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011

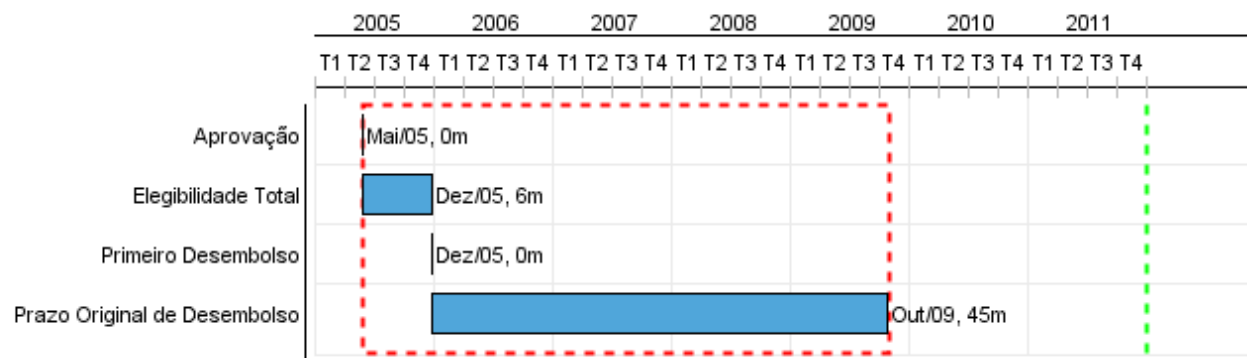

Progresso Acumulado até 2011

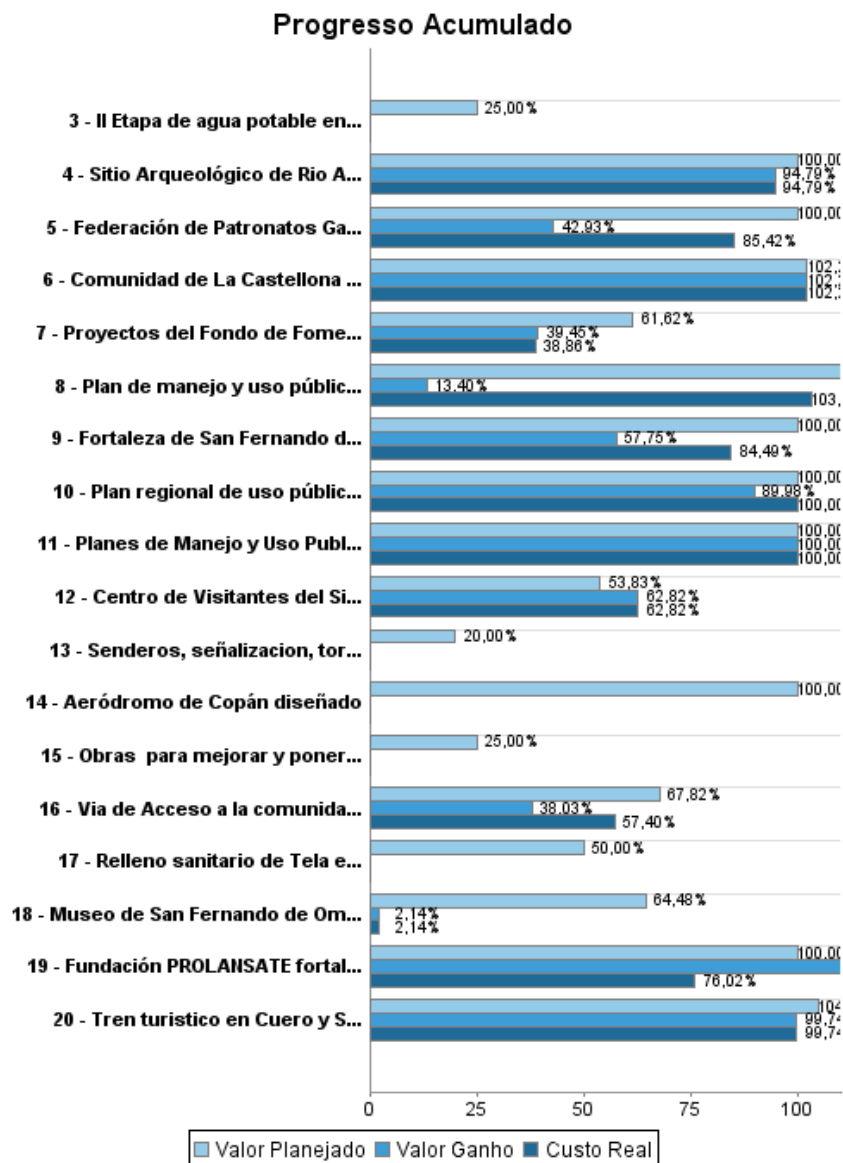

Progresso Acumulado

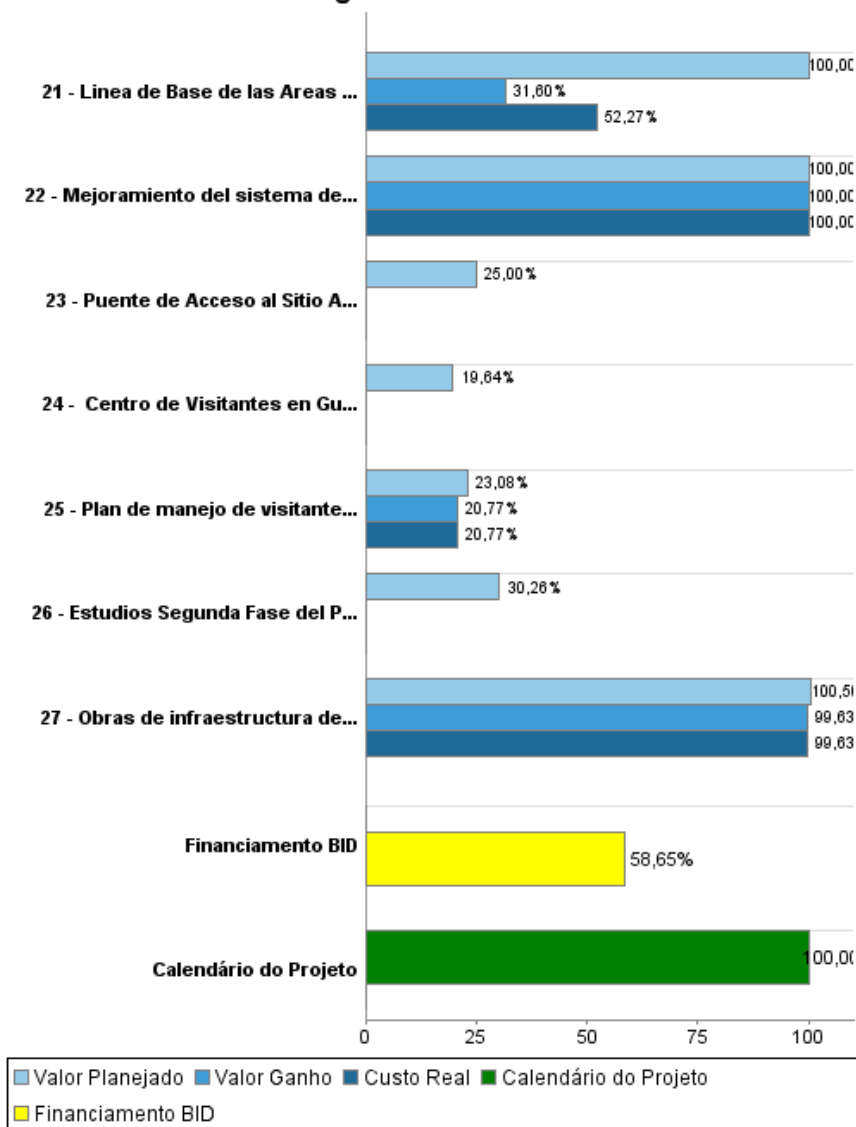

Resultados

Resultado:	Productos turísticos priorizados en las zonas de influencia del Programa consolidados y diversificados.
Suposições:	1. Autoridades mantienen la voluntad política para continuar apoyando el desarrollo del sector. 2. Agentes privados muestran interés de invertir en las zonas beneficiadas. 3. Existe coordinación entre las instituciones, municipalidades y comunidades en las intervenciones del Programa. 4. Las comunidades beneficiarias participan y se apropian de los proyectos en sus localidades.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Visitantes totales anuales logrados.	Visitantes	1.025.500,00	2004	P	1.300.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				A	1.336.600,00	1.611.200,00				
Gasto promedio ponderado del turista receptor alcanzado.	Dolares Americano al año	646,00	2004	P	680,00	703,00	715,00	730,00	745,00	730,00
				A	623,40	672,30				

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Inversiones públicas de apoyo al desarrollo del turismo sostenible/ Sub									
Componente 1.1: Mundo Maya									
Planes de Manejo y Uso Publico para el Parque Arqueologico en Rio Amarillo Elaborados	plan				1,00				53.760,00
Sitio Arqueológico de Rio Amarillo Restaurado	sitio arqueológico	1,00			1,00	74.630,00			856.870,00
Centro de Visitantes del Sitio Arqueológico en Río Amarillo construido	centro de visitantes				1,00	236.640,00	417.100,00		945.690,00
Puente de Acceso al Sitio Arqueologico de Rio Amarillo Rehabilitado	puente				1,00	184.500,00			738.010,00
Via de Acceso a la comunidad de La Castellona construida	Kilometers				275,00	141.360,00			1.757.070,00
Comunidad de La Castellona Electrificada	Kilometers				8,50		2.300,00		100.250,00
Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de La Castellona realizado	Households				81,00				431.230,00
Plan de manejo de visitantes del Parque Arqueológico en Copan Ruinas elaborado	plan				1,00	30.000,00	27.000,00		130.000,00
Aeródromo de Copán diseñado	diseño	1,00			1,00	13.000,00			13.000,00
Plan de manejo y uso público de la Fortaleza formulado	plan		1,00		1,00		11.800,00		88.050,00
Fortaleza de San Fernando de Omoa Restaurada	Fortaleza				1,00	175.240,00	97.800,00		1.407.320,00
Museo de San Fernando de Omoa Construido	museo				1,00	399.650,00	2.100,00		1.118.820,00
Componente 1: Inversiones públicas de apoyo al desarrollo del turismo sostenible/ Sub									
Componente 1.2: Inversiones Prioritarias de la Estrategia Nacional Turismo Sostenible (ENTS)									
Centro de Visitantes en Lancetilla acondicionado y equipado	Centro de Visitantes				1,00	240.630,00	14.600,00		461.730,00
Fundación PROLANSATE fortalecida.	equipamiento	1,00	2,00		1,00	43.980,00	20.000,00		100.000,00
Linea de Base de las Areas Protegidas de la Bahia de Tela Levantada	estudio	1,00			1,00	207.160,00	72.600,00		351.220,00
Senderos, señalizacion, torres de observación y otras obras del Jardin Botanico Lancetilla, Parque Nacional Jeannette Kaway y Parque Nacional Punta Izopo contruidos	obras				1,00	180.180,00			900.880,00
Plan regional de uso público y mejoramiento ambiental de playas de la costa norte formulado	plan				1,00				250.050,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Tren turístico en Cuero y Salado rehabilitado	tren				1,00		23.300,00		470.740,00
Obras Menores en las areas BC y D contenidas en el master plan paseo marítimo en Tela construídas	obras				1,00	265.930,00	77.300,00		1.401.250,00
Obras para mejorar y poner en marcha los Sistemas de Saneamiento en Islas de la Bahía construídas	obras				1,00	277.790,00			1.111.150,00
II Etapa de agua potable en Punta Gorda, Islas de la Bahía construída	Households				500,00	65.750,00			263.000,00
Centro de Visitantes en Guanaja Construído	centro de visitantes				1,00	44.000,00			224.000,00
Relleno sanitario de Tela equipado	equipamiento				1,00	450.000,00			900.000,00
Componente 2: Fomento de la Inversión Privada									
Obras de infraestructura de los Micos: (1) vías; (2) planta potabilizadora y redes de agua potable; (3) red de alcantarillado sanitario y planta de aguas negras; (4) red de alcantarillado construídas	obras				10,00		43.400,00		8.602.880,00
Federación de Patronatos Garífunas de Bahía de Tela Constituída	federación constituída	1,00			1,00	9.000,00	6.700,00		15.770,00
Proyectos del Fondo de Fomento al Turismo que benefician a micro, pequeñas y medianas empresas financiados	negocios	20,00			61,00	563.930,00	51.700,00		2.250.990,00
Gestión del Programa									
Estudios Segunda Fase del Proyecto	N/A				1,00	466.000,00			1.540.000,00
TOTAL						4.069.370,00	867.700,00		26.483.730,00
