
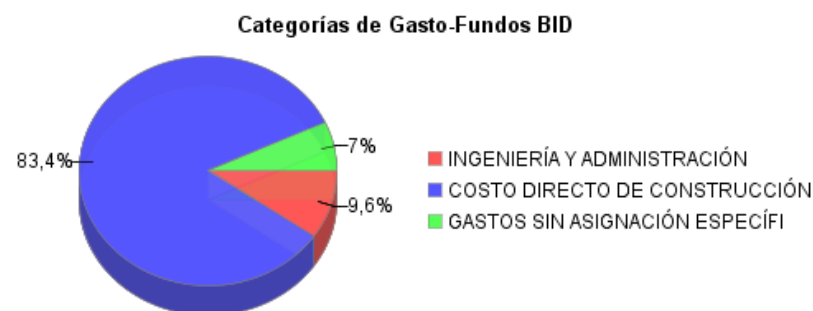
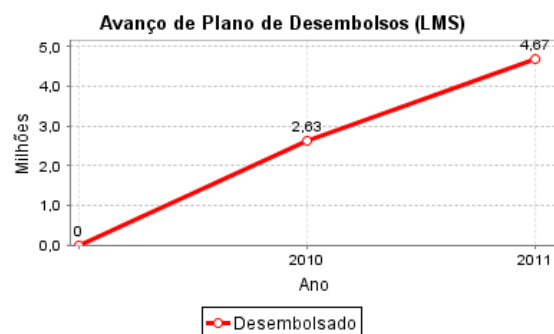



## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.		
Sector:	ENERGY-POWER LINES		
Número da Operação:	2024/OC-PN	Atual:	12.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	4.670.930,39
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	37,37
Operação Relacionada:		Saldo:	7.829.069,61
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	12.500.000,00
		Corrente BID:	12.500.000,00
		Pari-passu:	50,00
		Cofinanciamento/País:	12.500.000,00
		Original Estimado:	25.000.000,00
		Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Oct 20, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 24, 2011

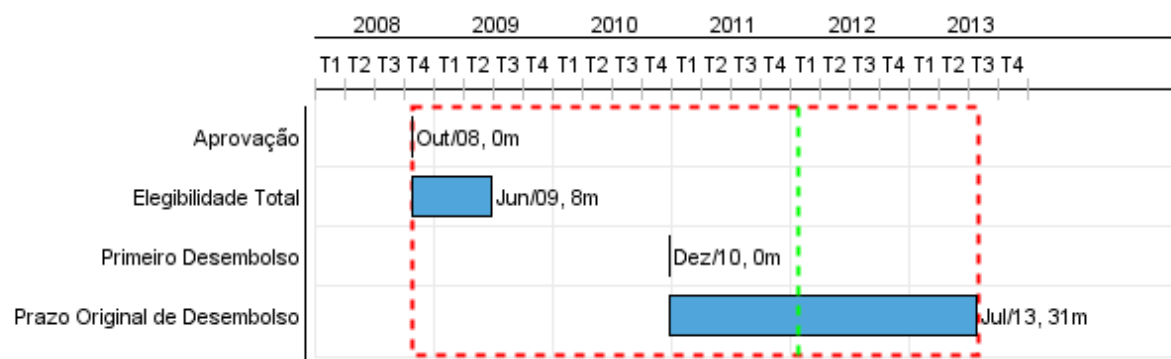

## Progresso Acumulado até 2011

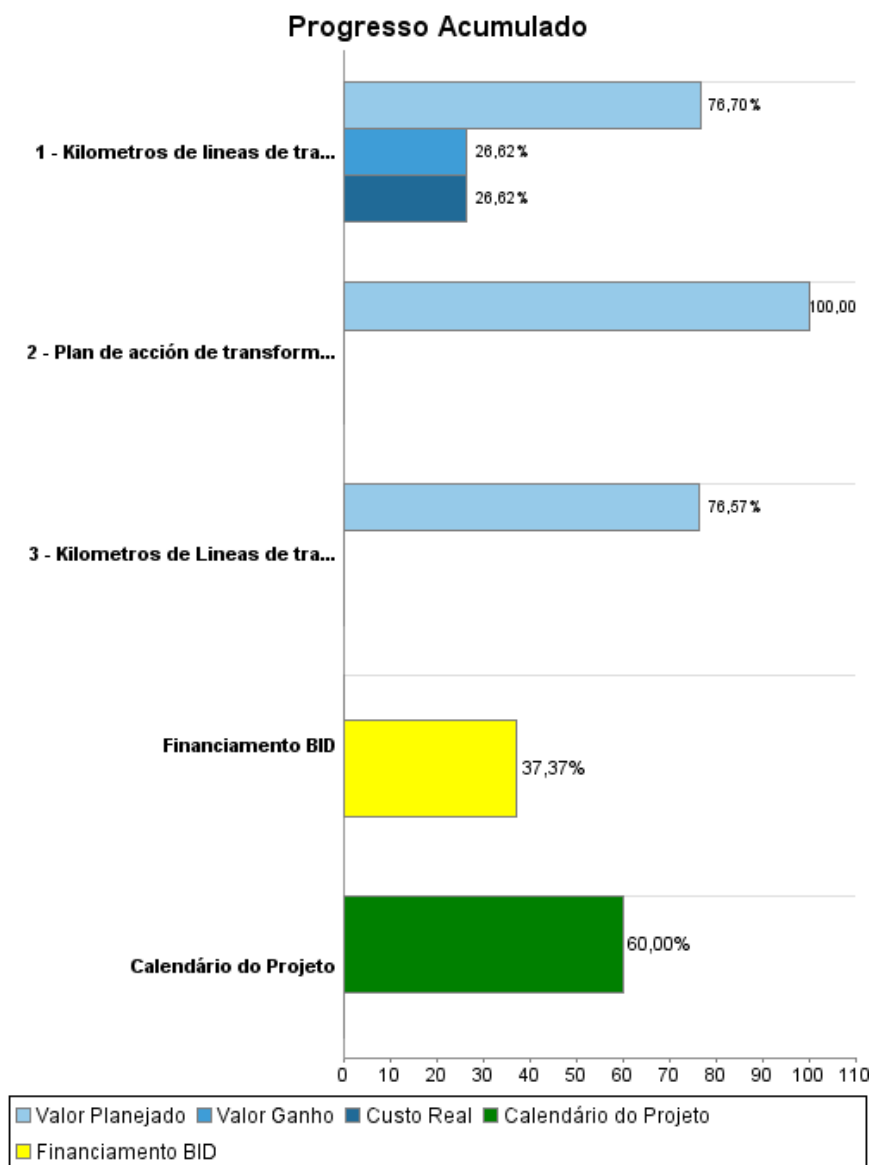

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
<b>Suposições:</b>	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional	Gwh	8.412,90	2008	P A	8.881,90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional.	MW	1.356,50	2008	P A	1.431,20

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II</b>									
Kilometros de Lineas de transmisión construidas (Proyecto Colón Fase II)	Kilometers				48,00	7.100.000,00			12.550.000,00
<b>Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola</b>									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers				121,00	5.100.000,00	2.404.100,00		9.030.000,00
<b>Componente 2 - Actividades de transformación corporativa</b>									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan				1,00	50.000,00			100.000,00
<b>Gastos sin Asignación Específica</b>									
<b>Gastos Financieros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>12.250.000,00</b>	<b>2.404.100,00</b>		<b>21.680.000,00</b>
