
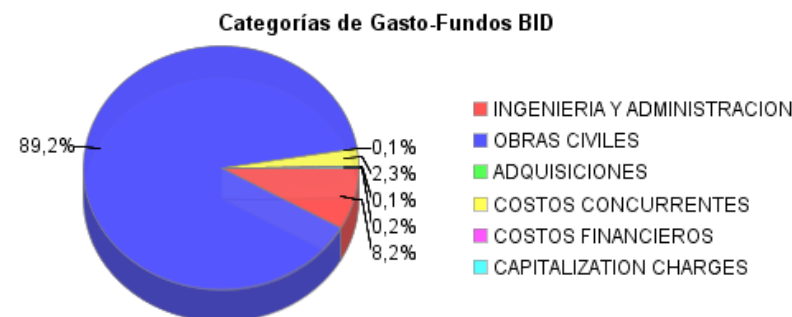
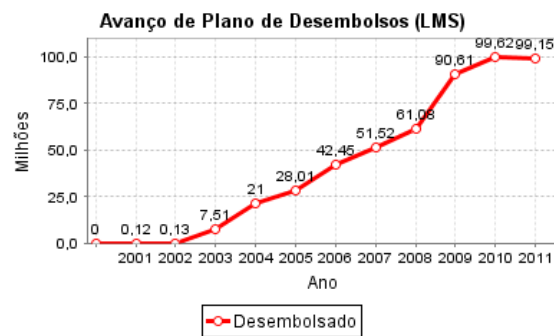



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		
Sector: TRANSPORTATION-MAJOR HIGHWAYS		
Número da Operação: 1278/OC-PR-2;1278/OC-PR-1;1278/OC-PR-1-CPS ;1278/OC-PR-2-CPS	Atual: 99.615.396,27	Original BID: 200.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 99.615.396,27	Corrente BID: 99.615.396,27
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 83,62
Operação Relacionada:	Saldo:	Cofinanciamento/País: 30.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 230.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 168

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 23, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 20, 2011

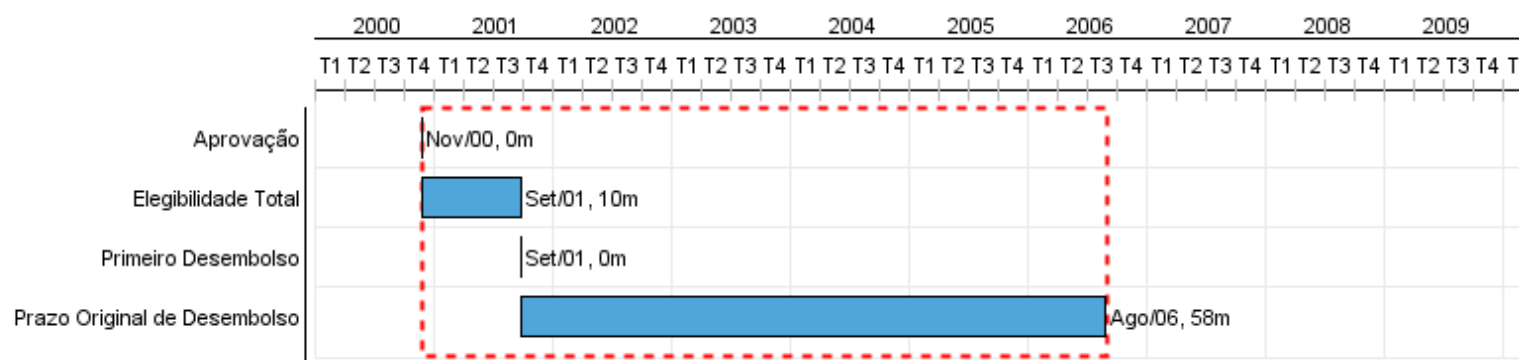

## Progresso Acumulado até 2011

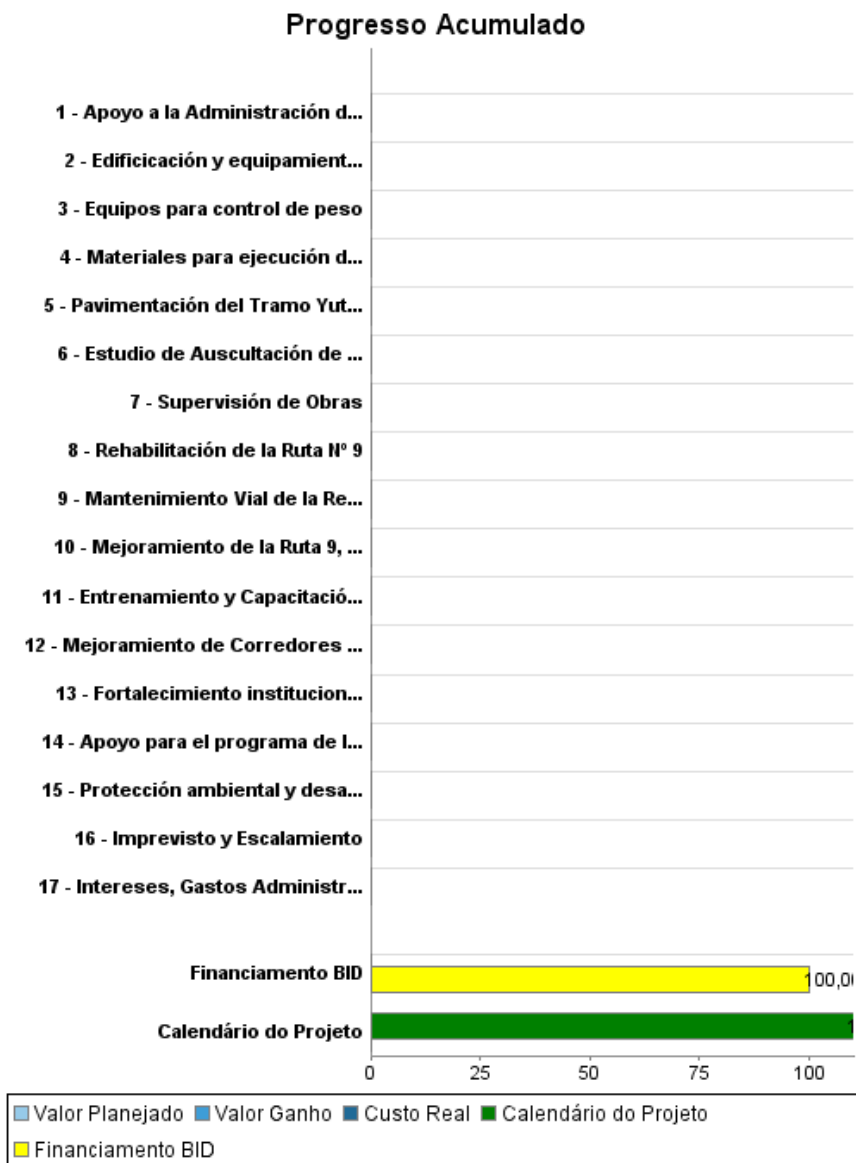

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Reducir los costos de transportes y tiempos de viaje de las áreas de producción agrícola y pecuaria de la Región Occidental del Chaco hasta Asunción y las fronteras con Bolivia, Argentina y Brasil
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	Final do Projeto
El volúmen de tráfico de la Ruta 9 aumentará en 30%	%	100,00	2001	P A	130,00	130,00
Los costos de flete de transporte en la ruta N°9 se reducirán en términos reales 20%	%	100,00	2001	P A	80,00	80,00
El tiempo de viaje de la Ruta N°9 hasta la patria se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P A	60,00	60,00
Los accidentes en la Ruta N°9 se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P A	50,00	50,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN									
Apoyo a la Administración del Programa	Consultorías				12,00				
Supervisión de Obras	Nº de Obras fiscalizadas				12,00				
Estudio de Auscultación de Pavimentos	Consultoría				1,00				
OBRAS CIVILES									
Rehabilitación de la Ruta Nº 9	km				495,00				
Mejoramiento de la Ruta 9, tramo Mcal Estigarribia - La Patria	km				123,00				
Mejoramiento de Corredores de Integración de la Región Occidental	km				647,00				
Mantenimiento Vial de la Región Occidental	km				2.000,00				
Edificación y equipamiento de Casetas de Control de peso, y Sedes Distritales	obras				4,00				
Pavimentación del Tramo Yuty-Leandro Oviedo (Ruta 8)	km				14,00				
ADQUISICIONES									
Equipos para control de peso	equipo				2,00				
Materiales para ejecución de tramos piloto	etapas de impl ementación del convenio				3,00				
GASTOS CONCURRENTES									
Entrenamiento y Capacitación de personal	Grupos fortalecidos				3,00				
Protección ambiental y desarrollo de comunidades	hectáreas				12.000,00				
Fortalecimiento institucional y asesoramiento	personal incremental para la DV								
Apoyo para el programa de Investigación del Tramo Piloto	consultorías				1,00				
Imprevisto y Escalamiento	-								
GASTOS FINANCIEROS									
Intereses, Gastos Administrativos, Comisión de Crédito y gastos de inspección y Vigilancia.	-								
TOTAL									
