
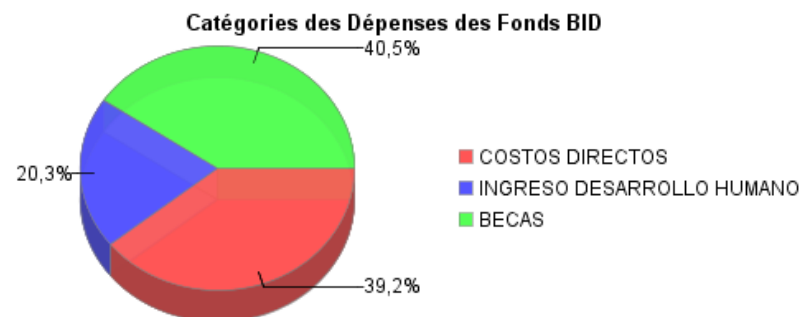
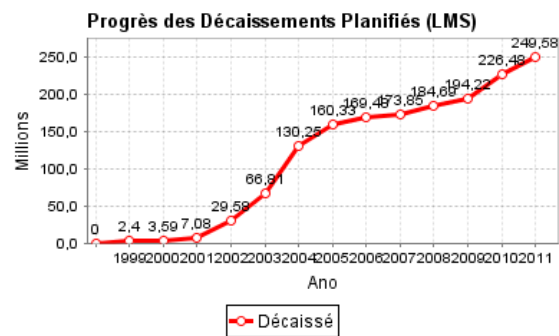



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	COMITE EJECUTOR MATANZA-RICHUELO		
Secteur:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Numéro(s) de Prêt(s):	1059/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	250.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	244.636.772,57
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	97,85
Opération(s) Connexe(s):	AR0217	Solde:	5.363.227,43
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	250.000.000,00
		Courant BID:	250.000.000,00
		Pari Passu:	50,00
		Cofinancement/Pays:	250.000.000,00
		Estimation Initiale:	500.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	150

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 28, 2011 Validé par le Représentant: Oct 21, 2011

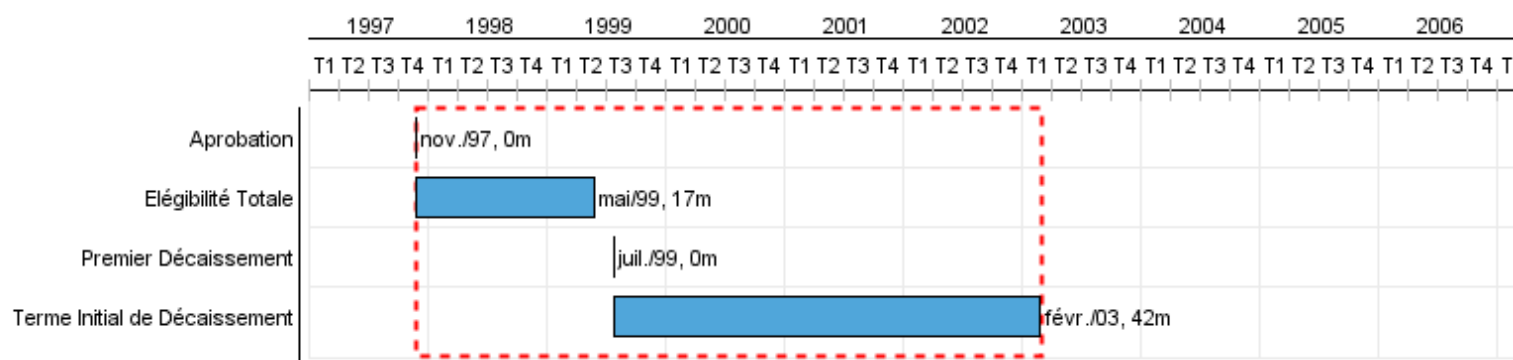

## Progrès Cumulé à 2011

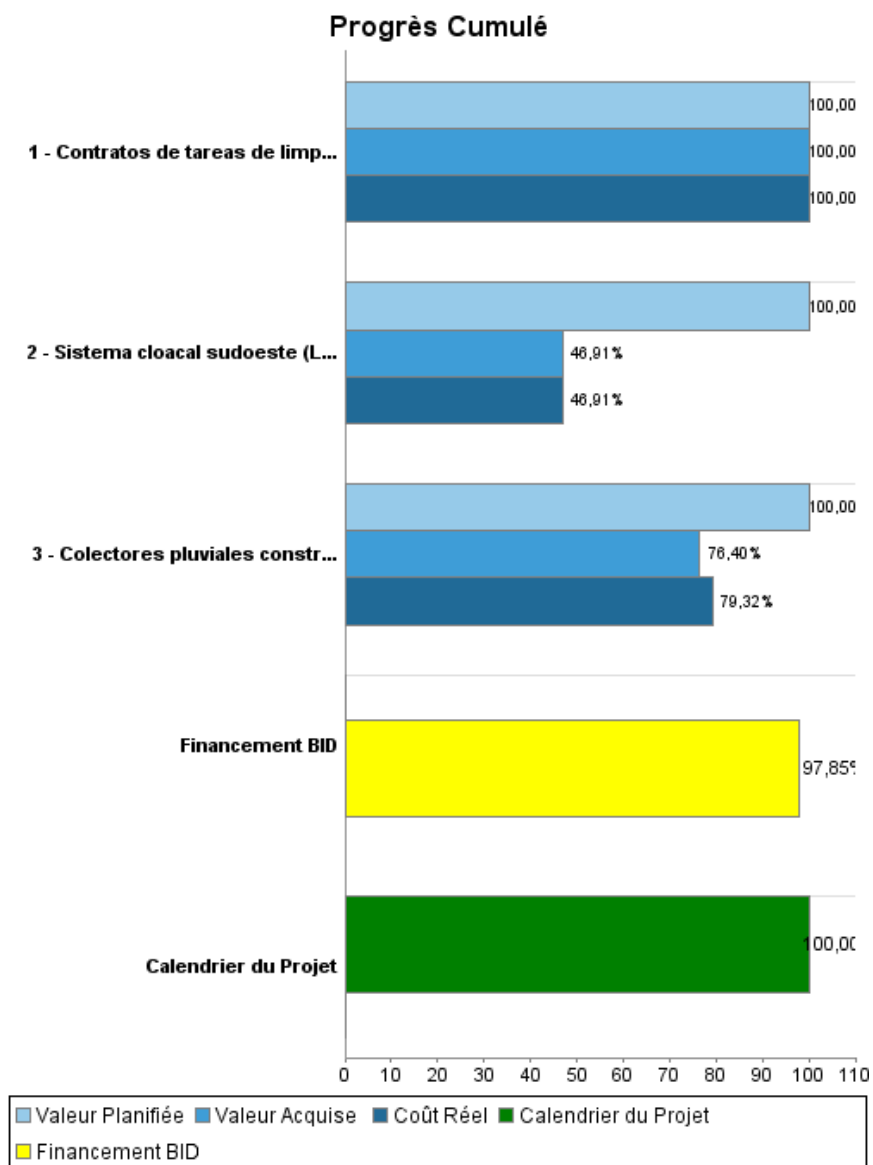

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Cobertura de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo incrementada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Hogares con servicio de saneamiento nuevo	Hogares		2006	P A		49.000,00

<b>Résultat:</b>	Riesgo de inundaciones reducido
------------------	---------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Habitantes beneficiados por las obras de drenaje pluvial	habitantes		2006	P A		427.000,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Obras de drenaje urbano</b>									
Colectores pluviales construídos	km	10,00			32,30	5.987.820,00			28.946.000,00
<b>Limpieza de márgenes</b>									
Contratos de tareas de limpieza de márgenes finalizados	Contratos				1,00				1.451.000,00
<b>Saneamiento cloacal</b>									
Sistema cloacal sudoeste (LaFerrere) construído	Sistemas	1,00			1,00	31.588.242,00			59.498.000,00
<b>Administración, supervisión y costos financieros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>37.576.062,00</b>			<b>89.895.000,00</b>
