
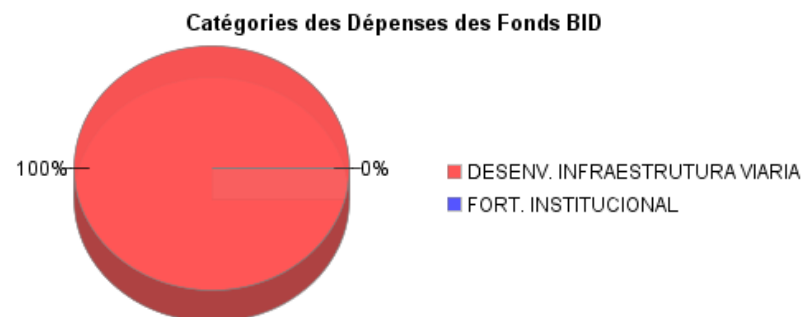
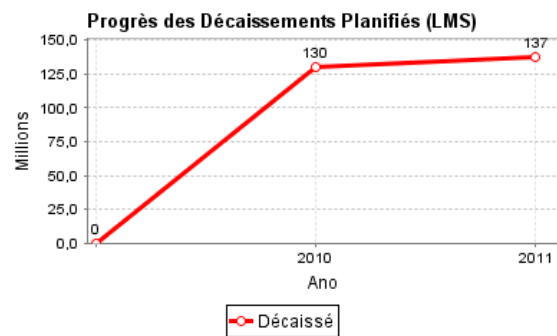



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MINAS GERAIS				
Secteur:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2306/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	137.000.000,00	Initial BID:	137.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	130.000.000,00	Courant BID:	137.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	94,89	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	7.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	137.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 23, 2011 Validé par le Représentant: Sep 28, 2011

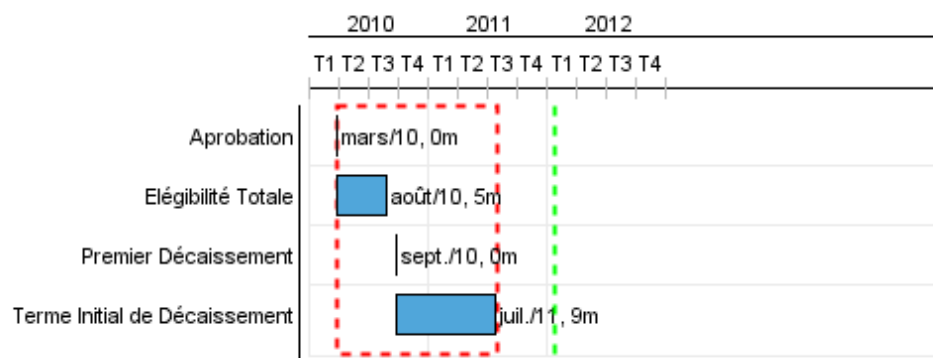

Progrès Cumulé à 2011

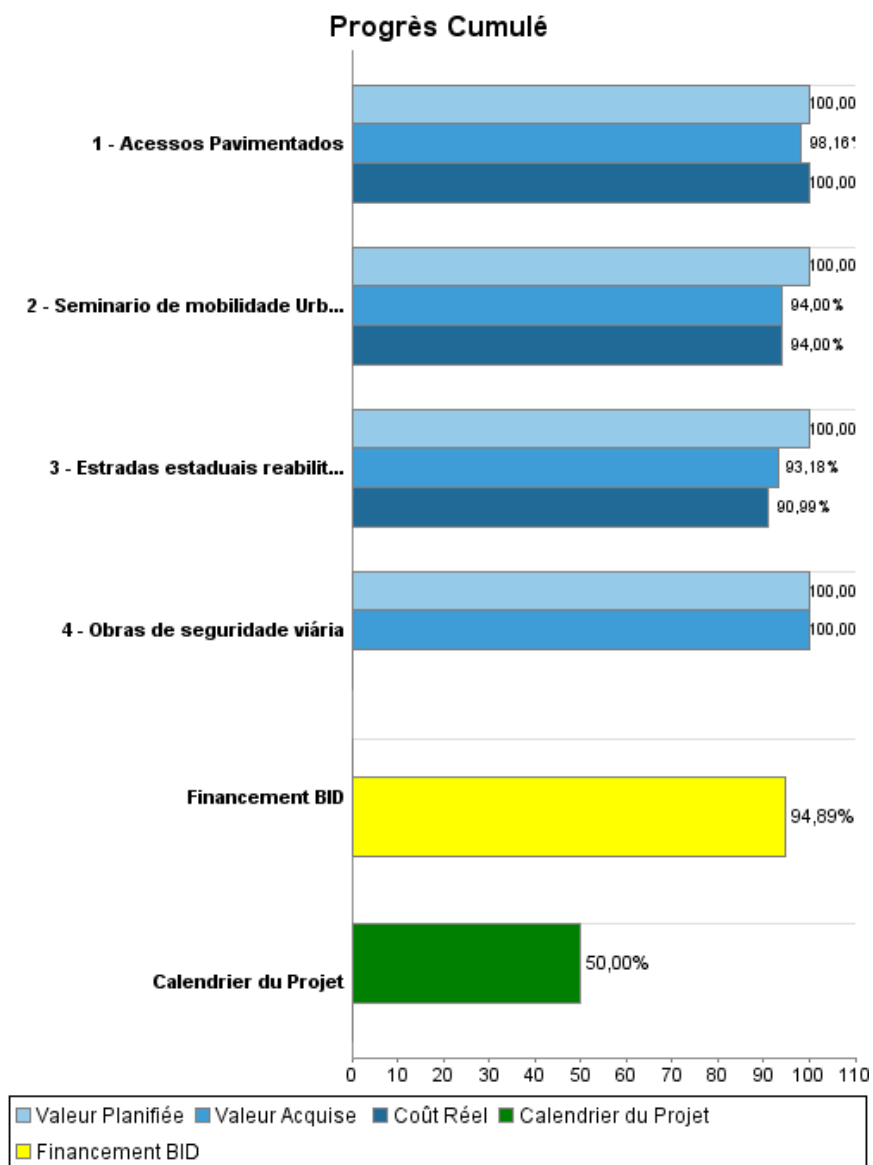

Résultats

Résultat:	Condições de transitabilidade melhoradas
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Rede viária pavimentada do Estado mantida com contratos do PROMG	km	15.700,00	2008	P A	22.294,00
Número de municípios com acesso pavimentado	Unidade	737,00	2008	P A	847,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Infraestrutura viária estadual desenvolvida.									
Acessos Pavimentados	Quilômetro	1.020,00	500,00		5.100,00	3.735.000,00			103.735.000,00
Estradas estaduais reabilitadas	Quilômetro	2.510,00	1.000,00		9.340,00	3.265.000,00			28.815.000,00
Obras de seguridade viária	Quilômetro	60,00	40,00		120,00				4.400.000,00
Fortalecimento Institucional									
Seminario de mobilidade Urbana da RMBH realizado	seminario	1,00			1,00				50.000,00
TOTAL						7.000.000,00			137.000.000,00
