

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA): EMPRESA DE SANEAMIENTO DE GOIAS S.A.  
Secteur: WATER AND SANITATION  
Numéro(s) de Prêt(s): 1414/OC-BR  
Étape: Approved  
Type d' Opération: INV - Investissement  
Opération(s) Connexe(s):  
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 47.600.000,00  
Montant Décaissé à ce Jour: 43.573.234,92  
% Décaissé: 91,54  
Solde: 4.026.765,08

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 47.600.000,00  
Courant BID: 47.600.000,00  
Pari Passu: 50,00  
Cofinancement/Pays: 47.600.000,00  
Estimation Initiale: 95.200.000,00  
Période d'Amortissement (mois): 230

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R)




### Reformulation

( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


### Validation

Validé par le Chef de Division: Sep 30, 2011

Validé par le Représentant: Sep 30, 2011

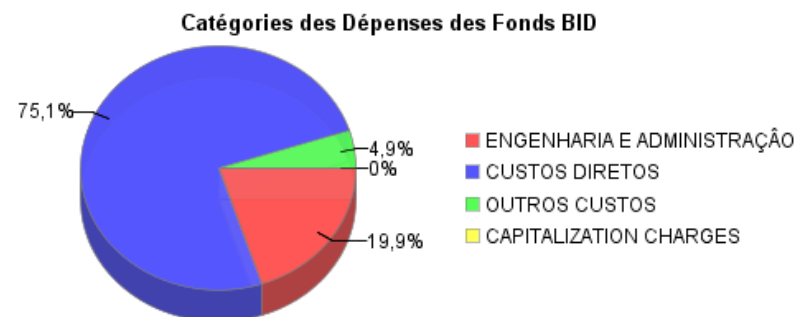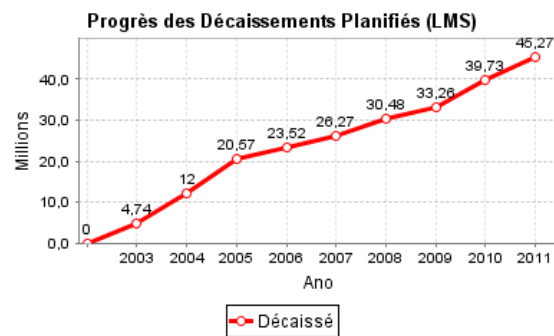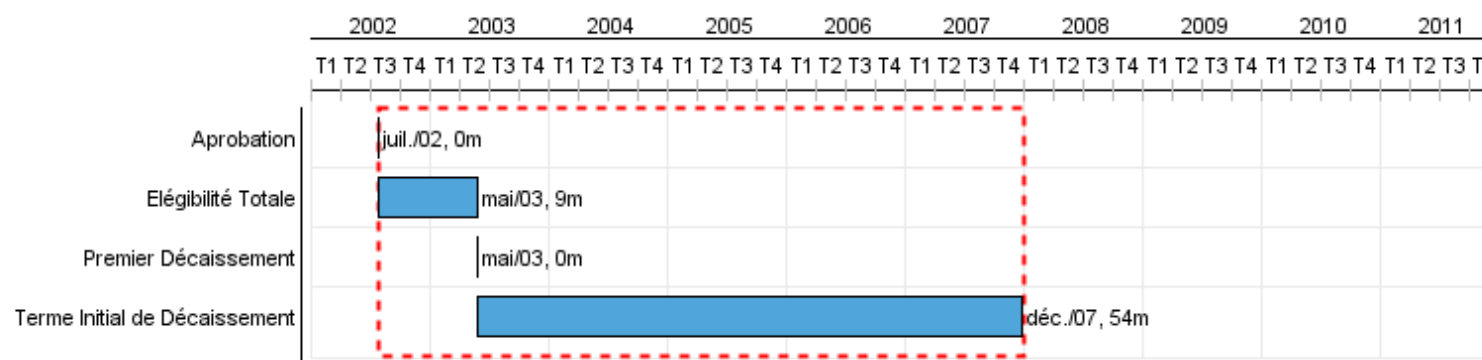

## Progrès Cumulé à 2011

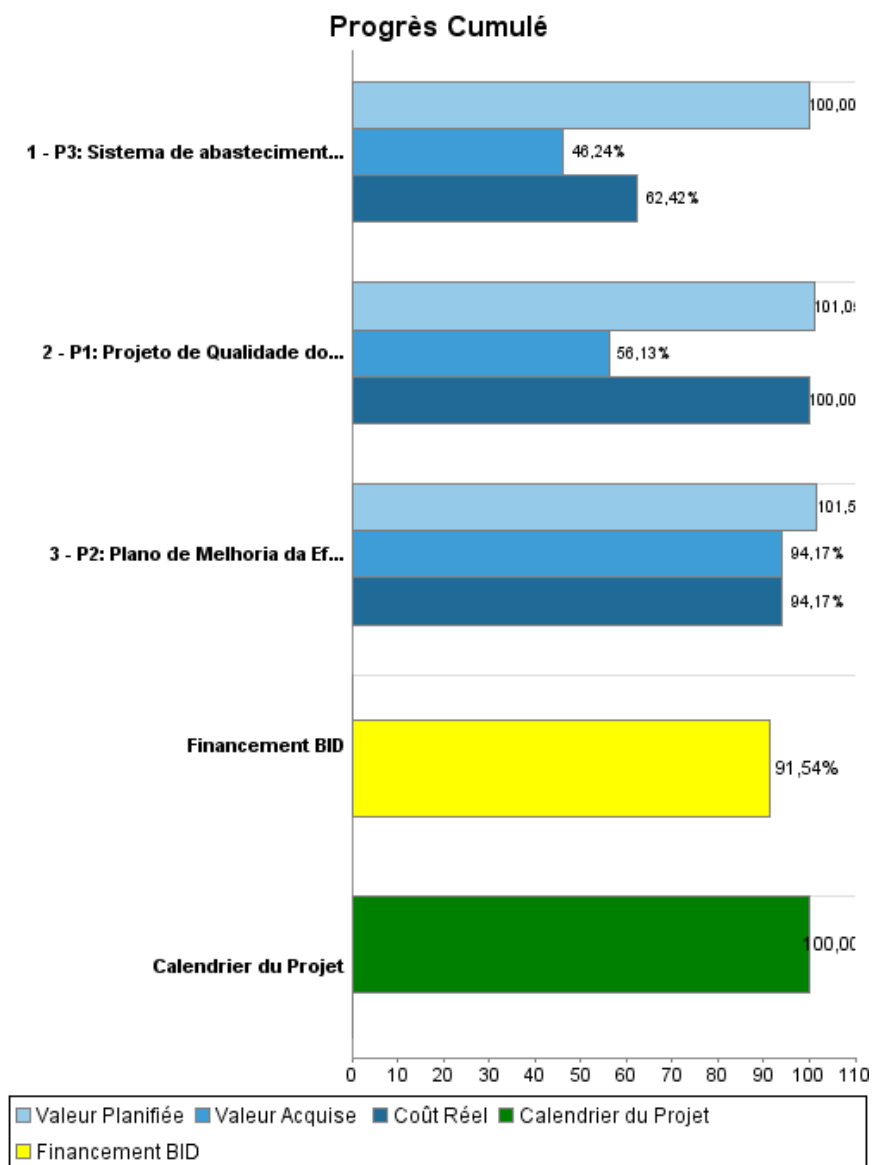

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Qualidade dos cursos de agua que atravessam a cidade de Goiânia mejorada.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	Fin du Projet
Nível de DBO nos rios que atravessam a cidade de Goiânia.	Mg/L	60,00	2002	P A			20,00
Nível de oxigênio dissolvido OD, nos rios qua atravessam a cidade de Goiânia.	Mg/L	2,00	2002	P A			6,00
Hogares com Conexoes de Esgoto novas o Melhoradas	Hogares	603,00	2006	P A	7.000,00 7.202,00	1.463,00	9.000,00

<b>Résultat:</b>	Prestação de serviços de água potável oferecida pela SANEAGO, na Cidade de Goiânia, melhorada.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	Fin du Projet
Continuidade do serviço de água potável na cidade de Goiânia.	%		2002	P A			90,00
Volume de água potável por habitante/dia.	Litros	125,00	2002	P A			150,00
Nível de Água não contabilizada.	%	37,00	2002	P A			35,90
Hogares com sistema de agua potavel novo o melhorado, ( sistema de abastecimento de agua Joa Leite )	Hogares		2006	P A	19.000,00 19.000,00		19.000,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente 01: Melhorias na qualidade dos cursos de água.</b>									
P1: Projeto de Qualidade dos cursos e água em Goiânia, implantado.	Projeto	1,00			1,00	8.339.450,00	8.340.000,00		19.011.590,00
<b>Componente 02: Melhorias na eficiência dos Serviços.</b>									
P2: Plano de Melhoria da Eficiência Comercial da SANEAGO executado.	Plano				1,00	5.282.790,00	4.143.000,00		15.129.450,00
<b>Componente 03: Melhorias no sistema de água potável.</b>									
P3: Sistema de abastecimento de água potável em goiânia, reabilitado.	Sistema	1,00			1,00	83.053.080,00	25.000.000,00		154.485.280,00
<b>Componente 04: Outros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>96.675.320,00</b>	<b>37.483.000,00</b>		<b>188.626.320,00</b>
