


$\frac{1}{4}$

## Progrès Cumulé à 2011

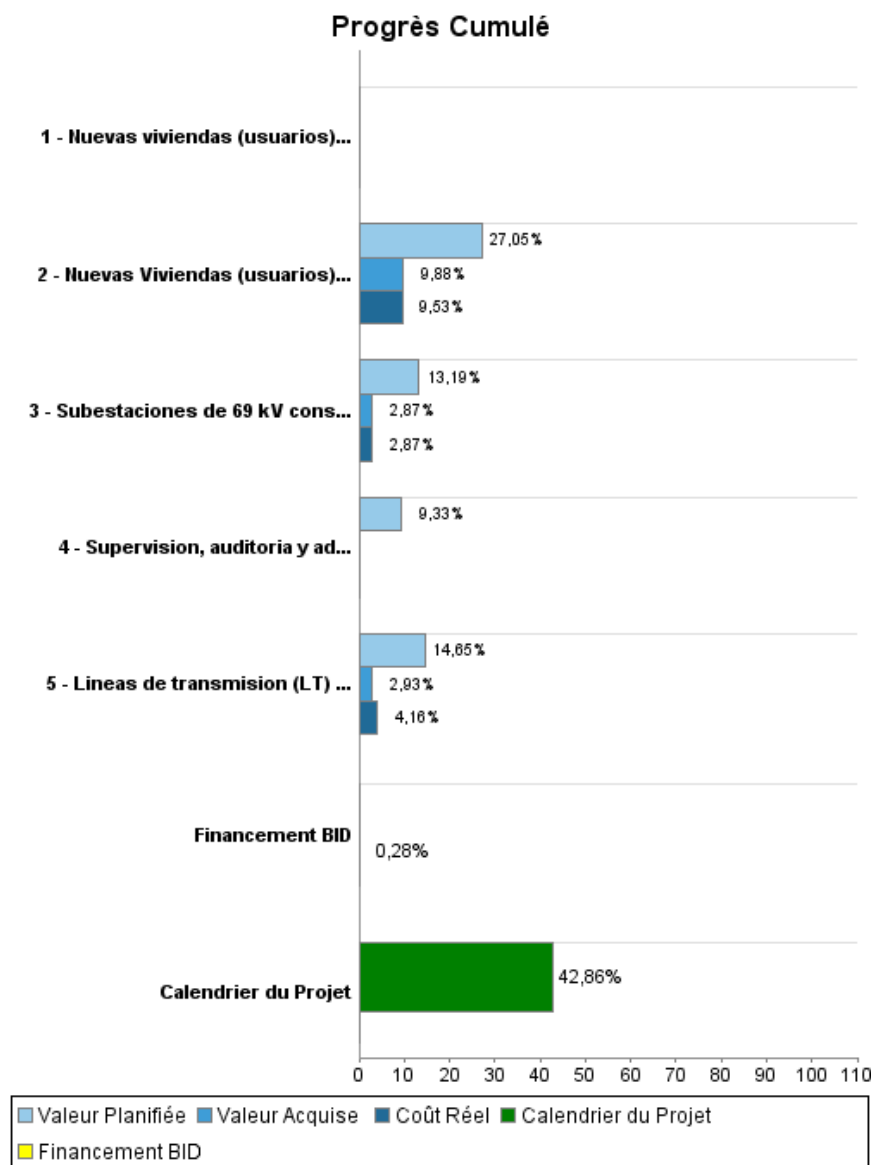

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Cobertura del servicio eléctrico en las comunidades rurales mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Cobertura de electrificación rural a nivel nacional	Porcentaje	82,60	2007	P A		85,90
Cobertura de electrificación en los municipios más pobres priorizados.	Porcentaje	66,10	2007	P A		73,90

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente 1 - Electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica.</b>									
Nuevas Viviendas (usuarios) conectadas a la red nacional	viviendas	6.267,00	1.549,00		29.152,00	5.337.351,00	1.239.200,00		23.400.000,00
Lineas de transmision (LT) del PER, construidas	Kilómetros	32,00			175,00	1.804.813,00	190.000,00		15.400.000,00
Subestaciones de 69 kV construidas	subestaciones				6,00	865.398,00	18.894,00		8.200.000,00
<b>Componente 2 - Electrificación rural en sistemas aislados.</b>									
Nuevas viviendas (usuarios) electrificadas en zonas aisladas	viviendas				5.000,00				7.400.000,00
<b>Componente 3 - Apoyo a la administración del Programa y supervisión.</b>									
Supervision, auditoria y administracion	n.a					70.000,00			750.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>8.077.562,00</b>	<b>1.448.094,00</b>		<b>55.150.000,00</b>
