
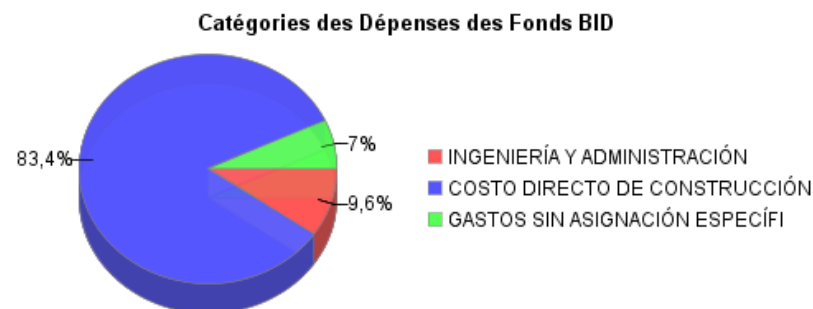
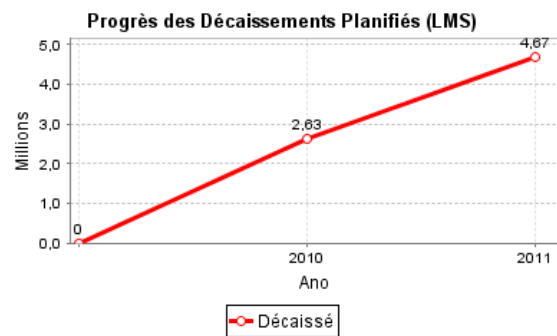



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.				
Secteur:	ENERGY-POWER LINES				
Numéro(s) de Prêt(s):	2024/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	12.500.000,00	Initial BID:	12.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	4.670.930,39	Courant BID:	12.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	37,37	Pari Passu:	50,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	7.829.069,61	Cofinancement/Pays:	12.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	25.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Oct 20, 2011 Validé par le Représentant: Oct 24, 2011

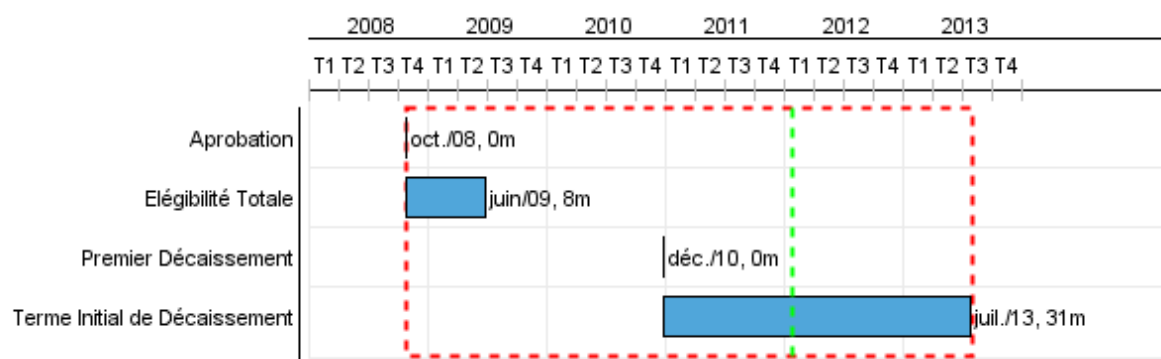

## Progrès Cumulé à 2011

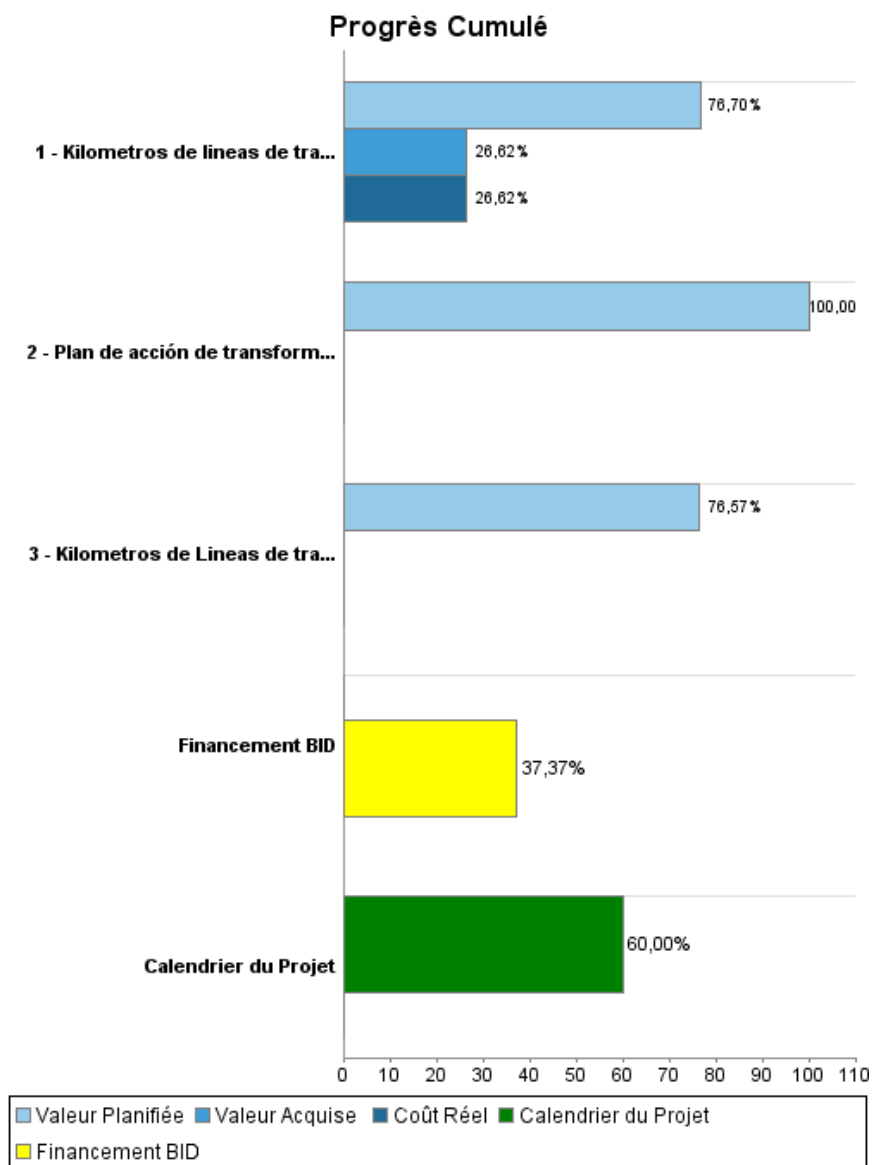

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Crecimiento de la demanda de energía eléctrica atendido.
<b>Suposições:</b>	Manteniendo niveles adecuados de calidad, confiabilidad y costo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Electricidad suministrada al Sistema Interconectado Nacional	Gwh	8.412,90	2008	P A	8.881,90
Potencia entregada al Sistema Interconectado Nacional.	MW	1.356,50	2008	P A	1.431,20

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente 1.1 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica- Proyecto Colón Fase II</b>									
Kilometros de Lineas de transmisión construidas (Proyecto Colón Fase II)	Kilometers				48,00	7.100.000,00			12.550.000,00
<b>Componente 1.2 - Inversiones en la red de transmisión eléctrica - Proyecto Guasquitas - Changuinola</b>									
Kilometros de lineas de transmisión eléctrica construida (Proyecto Guasquitas -Changuinola)	Kilometers				121,00	5.100.000,00	2.404.100,00		9.030.000,00
<b>Componente 2 - Actividades de transformación corporativa</b>									
Plan de acción de transformación corporativa implementado	Plan				1,00	50.000,00			100.000,00
<b>Gastos sin Asignación Específica</b>									
<b>Gastos Financieros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>12.250.000,00</b>	<b>2.404.100,00</b>		<b>21.680.000,00</b>
