
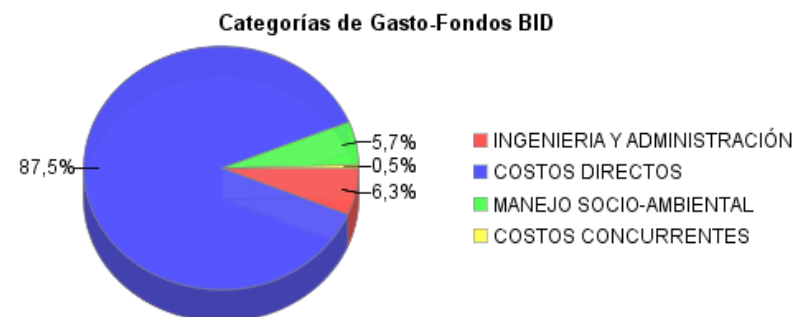
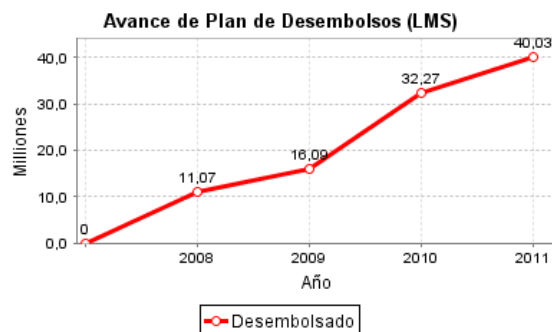



Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | | Costo total y Fuente | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | EMPRESA PUBL.MUNICIPAL TELECOMUNIC,AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO SANEAMEN.CUENCA | | | | |
| Sector: | WATER AND SANITATION-SEWERAGE | | | | |
| Número(s) de Préstamo: | 1753/OC-EC | Monto Aprobado Actual: | 61.250.000,00 | BID Original: | 61.250.000,00 |
| Etapas: | Approved | Monto Desembolsado a la fecha: | 40.031.821,47 | Actual BID: | 61.250.000,00 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | % Desembolsado: | 65,36 | Pari-passu: | 63,00 |
| Operación(es) Relacionada(s): | | Saldo: | 21.218.178,53 | Co-financiamiento/País: | 35.750.000,00 |
| Subtipo de Operación: | ESP - Inversión Específica | | | Estimado Original: | 97.000.000,00 |
| | | | | Período de Amortización (meses): | 222 |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación | |
|---|---------------|--|--------------|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: | B(R) | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | |
| | | Validado por el Jefe de División: | Sep 30, 2011 |
| | | Validado por Representante de País: | Oct 3, 2011 |

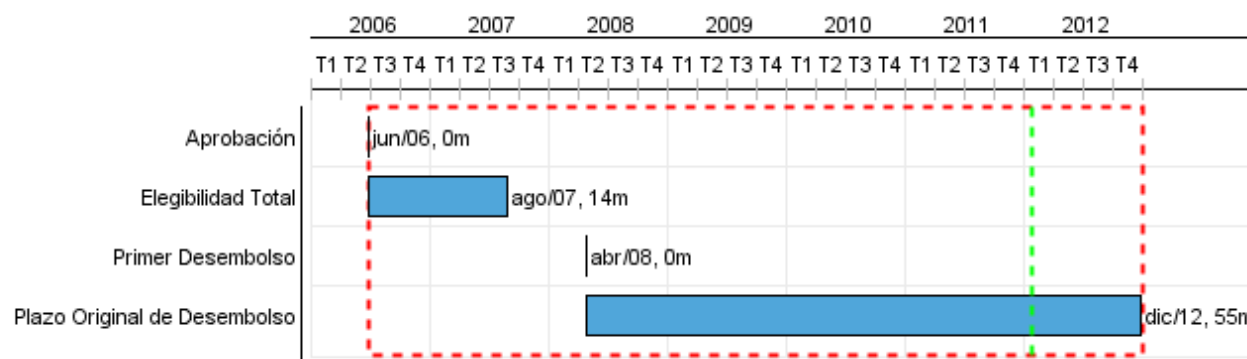

Progreso Acumulado al 2011

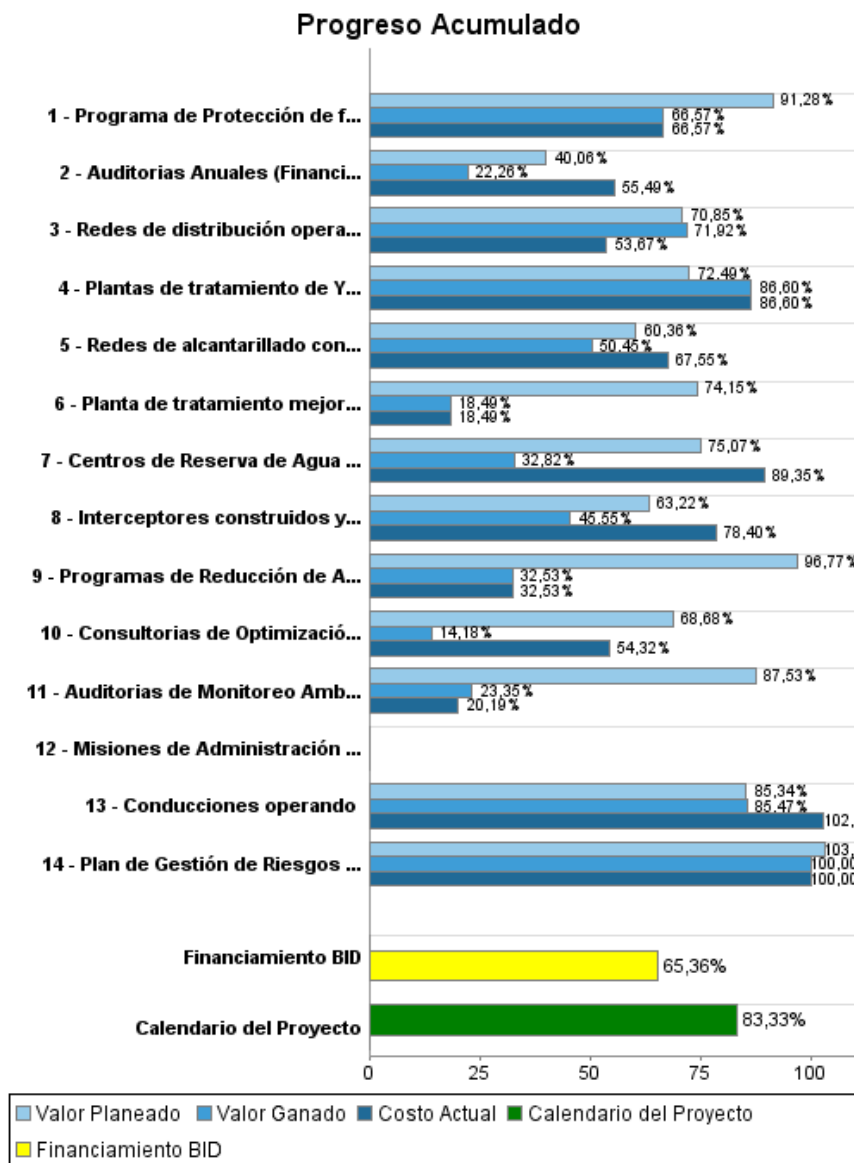

Resultados

Resultado: Demanda de agua potable y alcantarillado en la zona periurbana y rural atendida

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|-------|-----------|----------|-----------------|
| Cobertura en agua potable en el área del proyecto. | % | 90,00 | 2006 | P | 92,40 | 92,80 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | A | 94,00 | | | |
| Cobertura de alcantarillado en la zona de intervención del Programa | % | 78,00 | 2006 | P | 85,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 |
| | | | | A | 82,00 | | | |
| Conexiones de agua potable nuevas o mejoradas | Hogares | | 2006 | P | | 25.721,00 | 2.580,00 | 28.301,00 |
| | | | | A | | 24.940,00 | | |
| Conexiones de alcantarillado nuevas y mejoradas | Hogares | | 2006 | P | | 10.001,00 | 1.478,00 | 11.500,00 |
| | | | | A | | 19.045,00 | | |

Resultado: La calidad del agua de los ríos y quebradas han sido mejoradas

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|-------|--------|------|-----------------|
| Descargas directas eliminadas en los ríos Yanuncay, Machángara, Tarqui, El Chorro, Tomebamba y Milchichig | Descargas | | 2006 | P | 98,00 | 100,00 | | 183,00 |
| | | | | A | 77,00 | | | |

Resultado: Servicios de agua potable y saneamiento financieramente sostenibles en el largo plazo.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | Fin de Proyecto |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-----------------|
| Margen Operativo | % | 20,00 | 2006 | P | 19,60 | 21,56 | 23,52 | 24,00 |
| | | | | A | 16,28 | | | |

Resultado: Empresa de Telecomunicacione, Agua Potable y Alcantarillado y Saneamineto de Cuenca (ETAPA) Eficiente y sostenible.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-----------------|
| Metas de desempeño de gestión empresarial cumplidas | Metas | | 2006 | P | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| | | | | A | 11,00 | | | |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|---|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Abastecimiento de Agua Potable. | | | | | | | | | |
| Redes de distribución operando | KM | 35,00 | 36,00 | | 214,00 | 3.293.000,00 | 1.355.000,00 | | 13.329.000,00 |
| Conducciones operando | KM | 2,00 | 2,00 | | 62,90 | 306.000,00 | 839.000,00 | | 18.451.000,00 |
| Plantas de tratamiento de Yanuncay y Lodos del Tixan y el Cebollar mejoradas | Plantas | | | | 3,00 | 247.000,00 | | | 10.325.000,00 |
| Centros de Reserva de Agua Potable operando | Centros | 7,00 | 3,00 | | 28,00 | 796.000,00 | 452.000,00 | | 3.229.000,00 |
| Abastecimiento de servicios de saneamiento y drenaje pluvial | | | | | | | | | |
| Redes de alcantarillado construidas y operando | KM | 13,91 | | | 66,00 | 1.901.000,00 | 635.000,00 | | 11.631.000,00 |
| Interceptores construidos y operando | KM | 16,36 | 6,00 | | 48,00 | 2.558.000,00 | 1.462.000,00 | | 11.308.000,00 |
| Planta de tratamiento mejorada (Ucubamba) y operando | Plantas | | | | 1,00 | 4.958.000,00 | 311.000,00 | | 8.305.000,00 |
| Fortalecimiento Empresarial | | | | | | | | | |
| Consultorias de Optimización empresarial, Subsidios, Tarifas, Valuación de Activos implementadas | Consultorias | 2,00 | 1,00 | | 4,00 | 541.000,00 | 214,00 | | 2.331.000,00 |
| Programas de Reducción de Agua no Contabilizada y Operación y Mantenimiento implementado | Programas | | | | 2,00 | 736.000,00 | 41.000,00 | | 1.949.000,00 |
| Plan de manejo SocioAmbiental | | | | | | | | | |
| Auditorias de Monitoreo Ambiental completadas | Auditorias | 7,00 | | | 15,00 | 727.000,00 | | | 1.179.000,00 |
| Plan de Gestión de Riesgos aprobado | Planes | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | | 575.000,00 |
| Programa de Protección de fuentes y Cursos Naturales implementado | Programas | | | | 1,00 | 288.000,00 | 13.000,00 | | 1.720.000,00 |
| Seguimiento/ Evaluación y Administración y Costos Financieros | | | | | | | | | |
| Misiones de Administración / Evaluaciones del Programa concluidas (Evaluaciones paso a la segunda y tercera etapa del Programa) | Evaluaciones | 1,00 | | | 4,00 | | | | |
| Auditorias Anuales (Financieras y de Gestion) realizadas | Auditorias | 2,00 | | | 10,00 | 120.000,00 | | | 674.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 16.609.000,00 | 5.246.214,00 | | 85.006.000,00 |
