
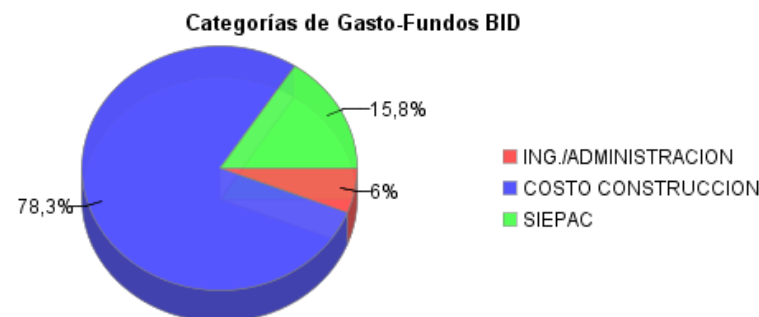
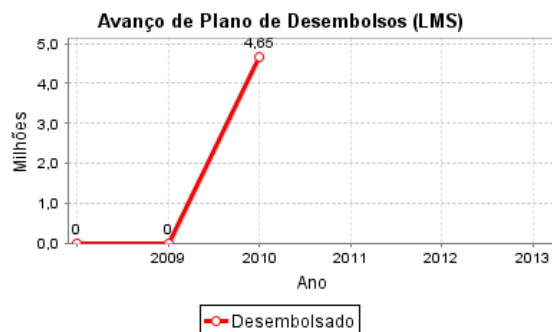



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		
Sector:	ENERGY-POWER LINES		
Número da Operação:	2016/BL-HO	Atual:	28.550.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	4.650.183,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	16,29
Operação Relacionada:	HO-P1010, HO-T1095, HO-L1039	Saldo:	23.899.817,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	28.550.000,00
		Corrente BID:	28.550.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Cofinanciamento/País:	2.760.000,00
		Original Estimado:	31.310.000,00
		Período de Amortização (meses):	282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 30, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011

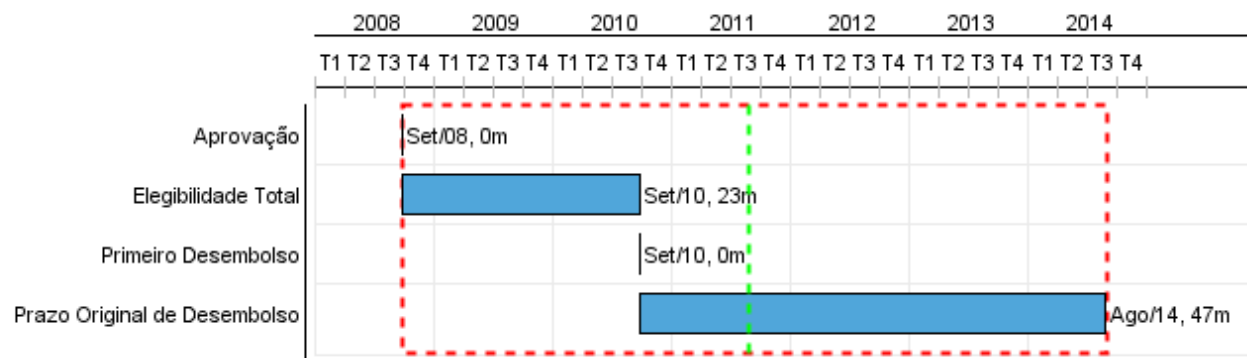

Progresso Acumulado até 2010

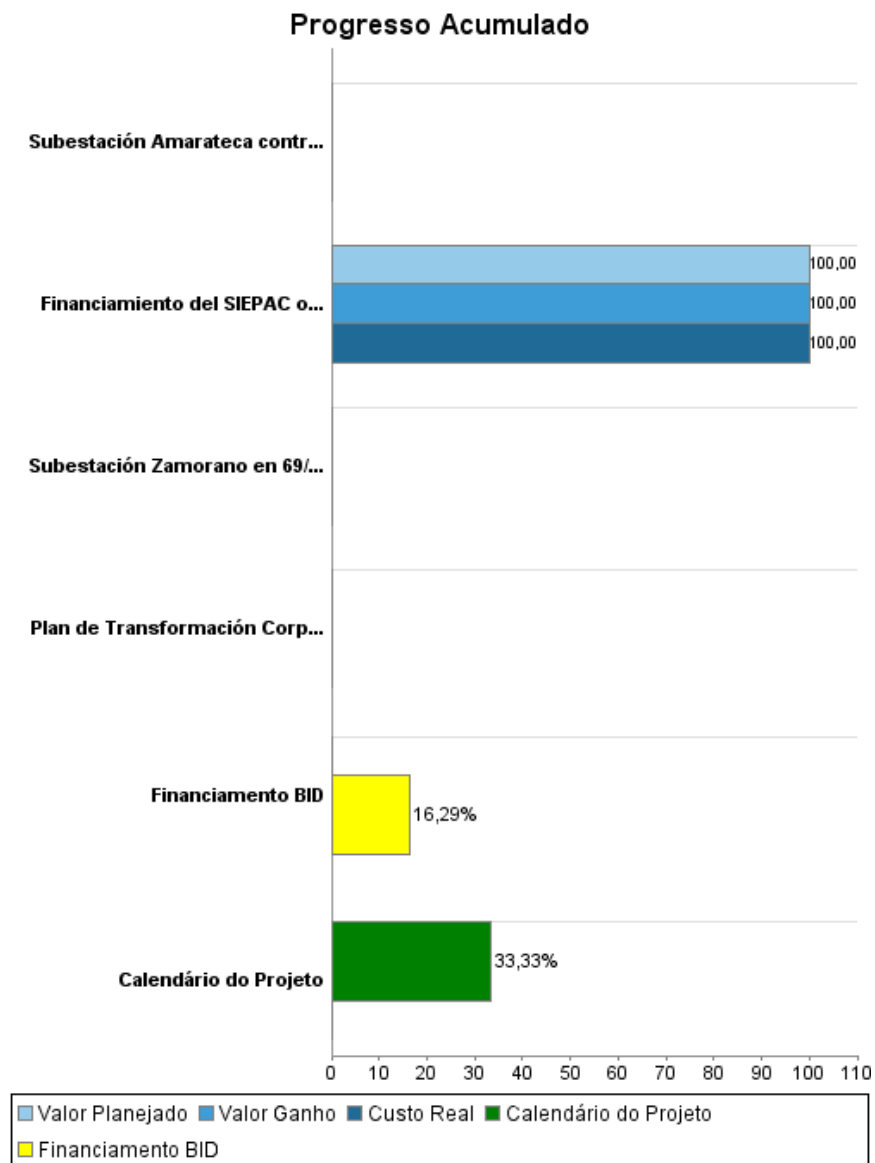

Resultados

Resultado:	Suministro de electricidad del país asegurado para satisfacer el crecimiento de la demanda.
Observações:	ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Electricidad suministrada a la demanda conectada al sistema interconectado nacional.	GWh	6.227,50	2007	P A	7.775,80
Cash Recovery Index (CRI) global de la ENEE incrementado	Porcentaje	72,00	2007	P A	82,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Inversiones en la red de transmisión eléctrica.									
Subestación Amarateca contruida y en operación	Subestación				1,00				21.551.000,00
Subestación Zamorano en 69/34.5 kV con 30 MVA adicionales ampliada y en operación	Subestación				1,00				1.359.000,00
Componente 2. Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.									
Plan de Transformación Corporativa de la ENEE implementado	Plan				1,00				
Financiamiento del SIEPAC otorgado	Transferencia	1,00	1,00		1,00	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
TOTAL						4.500.000,00	4.500.000,00		27.410.000,00
