
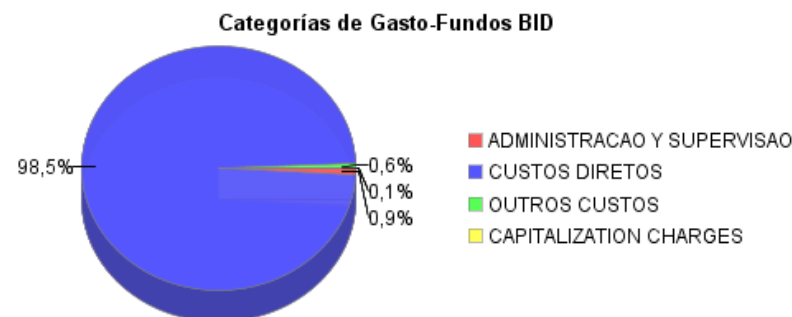
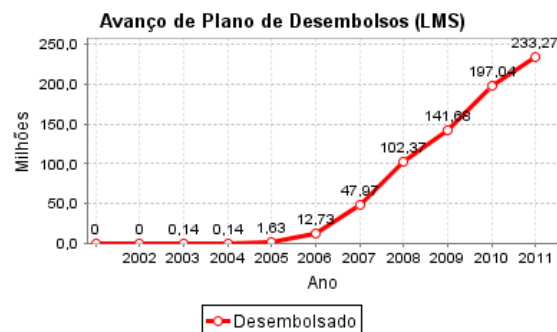



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		
Setor: TOURISM		
Número da Operação: 1392/OC-BR	Atual: 240.000.000,00	Original BID: 240.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 229.208.255,32	Corrente BID: 240.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 95,50	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada:	Saldo: 10.791.744,68	Cofinanciamento/País: 160.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 400.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 26, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 28, 2011

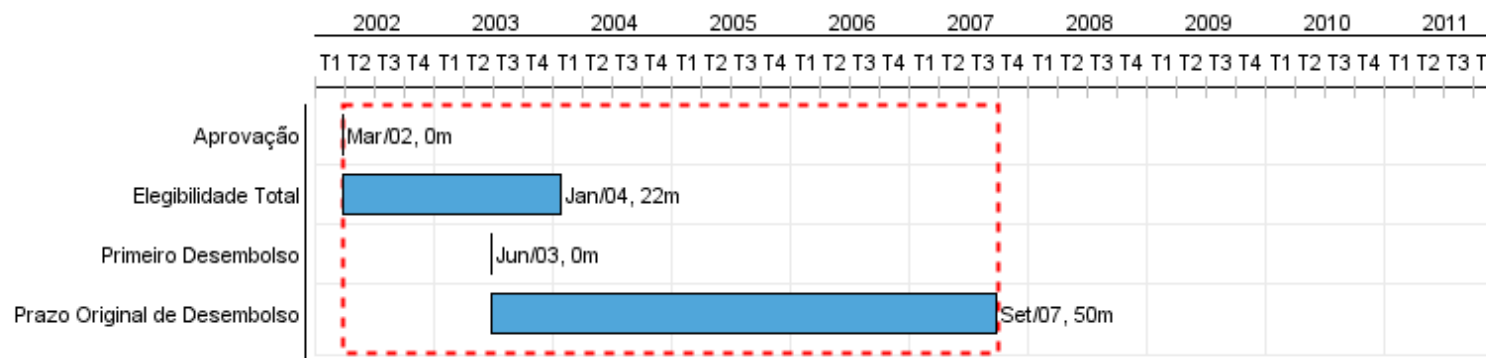

Progresso Acumulado até 2011

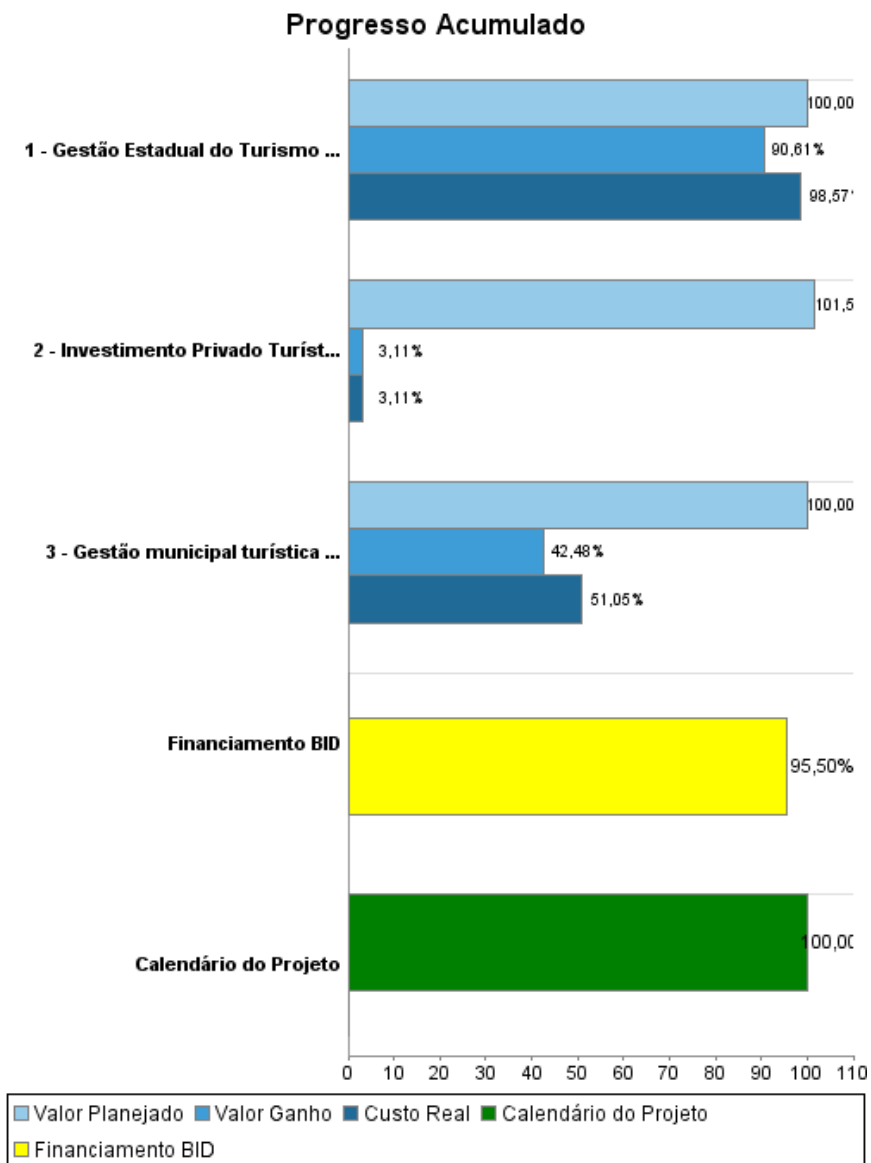

Resultados

Resultado: Qualidade do produto Turísticos melhorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2009	Final do Projeto
Grau de satisfação dos turistas com a limpeza pública nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com a sinalização turística nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com os atrativos naturais nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com a qualidade da infra-estrutura nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com a segurança pública nas Capitais aumentada	%		2000	P A				0,00
Grau de satisfação dos turistas com os serviços proporcionados pelos EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS nas Capitais aumentado	%		2000	P A				0,00
População atendida com rede de abastecimento de água nos municípios dos Pólos doprojetos do PRODETUR/NE II Incrementado	%		2000	P A				0,00
População atendida com rede de esgoto sanitário nos municípios dos Pólos doprojetos do PRODETUR/NE II incrementado	%		2000	P A				0,00

Resultado: De maneira sustentável, a renda gerada nos Pólos pelo Turismo aumentada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2007	2009	Final do Projeto
Movimentação de passageiros nos aeroportos das capitais do Programa	Número	12.735.226,00	2004	P A				20.000.000,00
Taxa Média de Ocupação Hoteleira nas capitais aumentada	%	55,80		P A	17.052.243,00	18.827.487,00	22.394.547,00	65,00
Número de unidades habitacionais nas capitais aumentada	Número			P A	59,90	58,30	60,90	0,00
					54.076,00	56.586,00	59.889,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
COMPONENTE 1: Gestão municipal.									
Gestão municipal turística nos polos de atuação do Programa fortalecida	unidade	1,00			1,00	38.861.574,21	5.790.886,63		67.557.500,00
COMPONENTE 2: Gestão Estadual do Turismo									
Gestão Estadual do Turismo Fortalecida	unidade	1,00			1,00	24.025.844,13	20.361.671,05		255.950.000,00
COMPONENTE 3: Promoção do Investimento Privado									
Investimento Privado Turístico Incrementado	unidade	1,00			1,00	19.984.167,56			20.300.000,00
Outros									
TOTAL						82.871.585,90	26.152.557,68		343.807.500,00
